


| | | | | | | | |
|--|---|---|------------|--------------------|-------------|---------|----------|
| 市町村名 | 浦添市 | | | | | | |
| 令和3年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【公表用】 | | | | | | | |
| 事業番号・事業名 | 4-④ | 浦添前田駅周辺地区賑わい創出事業 | | 沖縄21世紀ビジョン基本計画該当箇所 | 第3章-3-(2)-工 | | |
| 担当部署名 | 市民部経済文化局 観光振興課 | 事業実施(予定)年度 | 平成29 ~ 令和4 | 沖縄振興基本方針該当箇所 | 観光客の受入体制の整備 | | |
| 事業内容 | 観光誘客並びに観光客と地域住民間及び地域住民相互の交流機会の増加を図るため、沖縄都市モノレール浦添前田駅周辺地域において、観光交流拠点施設等の整備を行うため、多目的広場の整地工事及び擁壁工事等を行う。 | | | | | | |
| 効果発現年度 | <input type="checkbox"/> 当年度 <input checked="" type="checkbox"/> 後年度(R7 年度) | | | | | | |
| 実施方法 | <input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 補助 <input type="checkbox"/> 負担 <input type="checkbox"/> その他() | | | | | | |
| 予算額・執行額【単位:千円】 (「交付金」+「市町村負担」ベース) | 予算の状況 | (a)当初予算額 | H30年度 | R1年度 | R1年度(繰越) | R3年度 | R3年度(繰越) |
| | | (b)予算現額 | 16000 | 220,665 | | 324,313 | |
| | | (c)増減額(b-a) | 14936 | 216,576 | | 324,313 | |
| | | (d)繰越額 | ▲1,064 | ▲4,089 | 0 | 0 | 0 |
| | | A.計(b+d) | 0 | 0 | 211,878 | 0 | 308,768 |
| | B.執行済額 | うち交付金充当額 | 14,936 | 216,576 | 211,878 | 324,313 | 308,768 |
| | | 次年度繰越額 | 14,461 | 4,698 | 203,998 | 15,544 | 83,663 |
| | | 執行率(%) (B/A) | 11,568 | 3,758 | 163,198 | 12,435 | 66,931 |
| | | 執行率(%) (B/A) | 0 | 21,187 | 0 | 0 | 0 |
| | 予算の状況の説明 | <ul style="list-style-type: none"> 令和3年度は、広場工事を実施するにあたり、開発許可を受けるため、実施設計を変更する必要が生じ、その手続に不測の日数を要することになったため、令和4年度に繰り越した。 令和4年度は、事業用地周辺にて実施中の関連工事の進捗に遅延が生じ、それに伴い本事業の多目的広場の整地工事及び擁壁工事の一部を完了するのみとなった。 | | | | | |
| 活動目標(指標)及び達成状況 | R3活動目標(指標) | | 達成状況 | | | | |
| | 交通広場工事の完了 | 目標 | H30年度 | R1年度 | R2年度 | R3年度 | |
| | | 実績 | | | | 実施 | |
| | 目標 | 目標 | | | | | |
| | | 実績 | | | | 一部実施 | |
| 達成状況説明 | 多目的広場の整地工事及び擁壁工事の一部を行った。 | | | | | | |
| 成果目標(指標)及び進捗状況 | R3成果目標(指標) | | 基準値(年度) | R1年度 | R2年度 | R3年度 | 目標値(年度) |
| | 交通広場工事の完了 | 目標 | () | () | () | (完了) | () |
| | | 実績 | | | | 一部完了 | |
| | 目標 | 目標 | () | () | () | () | () |
| | | 実績 | | | | | |
| 進捗状況説明 | 多目的広場の整地工事及び擁壁工事の一部を行った。 | | | | | | |

| 取組の検証 | 推進上の留意点(推進上の問題、外部環境の変化) | 改善余地の検証(効率の更なる向上の視点) |
|--|-----------------------------------|------------------------------|
| | 他の関連工事進捗遅延により、多目的広場工事の一部完了のみとなった。 | 関連工事の進捗状況等、関係各課と連携をとり事業を進める。 |
| 今後の取り組み方針 | | |
| <p>・交通広場部分の整備については、周辺区画整理事業の進捗を見ながら、事業計画期間を延長する。また、整備を円滑に進められるよう工事担当課との情報共有を密にする。施設部分については、民間事業者と対話をしながら、事業への参入が容易になるよう公募条件を見直す。</p> | | |

資金の流れ
(資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する)(単位:千円)

| 総事業費 | 交付対象事業費 | 交付先 | | 交付対象外経費 |
|--------|---------|--------|--------|---------|
| | | 交付金充当額 | 市町村負担金 | |
| 99,208 | 99,208 | 79,366 | 19,842 | 0 |

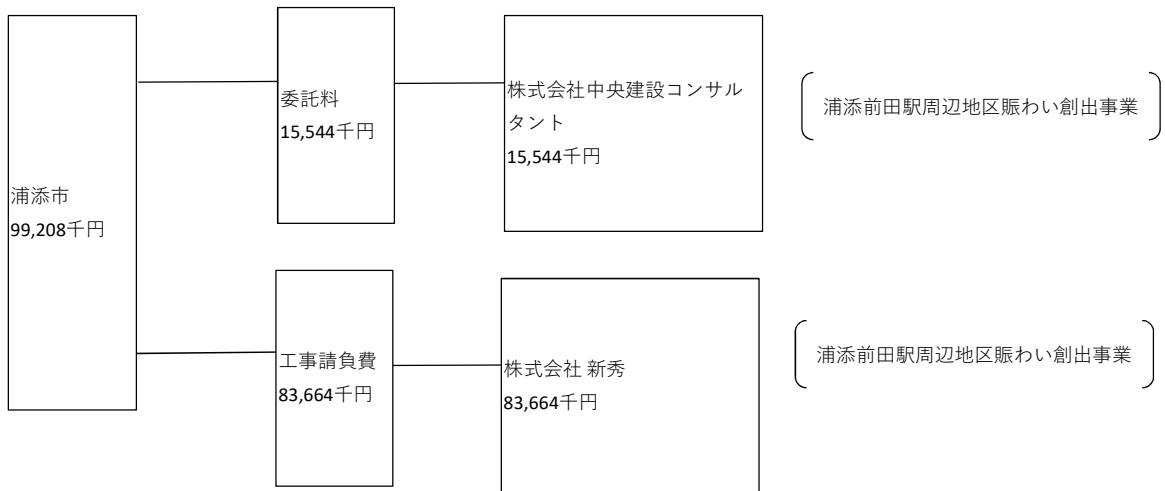

| 資金の流 れ、費 目・ 評価 | 評価 | 点検項目 | 評価に関する説明 |
|-------------------------|----|--------------------------------|--|
| | ○ | 支出先の選定方法は妥当か。 | <p>○委託及び工事請負費の業者選定は指名競争入札により実施しており、妥当であったと考えている。 ○他工事の進捗遅延により、総事業費が交付決定額の30.5%となったため、関連工事の進捗状況等、関係各課と連携をとり事業を進める。 ○費目・用途について事業目的達成の観点から必要か確認しており、適正であった。</p> |
| | △ | 予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。 | |
| | - | 受益者との負担関係は妥当であるか。 | |
| | ○ | 費目・用途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。 | |
