


| | | | | | | | |
|--|---|--|------------|--------------|--------------------|-------------------------------------|---------|
| 市町村名 | 北中城村 | | | | | | |
| 令和元年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【公表用】 | | | | | | | |
| 事業番号・事業名 | 1-④ | 公営墓地整備事業 | | | 沖縄21世紀ビジョン基本計画該当箇所 | 第3章-3-(6)-ア | |
| 担当部署名 | 住民生活課 | 事業実施(予定)年度 | 平成24~令和3年度 | | 沖縄振興基本方針該当箇所 | 沖縄のソフトパワーを活用した新事業・新産業の創出 Ⅲ-1-(1) | |
| 事業内容 | 沖縄独特の墓地散在化の抑制と整理、景観的な住環境の改善を図るため、公営墓地の進入路整備を行う。 | | | | | | |
| 効果発現年度 | <input type="checkbox"/> 当年度 <input checked="" type="checkbox"/> 後年度(4年度) | | | | | | |
| 実施方法 | <input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 補助 <input type="checkbox"/> 負担 <input type="checkbox"/> その他() | | | | | | |
| 予算額・執行額 【単位:千円】 (「交付金」+「市町村負担」ベース) | | H30年度 | R1年度 | R1年度(繰越) | R2年度 | R3年度 | |
| | 予算の状況 | (a)当初予算額 | 71,907 | 124,497 | - | | |
| | | (b)予算現額 | 27,119 | 205,689 | - | | |
| | | (c)増減額(b-a) | ▲44,788 | 81,192 | - | | |
| | | (d)繰越額 | - | - | 141,078 | | |
| | A.計(b+d) | | 27,119 | 205,689 | 141,078 | | |
| | B.執行済額 | | 25,089 | 64,281 | 141,078 | | |
| | うち交付金充当額 | | 20,071 | 51,424 | 112,113 | | |
| | 次年度繰越額 | | 0 | 141,078 | 0 | | |
| | 執行率(%) (B/A) | | 92.5% | 31.3% | 100.0% | | |
| 予算の状況の説明 | | <ul style="list-style-type: none"> ・R1年度の不用額330千円については、進入路整備工事の精算による減額である。 ・軟弱層等の影響により、その対策工事に不測の日数を要したことから、141,078千円をR2年度に繰越すことになった。 ・R1年度繰越については、計画通り予算を執行することができた。 | | | | | |
| 活動目標(指標)及び達成状況 | R1活動目標(指標) | | 達成状況 | | | | |
| | | | H30年度 | R1年度 | R2年度 | R3年度 | |
| | 公営墓地進入路整備工事の実施 | 目標 | (実施計画の検討) | (進入路整備工事の実施) | () | () | |
| | | 実績 | 実施計画の検討 | 進入路整備工事の実施 | | | |
| | | 目標 | () | () | () | () | |
| | | 実績 | | | | | |
| 達成状況説明 | 主工事である擁壁工(テールアルメ擁壁工事)を完了させたことから、進入路整備を概ね完了させることができた。 | | | | | | |
| 成果目標(指標)及び進捗状況 | R1成果目標(指標) | | 基準値(年度) | H30年度 | R1年度 | R2年度 | 目標値(年度) |
| | 公営墓地進入路整備の完了 | 目標 | () | (実施設計の完了) | (進入路整備の完了) | () | () |
| | | 実績 | | 実施設計の完了 | 進入路整備の一部完了 | | |
| | 【R4成果目標】 公営墓地利用世帯 | 目標 | () | () | () | () | (35世帯) |
| | | 実績 | | | | | |
| | 進捗状況説明 | 軟弱層の対策工事で事業費が大幅に増額したことにより、舗装工及び排水工についてはR2年度に実施することとなったが、主工事である擁壁工が完了したことで、進入路整備を概ね達成することができた。 | | | | | |

| 取組の検証 | 推進上の留意点(推進上の問題、外部環境の変化) | 改善余地の検証(効率の更なる向上の視点) |
|--|--|---|
| | <p>・軟弱層対策工事の実施により工事費が増加したことで、進入路整備の一部を取りやめたことから、R2年度造成工事と合わせて整備が必要となる。</p> | <p>・供用開始をR4年度に予定していることから、R2年度には造成工事を完了させる必要があるため、工事の進捗を適宜確認し、円滑な整備工事に努める。</p> |
| 今後の取り組み方針 | | |
| <p>・R4年度の公営墓地供用開始に向け、公営墓地の造成工事に取り組む。</p> | | |

資金の流れ
(資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する)(単位:千円)

| 総事業費 | 交付対象事業費 | 交付金充当額 | | 交付対象外経費 |
|---------|---------|---------|--------|---------|
| | | 市町村負担金 | | |
| 205,359 | 205,359 | 163,537 | 41,822 | 0 |

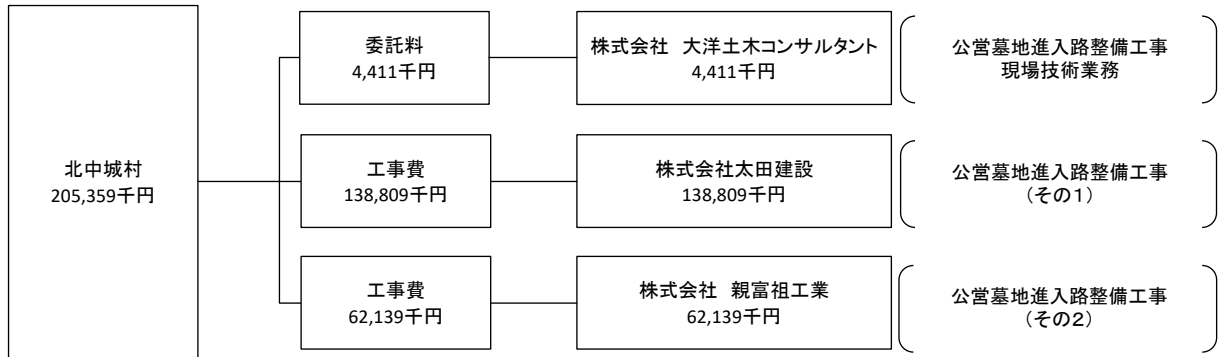

| 資金の流 れ、費 目・ | 評価 | 点検項目 | 評価に関する説明 |
|-------------------|--------------------------------|-----------------------------|--|
| | ○ | 支出先の選定方法は妥当か。 | <p>・委託事業者及び工事請負事業者は、指名競争入札により選定しており、妥当であったと考える。</p> <p>・予算規模については、事前に見積りを取るなど、内容を確認しており妥当であったと考える。</p> <p>・費目・用途については、精算段階で検査を実施しており、事業目的に即し適正であったと判断する。</p> |
| | ○ | 予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。 | |
| | - | 受益者との負担関係は妥当であるか。 | |
| ○ | 費目・用途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。 | | |
