


| | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------------|---|--------------------|-----------------|----------|----------|----------|
| 市町村名 | 伊江村 | | | | | | | |
| 平成30年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【公表用】 | | | | | | | | |
| 事業番号・事業名 | 2-① | 離島定住環境基盤整備事業 | | 沖縄21世紀ビジョン基本計画該当箇所 | 第3章-3-(7)-イ | | | |
| 担当部課名 | 建設課 | 事業実施(予定)年度 | 平成30~令和元年度 | 沖縄振興基本方針該当箇所 | 流通・販売・加工対策の強化 | | | |
| 事業内容 | 村民が安心・安全に日常生活必需品等の荷捌きを実施できる施設を整備する。 | | | | | | | |
| 効果発現年度 | <input checked="" type="checkbox"/> 当年度 <input type="checkbox"/> 後年度(年度) | | | | | | | |
| 実施方法 | <input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 補助 <input type="checkbox"/> 負担 <input type="checkbox"/> その他() | | | | | | | |
| 予算額・執行額 【単位:千円】 (「交付金」+「市町村負担」ベース) | 予算の状況 | | H30年度 | H30年度(繰越) | R1年度 | R2年度 | R3年度 | |
| | | (a) 当初予算額 | 40,000 | - | | | | |
| | | (b) 予算現額 | 56,213 | - | | | | |
| | | (c) 増減額(b-a) | 16,213 | - | 0 | 0 | 0 | |
| | | (d) 繰越額 | - | 30,089 | | | | |
| | | A. 計(b+d) | 56,213 | 30,089 | 0 | 0 | 0 | |
| | | B. 執行済額 | 26,124 | 30,089 | | | | |
| | | うち交付金充当額 | 20,897 | 22,680 | | | | |
| | | 次年度繰越額 | 30,089 | 0 | 0 | | | |
| | | 執行率(%) (B/A) | 46.5% | 100.0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| 予算の状況の説明 | 設計発注当初は直接基礎を想定したが、地質調査において、地盤が液状化すると判断されたため、支持層となる地盤が確認されるまでさらに調査が必要となり基礎の工法検討に不測の日数を要したため、工事費にかかる30,089千円を令和元年度に繰越した。 | | | | | | | |
| 活動目標(指標)及び達成状況 | 30活動目標(指標) | 達成状況 | | | | | | |
| | | | H30年度 | R1年度 | R2年度 | R3年度 | | |
| | | ・荷捌き施設の設計及び整備 (建築場所:本部港、147㎡) | 目標 | (設計及び整備の実施) | () | () | () | |
| | | | 実績 | 設計及び整備の実施完了 | | | | |
| | | ・事務所・冷蔵保管庫の設計及び整備 (建築場所:本部港、24㎡) | 目標 | (設計及び整備の実施) | () | () | () | |
| | | | 実績 | 設計及び整備の実施完了 | | | | |
| 平成30年度に建築実施設計、地質調査を完了し、建築工事、設備工事、工事監理業務に着手。平成30年度(繰越)で建築工事、設備工事、工事監理業務を完了し供用開始した。 | | | | | | | | |
| 成果目標(指標)及び進捗状況 | H30成果目標(指標) | | 基準値(29年度) | H30年度 | R1年度 | R2年度 | 目標値(年度) | |
| | | ・荷捌き施設の設計及び基礎工事の完了 | 目標 | () | (設計及び基礎工事の完了) | () | () | () |
| | | | 実績 | | 設計及び基礎工事の完了 | | | |
| | | | 目標 | () | () | () | () | () |
| | | | 実績 | | | | | |
| | | 進捗状況説明 | ・本部港荷さばき施設の建設については、令和元年度10月末で整備が完了し、令和元年11月から供用開始されている。 | | | | | |

| 取組の検証 | 推進上の留意点(推進上の問題、外部環境の変化) | 改善余地の検証(効率の更なる向上の視点) |
|--|--|------------------------------|
| | ・施設の完成により、伊江村向けと村外向けの貨物の分離ができるようになり、村民が安心・安全に生活必需品等の荷捌きが実施されている。 | ・施設の有効な活用方法等について、関係団体と調整を行う。 |
| 今後の取り組み方針 | | |
| ・適切な管理方法を構築し、今後とも施設利用者に対して、安心・安全に生活必需品等の荷捌きが実施される環境を整えていく。 | | |

資金の流れ
(資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する)(単位:千円)

| 総事業費 | 交付対象事業費 | 交付金充当額 | 市町村負担金 | 交付対象外経費 |
|--------|---------|--------|--------|---------|
| 58,424 | 56,213 | 43,577 | 12,636 | 2,211 |

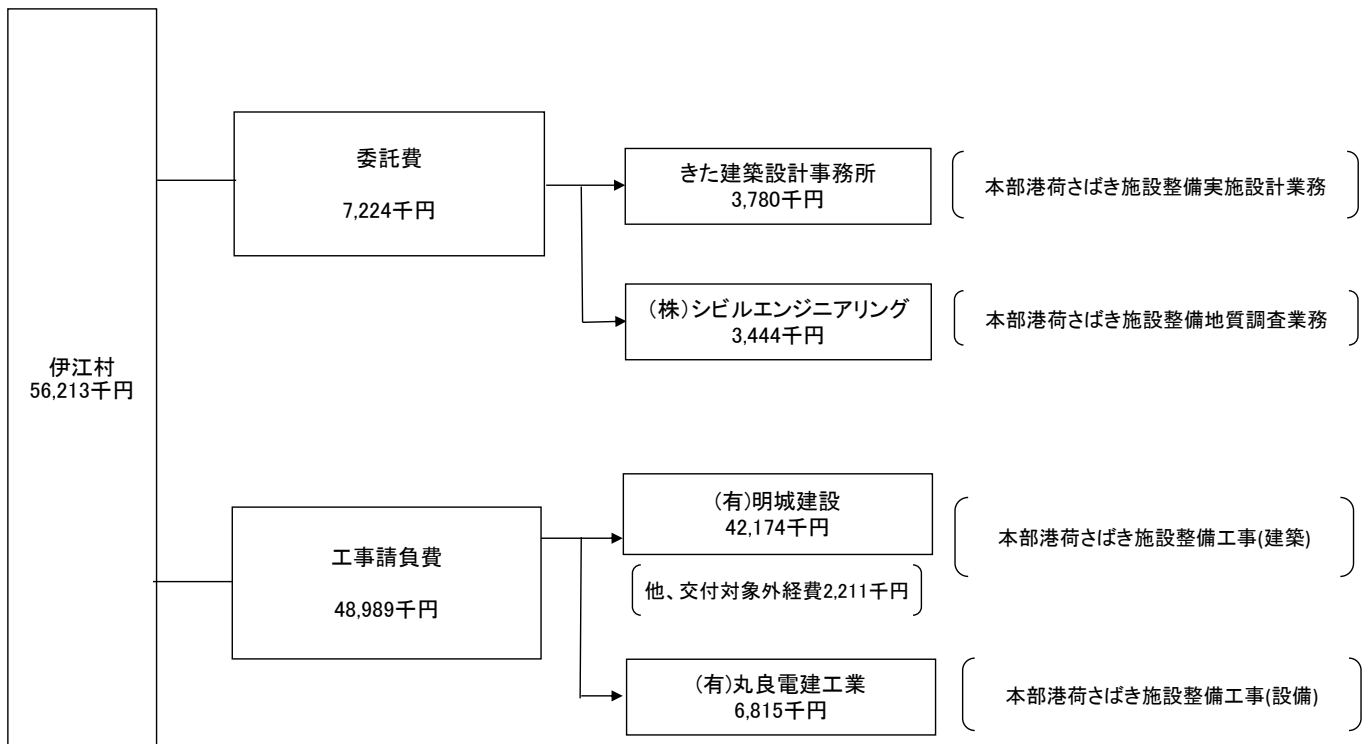

| 資金の 使途の 流れ、 点検 評価 ・ 費目 | 評価 | 点検項目 | 評価に関する説明 |
|--|----|--------------------------------|---|
| | ○ | 支出先の選定方法は妥当か。 | ○委託及び工事の業者選定は指名競争入札により実施しており、妥当であったと考えている。 ○予算規模については適正な規模であったと考えている。 ○費目・使途について事業目的達成の観点から必要なものなのか等については額の確定時において検査、確認しており、適正であった。 |
| | ○ | 予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。 | |
| | - | 受益者との負担関係は妥当であるか。 | |
| | ○ | 費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。 | |
