


県立農業大学校移転整備事業(解体)



	令和6年						令和7年				
	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月
累計計画出来高	0.5%	1.7%	7.0%	18.4%	39.8%	56.9%	71.7%	81.9%	93.0%	98.6%	100.0%
累計実施出来高	0.5%	1.7%	6.2%	19.5%	40.1%	58.6%	71.7%				
進捗率	0.0%	0.0%	-0.8%	1.0%	0.3%	1.7%	0.0%				

R7.1月末現在

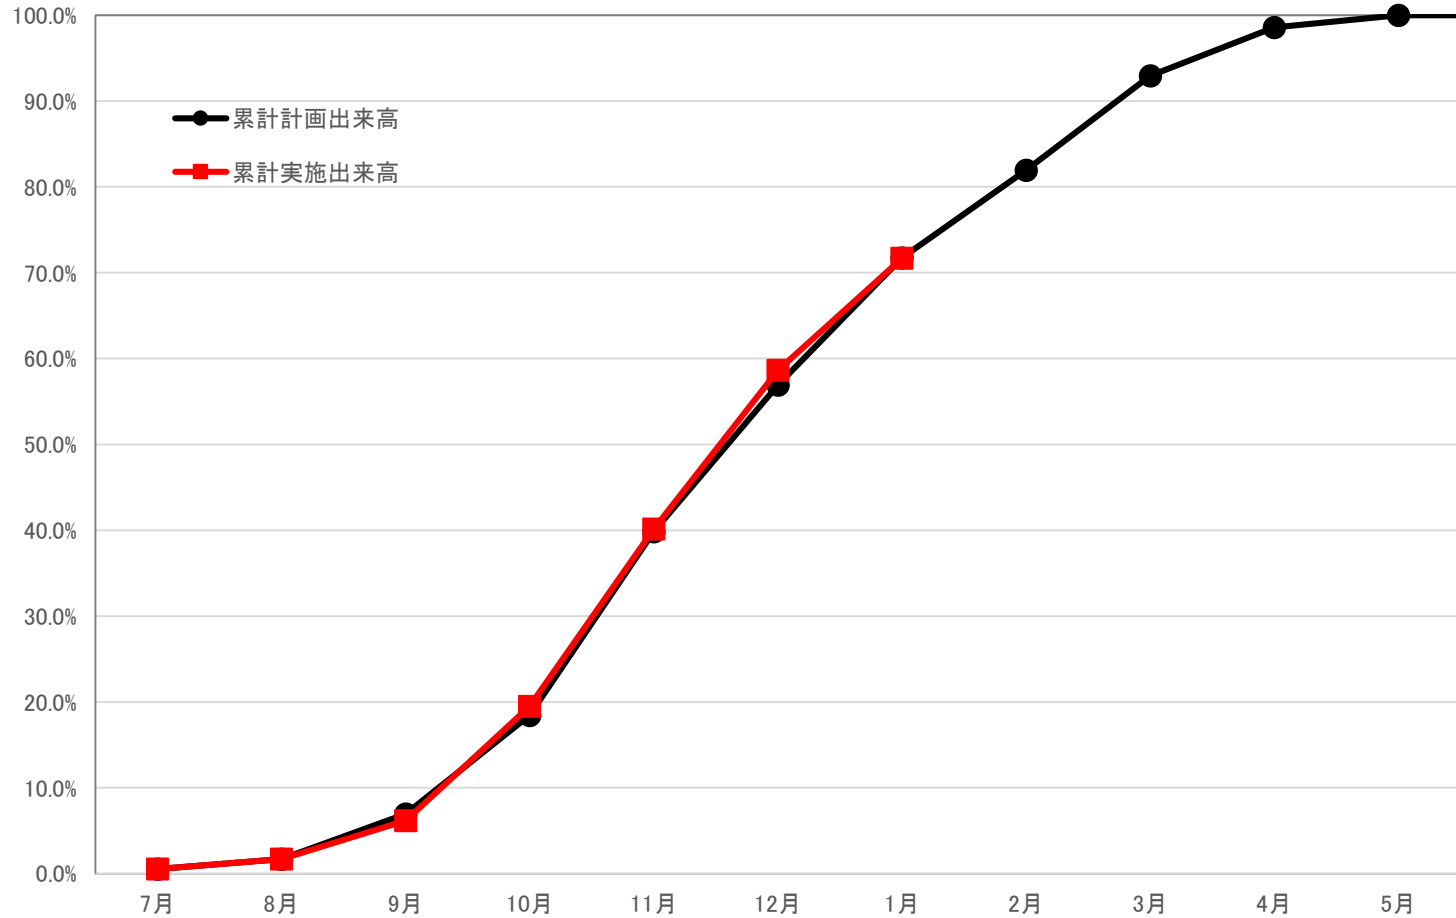
