

安謝川河川改修事業（石嶺工区） 住民説明会

【今回説明の対象区間】
城北小学校近くの沖縄海邦銀行首里支店裏～城北橋
（那覇市首里久場川町一丁目～首里平良町一丁目）


- 日時：令和7年10月30日（木）19:00～20:30
- 場所：那覇市首里平良町自治公民館

沖縄県土木建築部南部土木事務所河川港湾班

- 安謝川河川改修事業の概要と進捗状況
- 当面の事業計画
(磁気探査、建物調査、小規模な工事)

安謝川流域の概要

安謝川流域

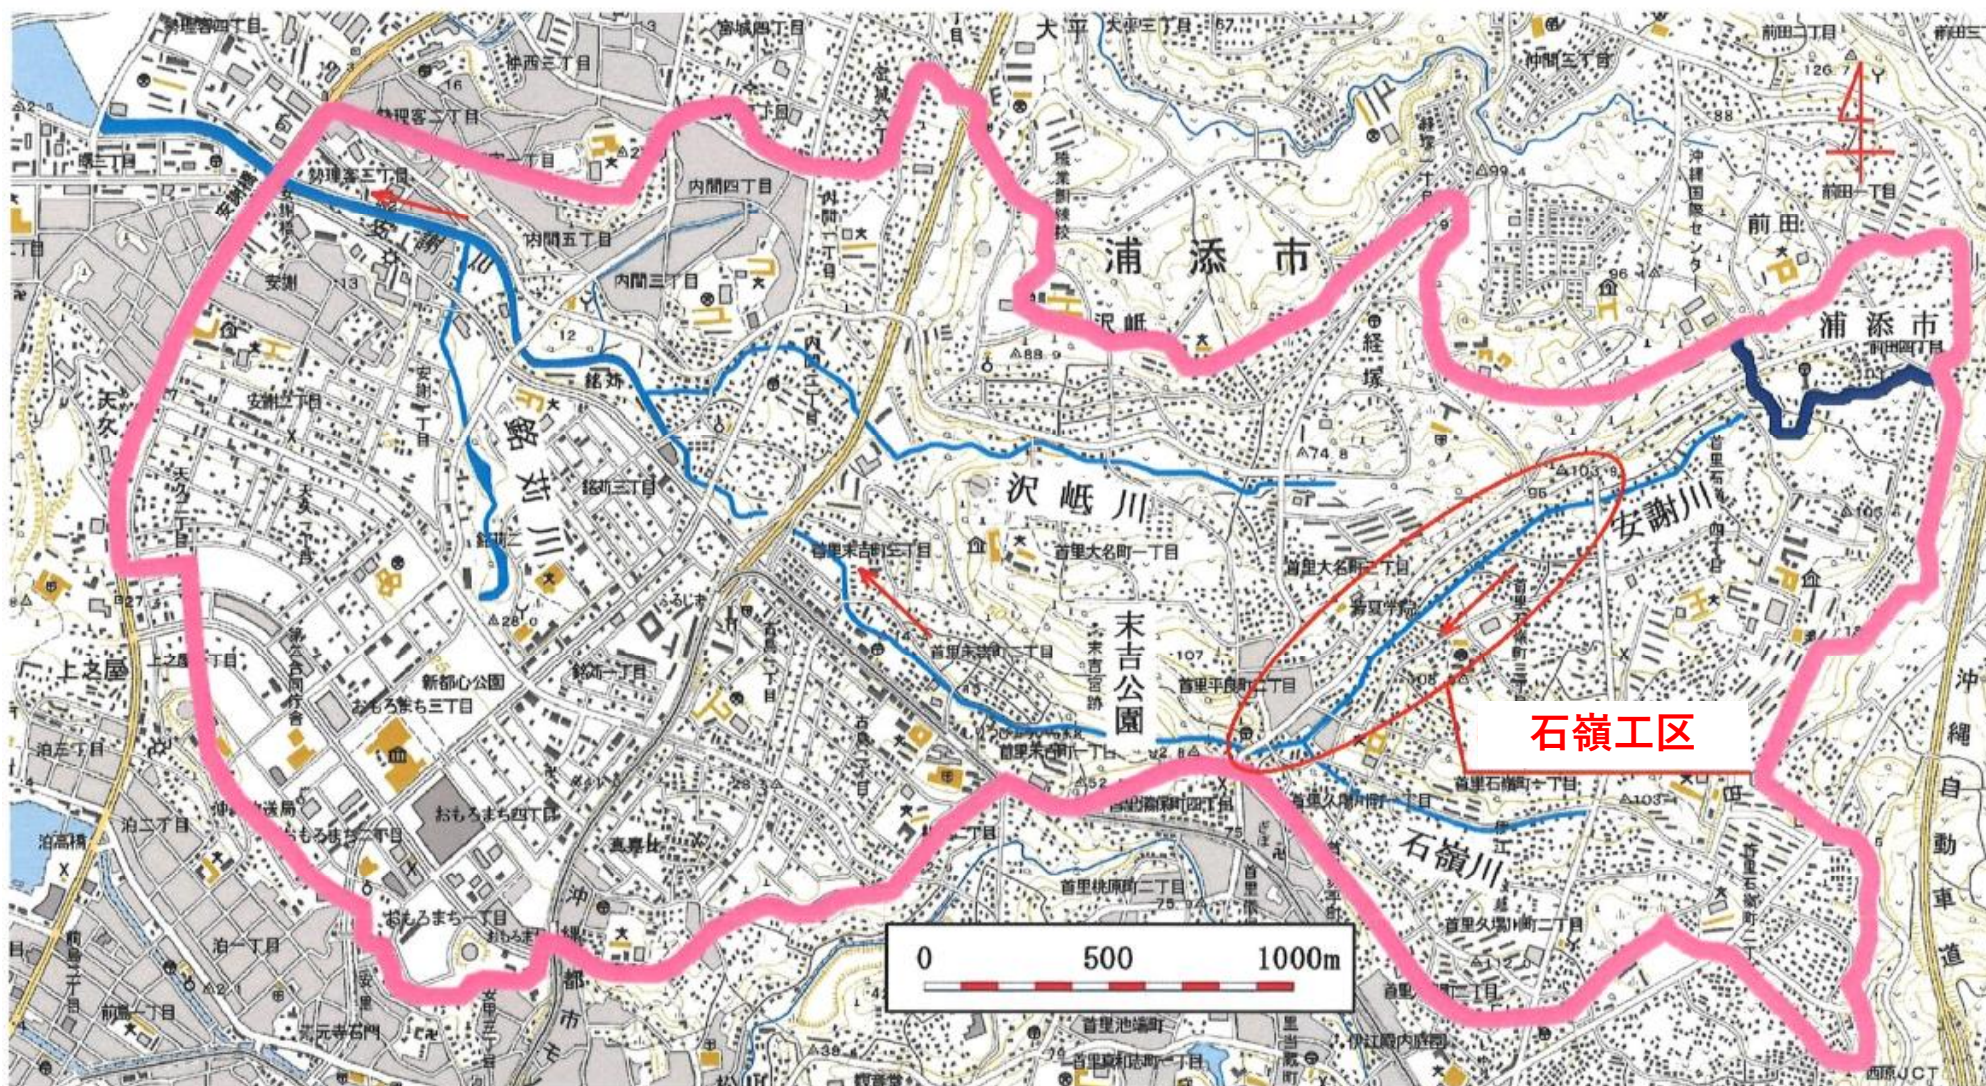

■ 指定延長: 5.2km

■ 流域面積: 8.1km²

【全体事業計画】

- ・事業延長: L=5.0km
- ・事業区間: 那覇市首里石嶺町3丁目から河口まで
- ・事業期間: 昭和47年度～令和23年度
- ・整備内容: 河道拡幅及び護岸等の整備



現状

- 台風や豪雨による出水によって度々**浸水被害**を受けております。
- 令和6年6月14日の集中豪雨では、**新開橋付近から上流の区間**において**床上・床下浸水**など**甚大な被害**に見舞われました。

主な浸水被害歴（石嶺工区）

災害発生年月日	災害原因	被害状況	
昭和60年8月5日	豪雨及び台風8・9号	床下浸水 81棟	床上浸水 169棟
平成10年2月18日	豪雨	9棟	22棟
平成10年7月16日	豪雨	5棟	20棟
平成11年9月22日	台風18号	53棟	32棟
平成12年11月9日	豪雨	5棟	—
平成13年9月23日	台風19号	1棟	—
令和3年6月17日	豪雨	1棟	—
令和6年6月14日	豪雨	19棟	22棟




令和6年6月14日の
豪雨時の様子
※最寄りの観測雨量
(安岡) 66mm/h



事業の目的

浸水被害の防止
50年確率降雨（99.8mm/h）に対応

新開橋付近
(令和6年6月14日)

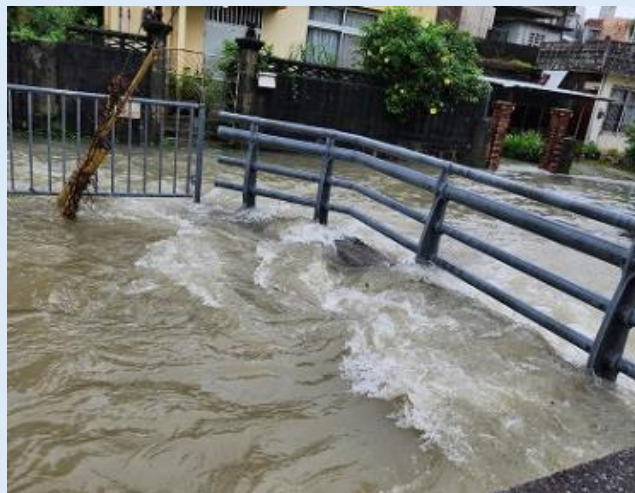

環境に配慮した多自然川づくり

自然石を使用した石積護岸



石嶺工区の概要



■ 概要(石嶺工区)

- 事業延長: 1.1m (概成済み延長除く)
- 事業区間: 石嶺川合流部(沖縄海邦銀行首里支店裏)
～ 那覇市道鳥堀石嶺線(サンエー食品館石嶺店)
- 事業期間: 平成22(2010)年度～令和23(2041)年度

石嶺工区の進捗状況

■経緯

- 平成22(2010)年度 ・地質調査・測量・設計業務に着手。
- 平成25(2013)年度 ・用地測量業務に着手。
- 平成26(2014)年度 ・用地交渉に着手。以降用地取得を推進中。
- 令和元(2019)年度 ・事業期間を延長。
(令和6年度まで→令和11年度まで)
- 令和06(2024)年度 ・事業期間を延長。
(令和11年度まで→令和23年度まで)
・今回着手区間の全ての事業用地を取得。

石嶺工区の進捗状況



進捗状況

	河川工事 (km)	用地取得 (千m2)	用地取得 (筆数)
計 画	1.1	10.70	131
実施済み	0.0	2.78	30
率	0%	26%	23%

※令和7年3月末時点

事業期間長期化の背景

事業期間が長期化しております。
主な理由(課題)は次の3点です。

用地の課題

相続問題、代替地の確保、集合住宅補償、境界未確定問題等により時間を要しております。



予算の確保

予算の確保が困難となっております。




事業の特徴


河川事業は下流から整備する必要があり長期間を要する特徴があります。



下流から河川整備する理由

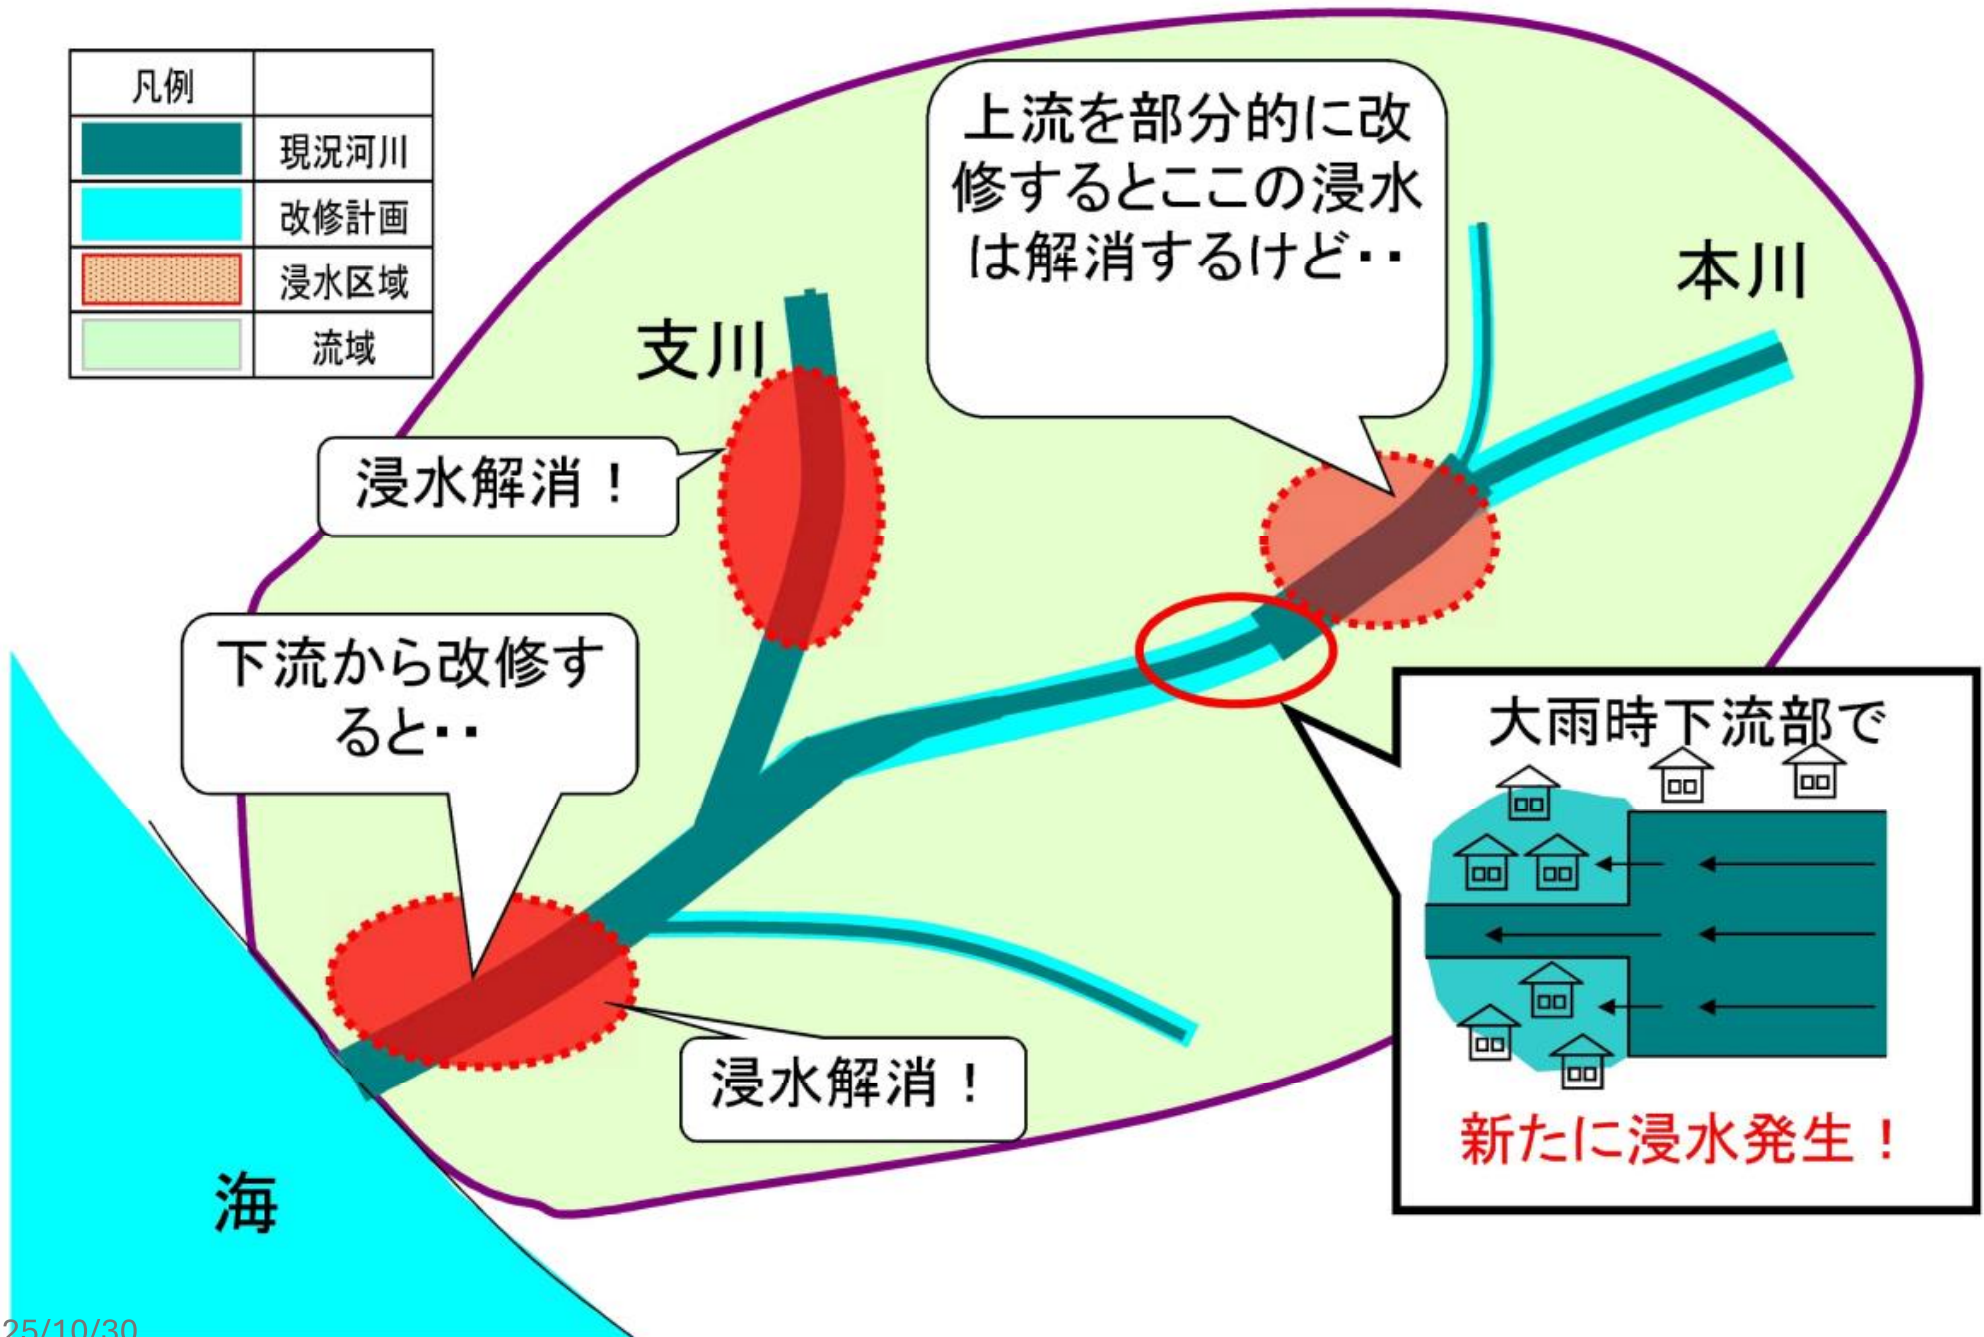

今回着手する区間（計画平面図）

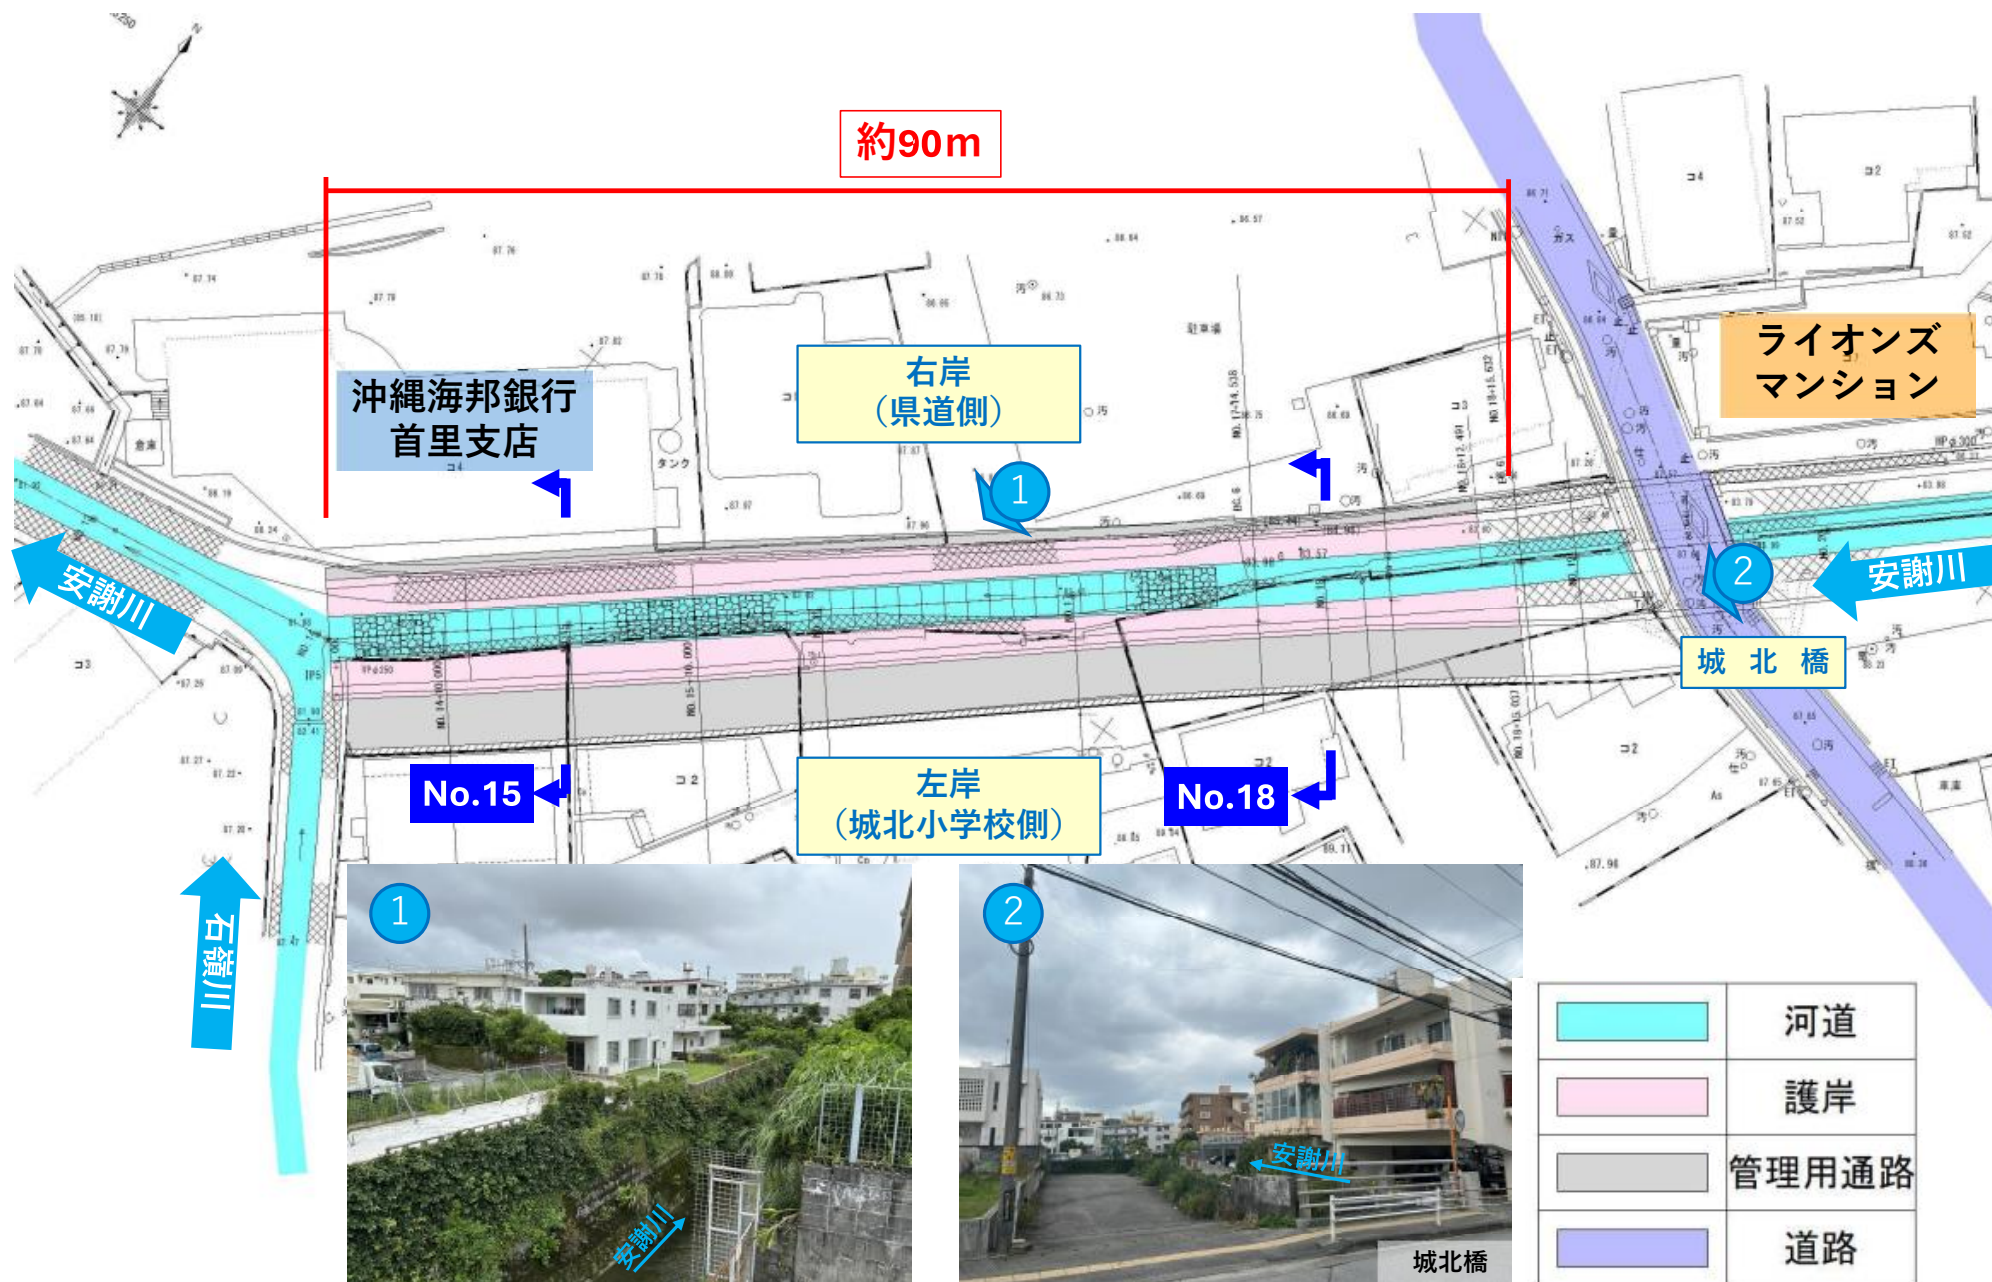

両岸に河川管理用通路を整備


- 河川の拡幅と併せて、左岸（城北小学校側）に**4m**、右岸（県道側）に**1m**の河川管理用通路を整備します。

河川管理用通路とは


- 河川巡視、水防活動や災害復旧工事の際の通行のために設けられた通路です。
- 河川は公共用物であり、原則として誰もが自由に利用することが可能。
- そのため、河川管理用通路は、基本的に河川管理の支障等にならない限り通行も可能です。
- 河川管理上必要と認められる場合は、車止め等で車両通行を制限することがあります。




今回着手する区間（計画平面図）

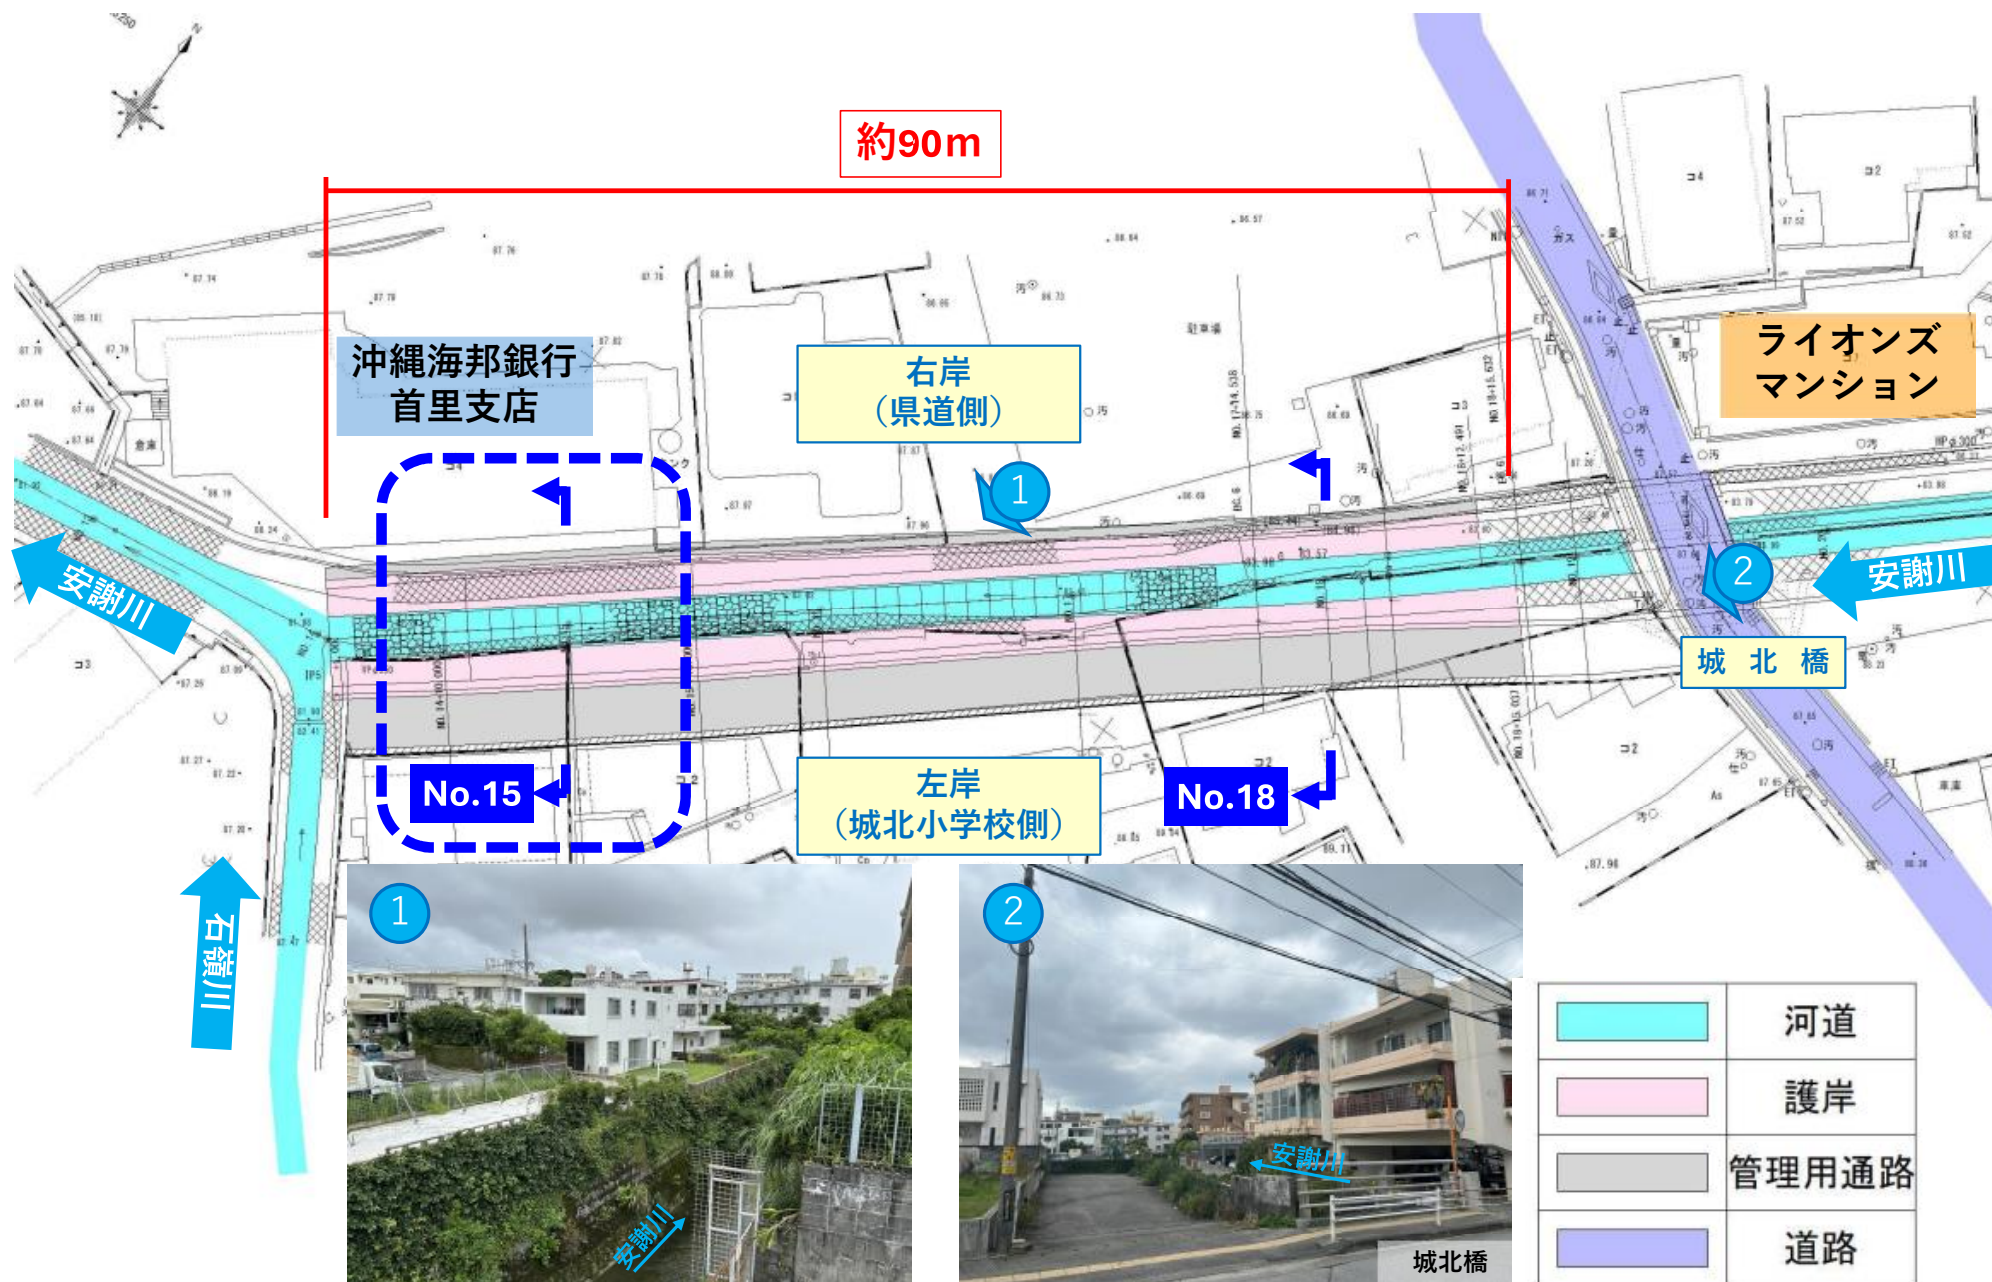


今回着手する区間（標準断面図）

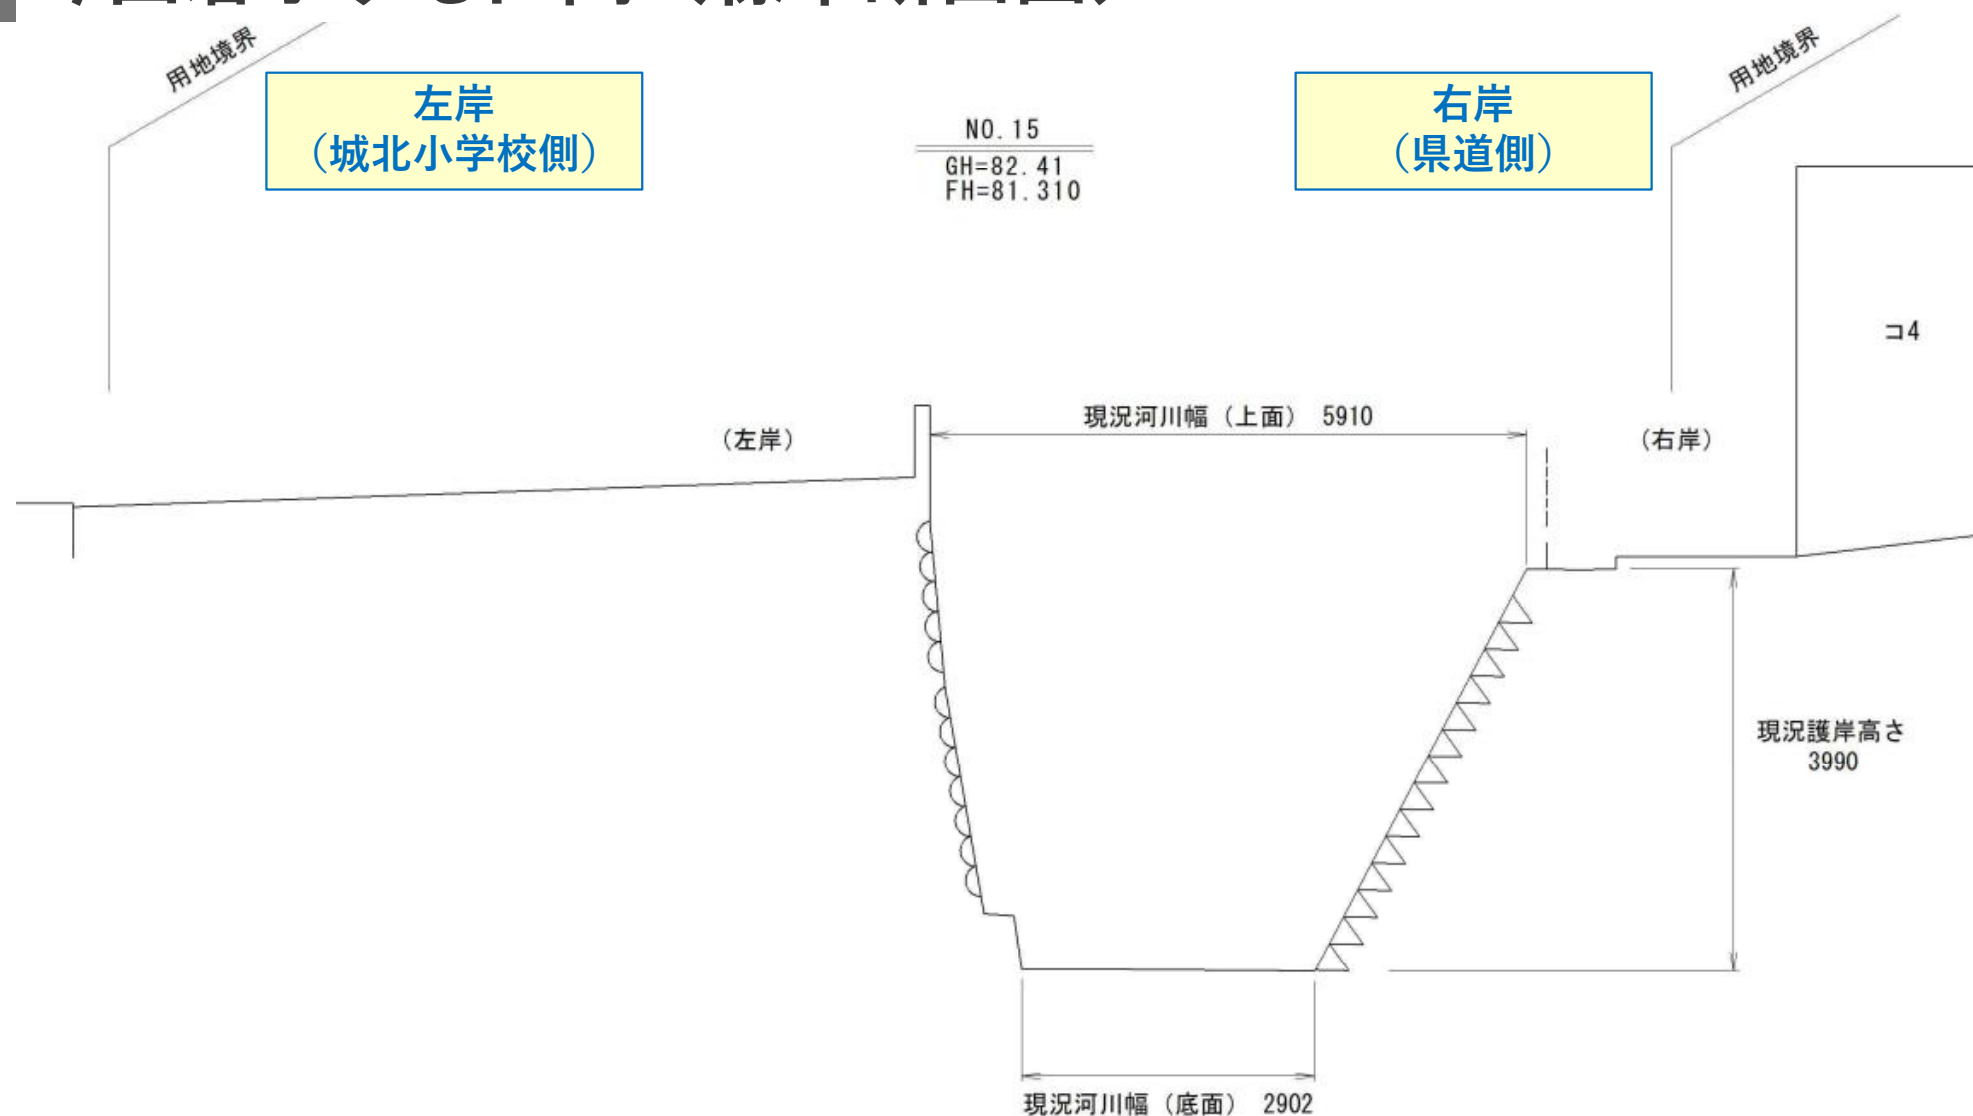


今回着手する区間（標準断面図）

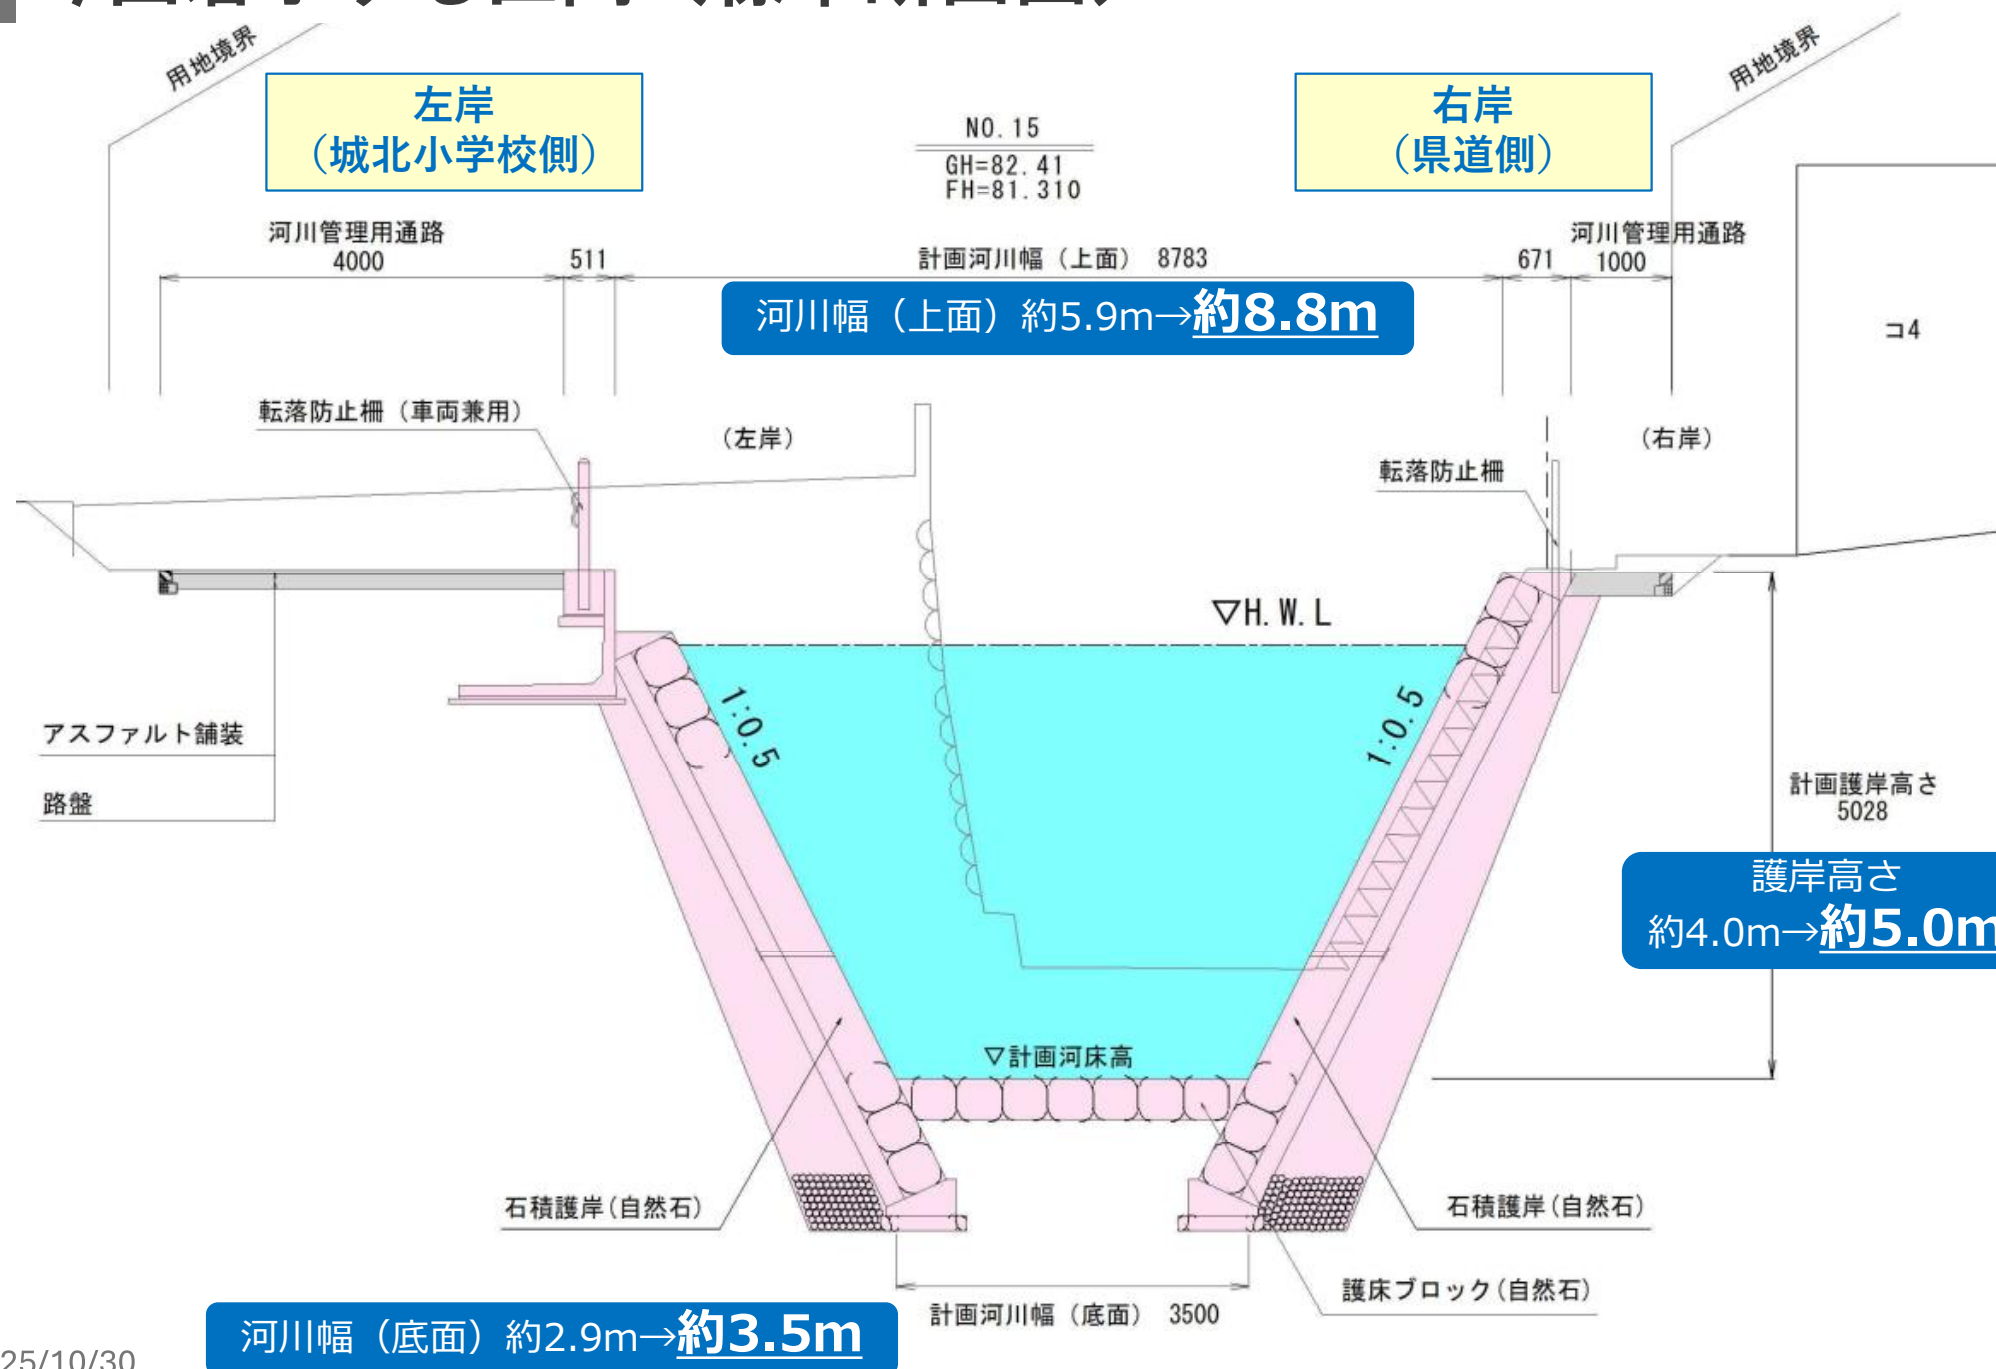


今回着手する区間（計画平面図）

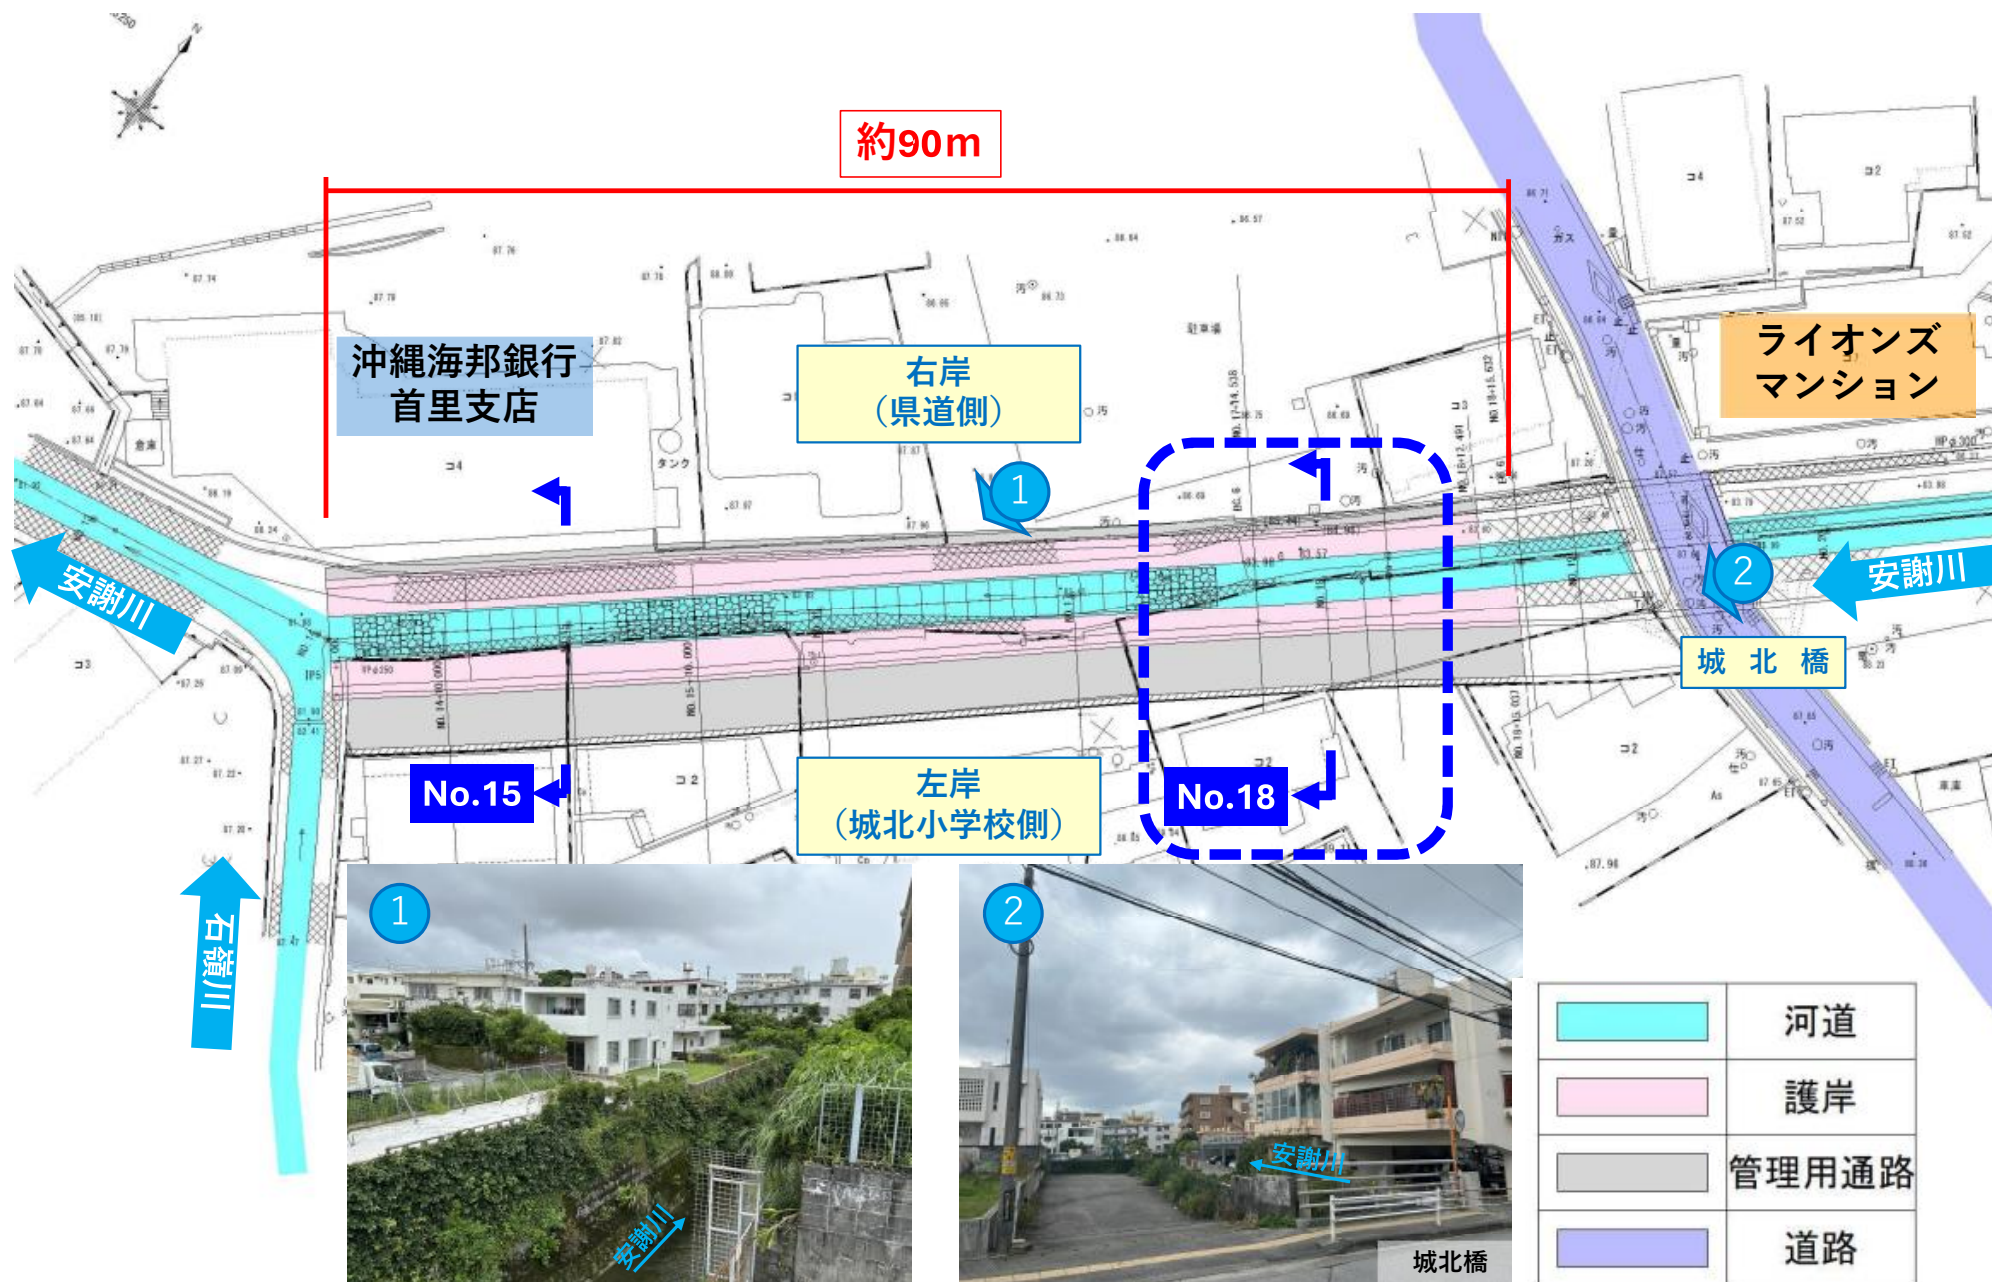

今回着手する区間（標準断面図）

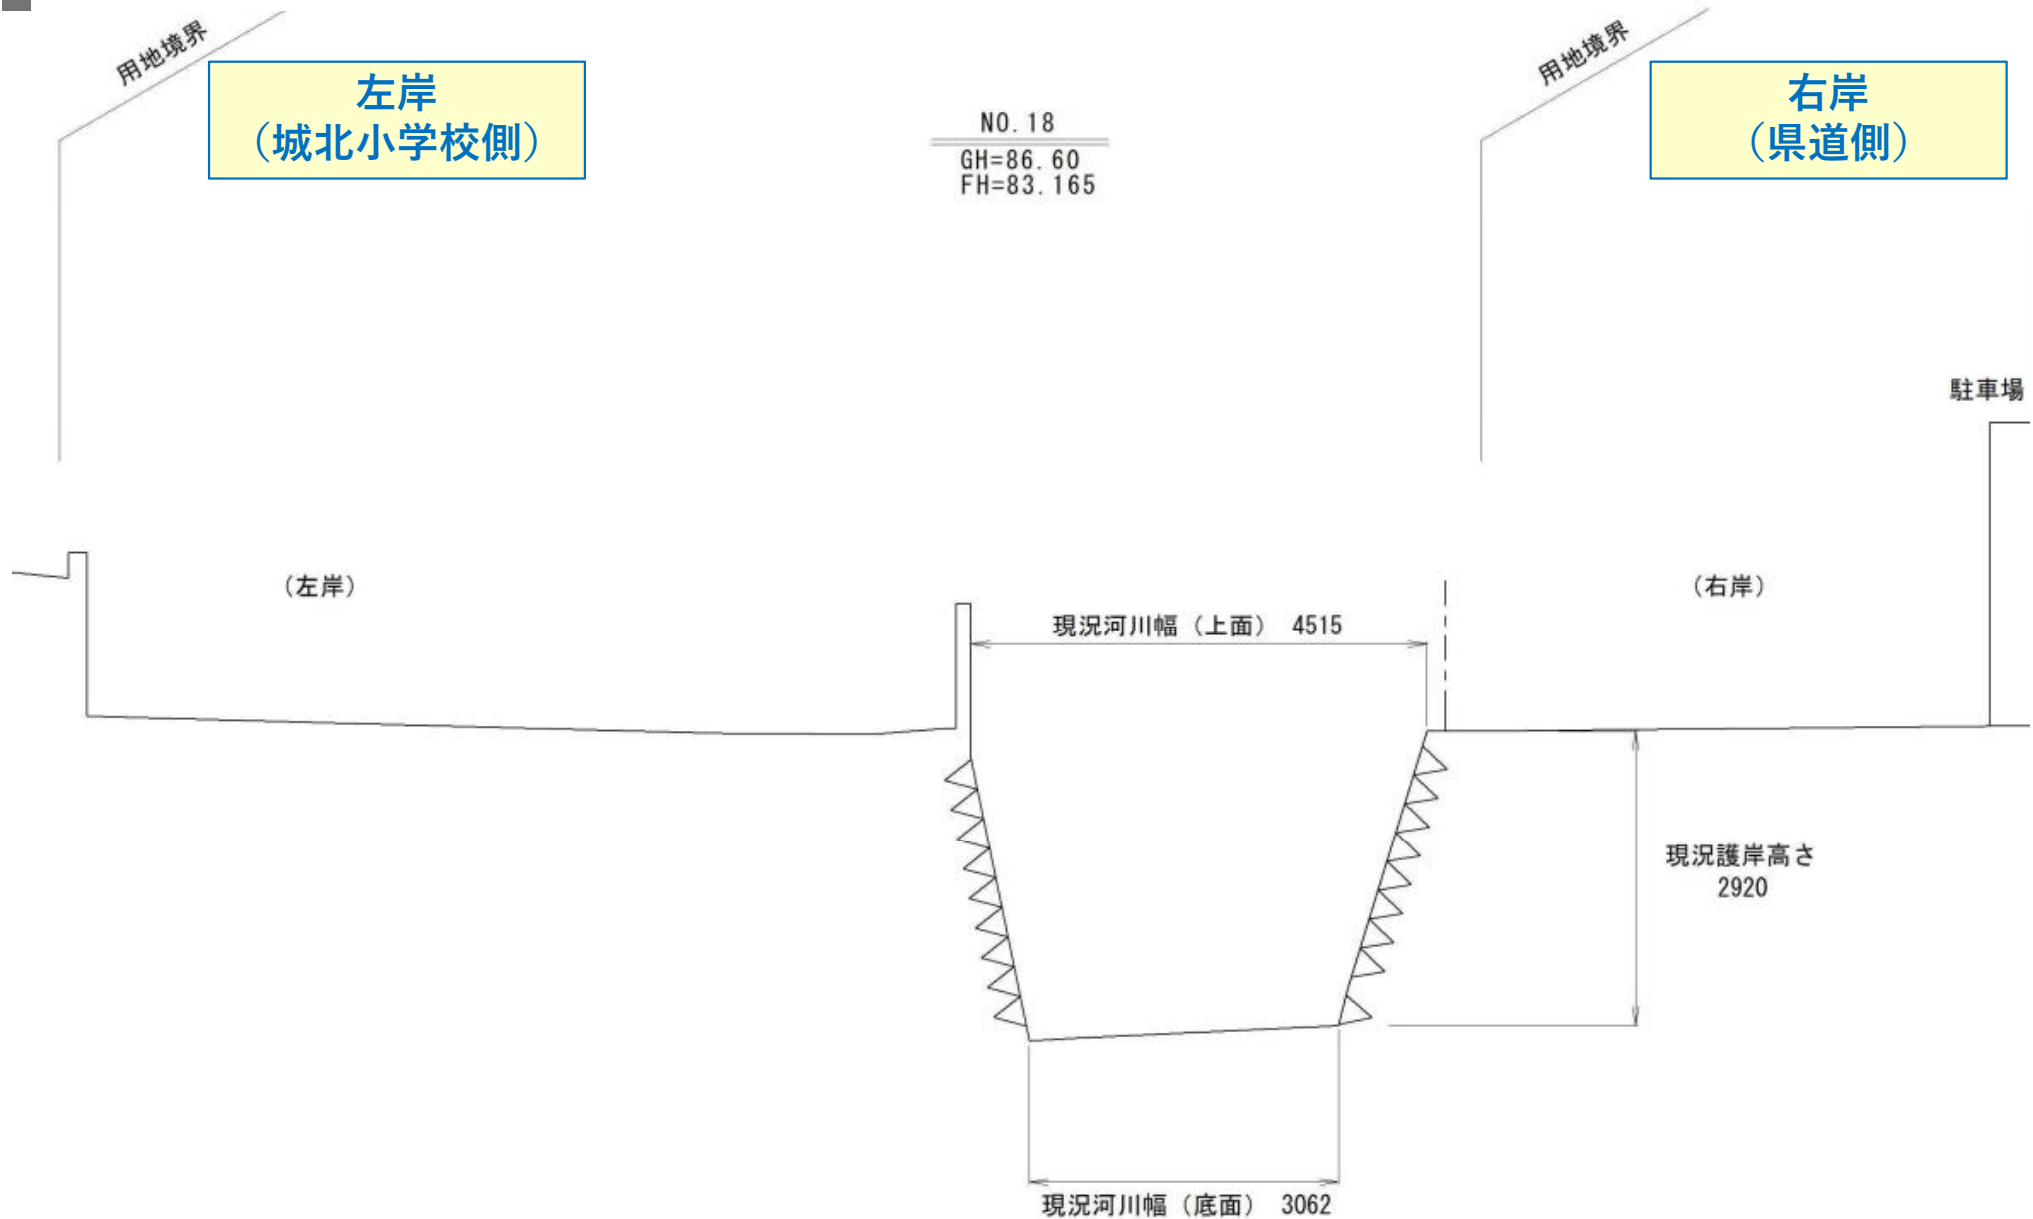

今回着手する区間（標準断面図）

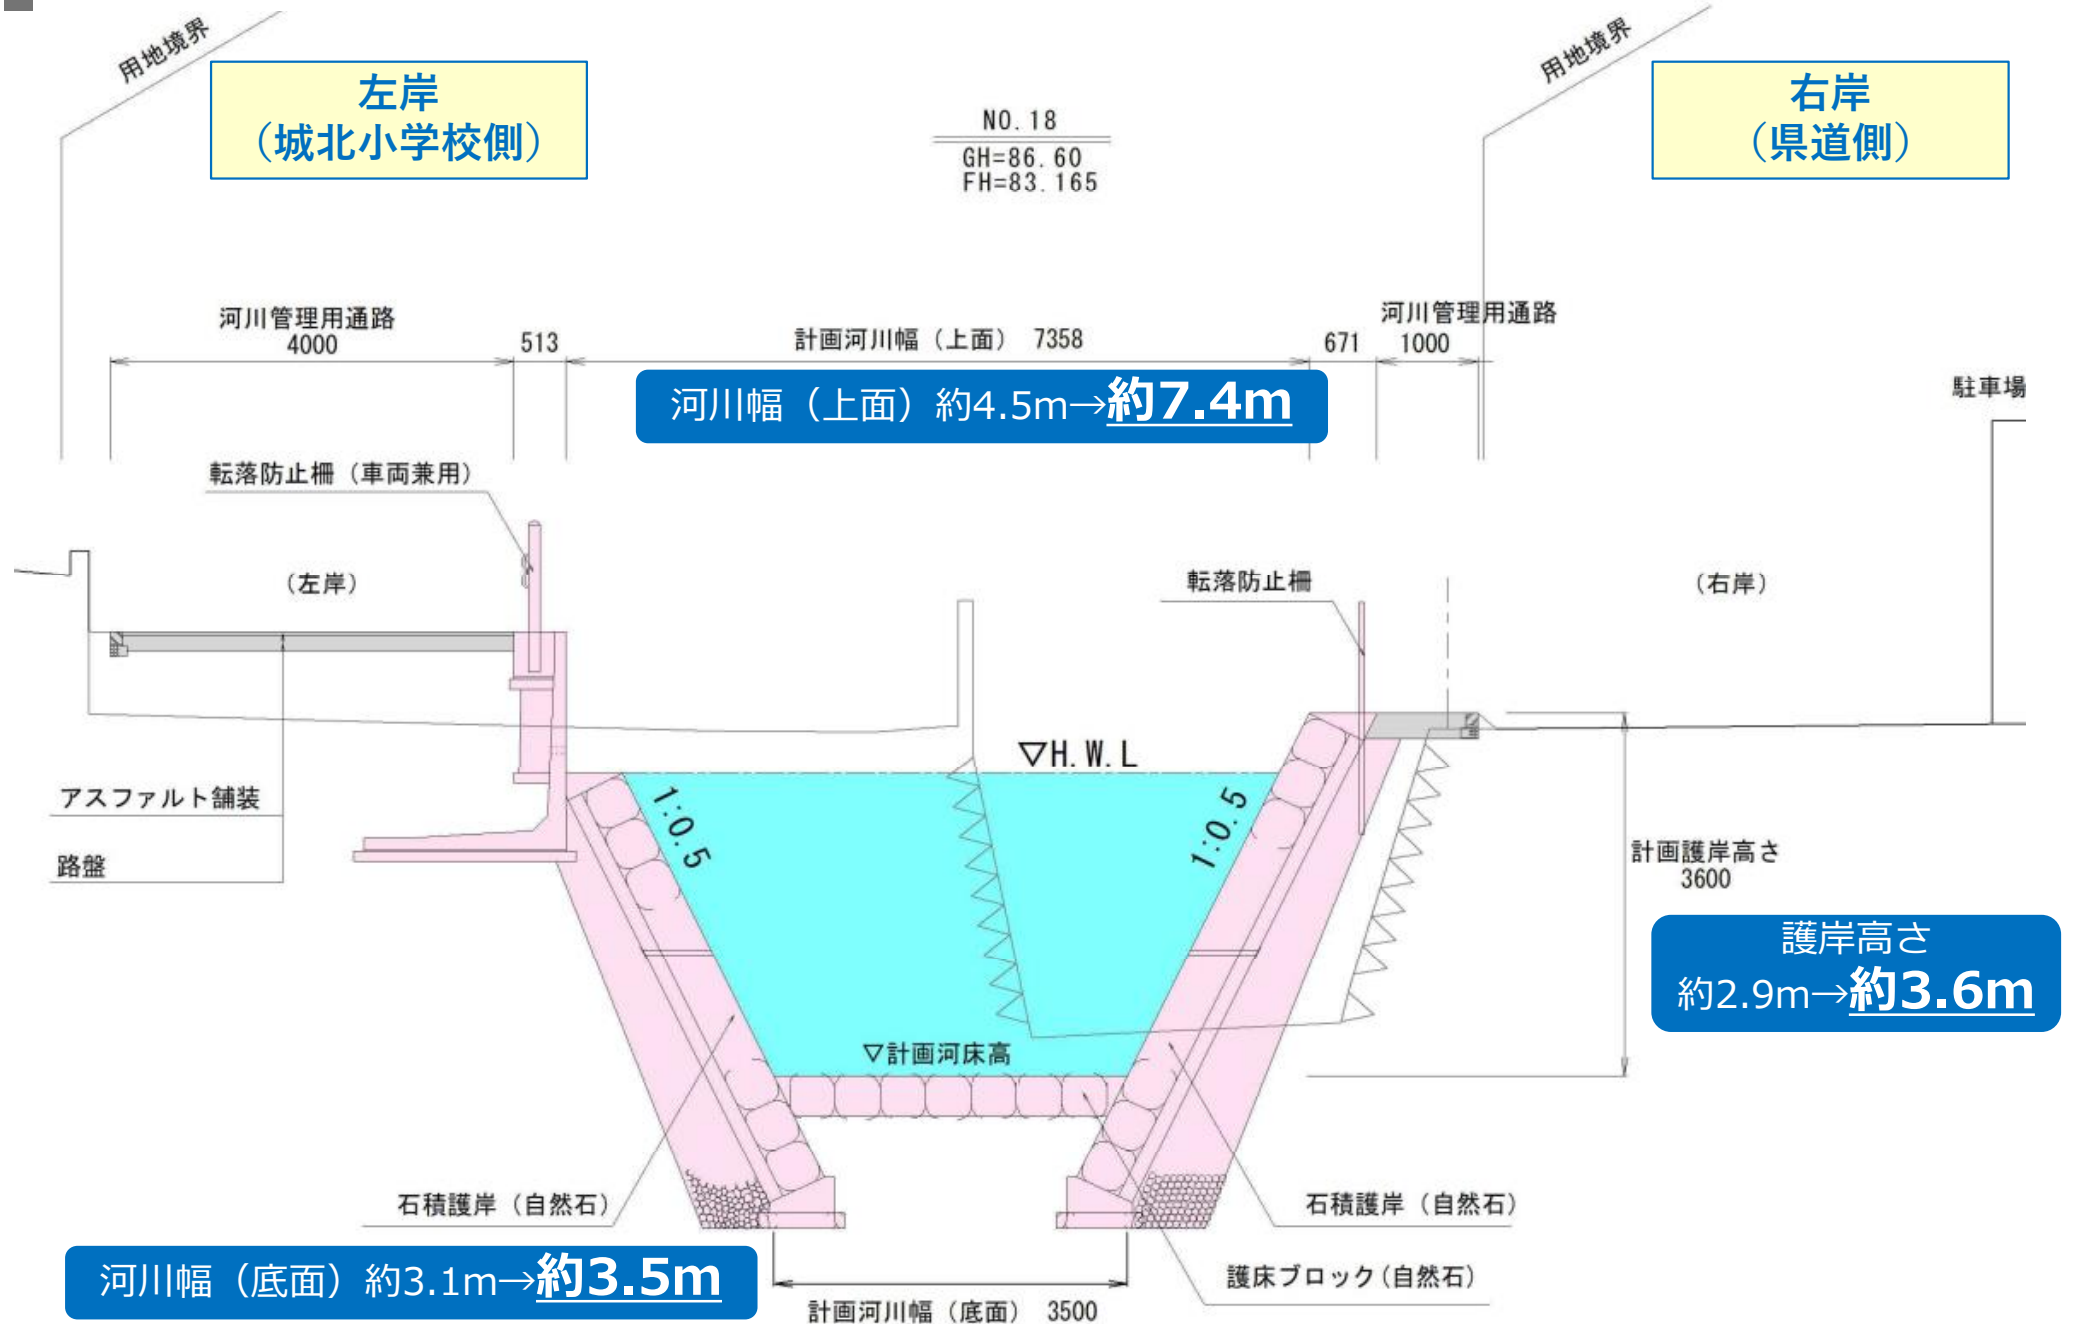

令和7年度内のスケジュール

- 小規模土木工事：令和7年11月
 - 磁気探査調査：令和7年12月～令和8年3月
 - 建物調査：令和7年12月～令和8年3月
- ※スケジュールは、今後変更となる場合があります。

10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月以降
	小規模 土木工事	磁気探査調査				仮設 土木工事
		建物調査				

令和8年度以降のスケジュール

- 仮設土木工事：令和8年4月以降
 - 護岸拡幅工事：令和8年度後半、またはそれ以降
- ※スケジュールは、今後変更となる場合があります。

10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月以降
	小規模 土木工事	磁気探査調査				仮設 土木工事
		建物調査				

各作業に共通する周辺環境及び安全管理対策

- 作業時間は、基本的に8:30～17:30とし、早朝・夜間、土日祝日の作業は原則行いません。
- 建設作業機械等を作業現場へ搬入・搬出する場合は、小学校の登下校の時間帯を避けることを基本とします。その場合でも、誘導員を配置する等して、歩行者の安全安心な通行を最優先します。
- 現場への進入ルートは、可能な限り県道側（ファミリーマート城北小学校前店）からとし、徐行の上で通行します。



10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月以降
	小規模 土木工事	磁気探査調査				仮設 土木工事
		建物調査				

実施内容

- 磁気探査調査で使用するボーリングマシンの現場搬入に支障となる既存のブロック塀の取壊し作業や柵の取り外し作業の小規模な土木工事を行います。

建設機械と作業イメージ

- 小型ダンプトラックと小型バックホウを使用します。



10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月以降
	小規模 土木工事	磁気探査調査				仮設 土木工事
		建物調査				

実施内容

- 本格的な工事に先立って、工事区域に不発弾が埋没されていないかを確認する目的で土中の磁気探査を実施します。
- 河川内での作業となるため、作業前には仮設足場を設置します。

建設機械と作業イメージ

- 小型ダンプトラック、仮設足場材(単管・杉板)、ボーリングマシンを使用します。




10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月以降
	小規模 土木工事	磁気探査調査				仮設 土木工事
		建物調査				

実施内容

- 河川に近接する建物を対象に工事に伴う振動等による建物への影響の有無を事後検証できるように、工事に先立ち専門業者にて建物調査を行います。

作業イメージ

- 建物調査(ひび割れ、傾き、シミ等)を行い、工事前の建物の状況を記録します。

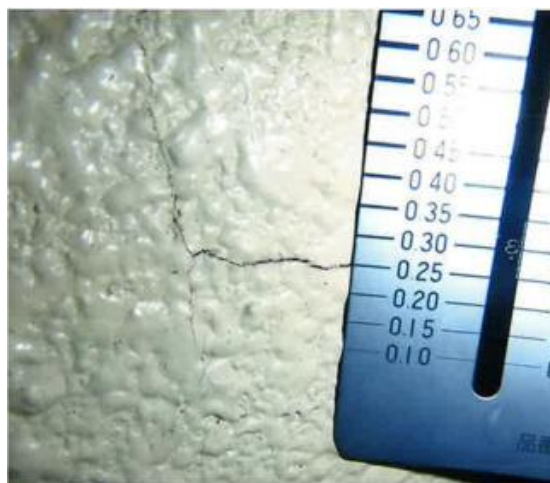

後日、対象の家屋について、専門業者が個別にご訪問させていただき、詳細をご説明いたしますので、建物調査へのご理解、ご協力をよろしくお願いします。

10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月以降
	小規模 土木工事	磁気探査調査				仮設 土木工事
		建物調査				

実施内容

- 今後の河川拡幅工事の実施時に周辺の土地や建物を保全する目的で、敷地境界付近に仮設土留のH鋼杭(Hの形をした鋼製の杭)を土中に建て込みます。

作業イメージ

- ①機械による先行削孔→②H鋼杭建込の工程を所定の本数分繰り返します。



今後発注予定のため、詳細は4月以降に追ってお知らせします。

事業計画全般に関する問い合わせ

※工事・調査業務に関する問い合わせは受注企業宛てご連絡ください。

- 沖縄県南部土木事務所 河川港湾班

 098-867-4891(直通)

 xx060038@pref.okinawa.lg.jp(代表)

用地取得に関する問い合わせ

- 沖縄県南部土木事務所 河川都市用地班

 098-866-1182(直通)

 xx060038@pref.okinawa.lg.jp(代表)

沖縄県土木建築部南部土木事務所

- 那覇市旭町116番地37
- 沖縄県南部合同庁舎8階



安謝川の整備に関する情報は
沖縄県南部土木事務所ホームページ
でもご確認ください

安謝川河川改修事業

