

市町村名	南大東村						
平成30年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【公表用】							
事業番号・事業名	5①	南大東村安らぎ空間複合施設整備事業					
担当部課名	福祉民生課	事業実施(予定)年度 H30～R3年度					
		沖縄21世紀ビジョン基本計画該当箇所					
		沖縄振興基本方針該当箇所					
事業内容	第3章-3-(11)-イ 生活環境基盤の整備及び教育・医療・福祉における住民サービスの向上 III-9 本村には葬祭場がないため各自宅で葬儀を行っているが、準備等は地域の住民の協力で行われており、遺族や関係者に負担がかかっている。そのため、葬祭場等の複合施設を整備し、住民福祉の向上を図る。						
効果発現年度	<input type="checkbox"/> 当年度 <input checked="" type="checkbox"/> 後年度(令和4年度)						
実施方法	<input type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 補助 <input type="checkbox"/> 負担 <input type="checkbox"/> その他( )						
予算額・執行額 【単位:千円】 (「交付金」+「市町村負担」ベース)		H29年度	H30年度	H30年度(繰越)	R1年度	R2年度	
	予算の状況 (a) 当初予算額 (b) 予算現額 (c) 増減額(b-a) (d) 繰越額 A. 計(b+d)			23,279	0		
				45,236	0		
			0	21,957	0	0	0
			—		24,416		
		0	45,236	24,416		0	0
	B. 執行済額			20,820	19,509		
	うち交付金充当額			16,655	15,607		
	次年度繰越額			24,416			
	執行率(%) (B/A)		#DIV/0!	46.0%	79.9%	#DIV/0!	#DIV/0!
予算の状況の説明		H30年度の繰越額は24,416千円で計上したが実施設計業務入札残に伴い、19,509千円で執行した。					
活動目標(指標)及び達成状況	30活動目標(指標)		達成状況				
			H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	
	基本計画・基本設計	目標	( )	( 基本計画・基本設計 )	( )	( )	
		実績		基本計画・基本設計完了			
	実施設計	目標	( )	( )	( 実施設計 )	( )	
		実績			実施設計完了		
達成状況説明	平成30年度に基本計画及び基本設計を完了し、令和元年度に実施設計を完了した。						
成果目標(指標)及び進捗状況	H30成果目標(指標)		基準値(年度)	H29年度	H30年度	R1年度	目標値(年度)
	基本計画・基本設計の完了	目標	( )	( )	( 計画・設計完了 )	( )	( )
		実績			完了		
	【参考指標】	目標	( )	( )	( 計画・設計完了 )	( )	( )
		実績					
	進捗状況説明	基本計画は平成30年9月、基本設計は平成30年12月に完了した。実施設計は繰越にて令和元年7月に完了した					


取組の検証	推進上の留意点(推進上の問題、外部環境の変化)	改善余地の検証(効率の更なる向上の視点)
	基本計画及び基本設計は平成30年度内に計画どおりに執行できたが、実施設計は住民説明会等で、設置場所の検討に不測の日数を要し、年度内には完了できず繰越となった。	本事業を計画、実施するにあたり、一部の住民が自分の関係する敷地や土地の近場に計画するのを懸念しがちであることから、本事業の必要性をより一層理解と協力を求めていく必要がある。

**今後の取り組み方針**

今後は一日も早く工事着工に向けて、工程会議等を積極的に随時行い取り組んでいく。

**資金の流れ**  
(資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する)(単位:千円)

総事業費	交付対象事業費	交付金		交付対象外経費
		充当額	市町村負担金	
19,509	19,509	15,607	3,902	

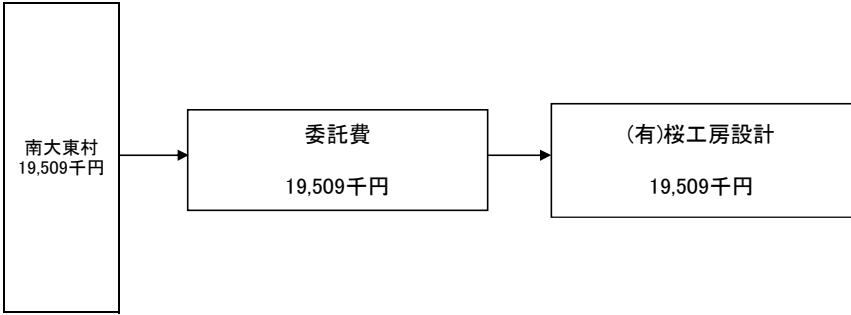

資金の流 れ、費目・ 点検評価	評価	点検項目	評価に関する説明	
			支出先の選定方法は妥当か。	
			予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。	
			受益者との負担関係は妥当であるか。	
			費目・用途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。	
