


市町村名		竹富町					
平成30年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【公表用】							
事業番号・事業名	1-⑥	複合型福祉施設整備事業			沖縄21世紀ビジョン 基本計画該当箇所	第3章-2-(2)-イ	
担当部課名	福祉支援課	事業実施 (予定)年度	平成27~令和3年度		沖縄振興基本方針 該当箇所	地域における子育て支援の充実  III-4	
事業内容	本町での質の高い幼児期の学校教育・保育及び地域の子ども・子育て支援事業を計画的に実施し、地域で暮らす高齢者等ができる限り住み慣れた地域において自立した生活が送れるよう支援していくために「複合型福祉施設」を整備し、子育て環境及び高齢者福祉拠点施設を整備する。						
効果発現年度	<input type="checkbox"/> 当年度 <input checked="" type="checkbox"/> 後年度(R2年度)						
実施方法	<input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 補助 <input type="checkbox"/> 負担 <input type="checkbox"/> その他( )						
予算額・執行額 【単位:千円】 (「交付金」+ 「市町村負担」 ベース)	予算の 状況	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H30年度(繰越)	
		(a)当初予算額	9,500	17,700	5,472	155,346	0
	(b)予算現額	8,964	20,553	10,384	187,683	0	
	(c)増減額(b-a)	▲536	2,853	4,912	32,337	0	
	(d)繰越額	—	—	—	—	166,431	
	A.計(b+d)	8,964	20,553	10,384	187,683	166,431	
	B.執行済額	8,964	20,553	10,384	21,252	158,398	
	うち交付金充当額	7,171	16,441	8,307	17,001	119,938	
	次年度繰越額	0	0	0	166,431	0	
	執行率(%) (B/A)	100.0%	100.0%	100.0%	11.3%	95.2%	
予算の状況の説明	平成30年度以降に整備する予定の西表上原複合型福祉施設に係る実施設計業務を追加し、波照間複合型福祉施設建設工事の積算見直しを行ったところ、請負業者の渡航費等が必要となったため、事業費の増額を行った。 また、工事入札が不調となり、設計の見直しに不測の日数を要したため、事業費166,431千円を次年度に繰越した。						
活動目標 (指標) 及び達成状況	30活動目標(指標)		達成状況				
			H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	
	建設工事(波照間)の実施	目標	(基本設計実施)	(実施設計実施)	(建設工事実施)	( )	
		実績	基本設計実施	基本設計実施	建設工事実施		
	実施設計委託業務(西表(東部)・(上原))の実施	目標	(基本計画実施)	(基本設計実施)	(実施設計実施)	( )	
		実績	基本計画実施	基本設計実施	実施設計実施		
基本設計委託業務(竹富・小浜)の実施	目標	( )	( )	(基本設計実施)	( )		
	実績			基本設計実施			
達成状況説明	<ul style="list-style-type: none"> <li>波照間地区において、複合型福祉施設の建設工事を実施した。</li> <li>西表(東部)地区、西表(上原)地区について、複合型福祉施設の整備に向けた実施設計を行った。</li> <li>竹富地区、小浜地区について、複合型福祉施設の整備に向けた基本設計を行った。</li> </ul>						
成果目標 (指標) 及び進捗状況	H30成果目標(指標)		基準値 (年度)	H29年度	H30年度	R1年度	目標値 (R2年度)
	建設工事(波照間)の完了	目標	( )	(実施設計完了)	(建設工事完了)	( )	( )
		実績			実施設計完了	建設工事完了	
	実施設計委託業務(西表(東部)・(上原))の完了	目標	( )	(基本設計完了)	(実施設計完了)	( )	( )
		実績			基本設計完了	実施設計完了	
	基本設計委託業務(竹富・小浜)の完了	目標	( )	( )	(基本設計完了)	( )	( )
実績				基本設計完了			
【R2年度成果目標】 子育て支援が充実したかを含め、当該施設のあり方についてアンケート調査により検証する。	目標	( )	( )	( )	( )	(80%)	
進捗状況説明	<ul style="list-style-type: none"> <li>波照間地区の建設工事については、入札不調となって繰越となったが、令和元年度に完了した。</li> <li>西表(東部)地区、西表(上原)地区の実施設計が完了し、引き続き建築工事に向けて取り組む。</li> <li>竹富、小浜地区については基本設計が完了し、引き続き実施設計に取り組む。</li> </ul>						

	推進上の留意点(推進上の問題、外部環境の変化)	改善余地の検証(効率の更なる向上の視点)
取組の検証	(複合型福祉施設建築工事 波照間) ・入札不調の原因は単価の乖離、建設需要の高まりを受け技術者の確保の問題等、様々な要因が考えられる。	(複合型福祉施設建築工事 波照間) ・単価の見直しと渡航費の予算計上等により入札不調の解消を図る。
	(複合型福祉施設実施設計委託業務 西表東部・西表上原) ・東日本大震災の影響で津波等に関する防災意識の高い町民等は計画地での災害時における対応についての説明が必要と考えられる。	(複合型福祉施設実施設計委託業務 西表東部・西表上原) ・東部、上原共、隣接の学校と連携を図りながら防災訓練の実施計画をたてる。
	(複合型福祉施設実施設計委託業務 竹富・小浜) ・竹富、小浜の施設においては高齢者福祉の機能の方向性を定める。	(複合型福祉施設実施設計委託業務 竹富・小浜) ・地域ごとの要望を集約し、実施設計に反映させる。

**今後の取り組み方針**

- (複合型福祉施設建築工事 波照間)  
・施設の活用に向け、関係課と協議し効率的な運用を図る。
- (複合型福祉施設実施設計委託業務 西表東部・西表上原)  
・地域住民、公民館、教育委員会、防災危機管理課と連携し防災訓練の計画、実施に取り組む。上原の施設においては2階屋上に緊急の避難広場を設ける。
- (複合型福祉施設基本設計委託業務 竹富・小浜)  
・実施設計に向け、保育所、老人クラブ、介護事業所等との調整を実施し、設計完了に取り組む。

**資金の流れ**  
(資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する)(単位:千円)

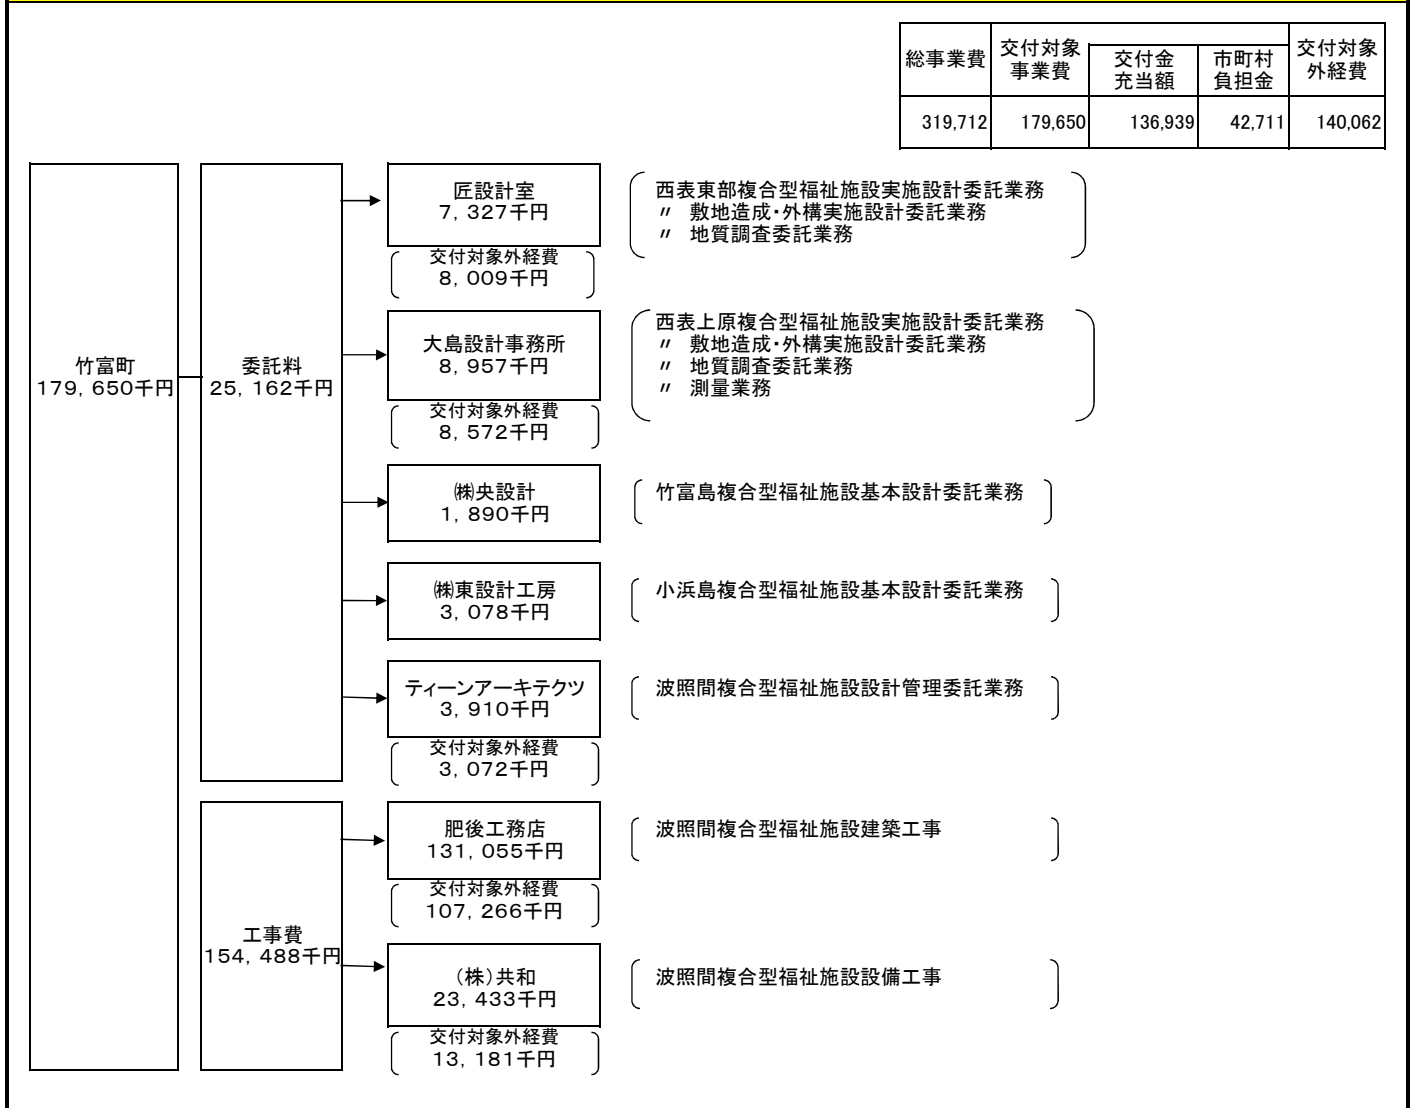

資金の流 れ、費 目・ 点 検 評 価	評価	点検項目	評価に関する説明
	○	支出先の選定方法は妥当か。	○委託事業者は指名競争入札で選定しており妥当であった。 ○不用は5%以内であり、事業規模は適正と考えている。 ○精算段階で検査を実施しており、費目・使途は事業目的に即し必要なものであった。
	○	予算規模は事業内容に合った適正な規模となっているか。	
	—	受益者との負担関係は妥当であるか。	
	○	費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。	
