

| 市町村名 | | 石垣市 | | | | | |
|--|--|---|------------|---------|--------------------|----------------------------------|-----------|
| 令和4年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【公表用】 | | | | | | | |
| 事業番号・事業名 | 2-① | 石垣市中央運動公園リニューアル事業 | | | 沖縄21世紀ビジョン基本計画該当箇所 | 第4章-3-(9)-イ | |
| 担当部署名 | 建設部 都市建設課、建設部 施設管理課 | 事業実施(予定)年度 | 平成27～令和6年度 | | 沖縄振興基本方針該当箇所 | 県民等が主体的に参画するスポーツ環境の整備 Ⅲ-1-(1) | |
| 事業内容 | スポーツを通じた観光誘客を含め、中央運動公園の利活用促進を図るため、中央運動公園の再整備を行う。 | | | | | | |
| 効果発現年度 | <input type="checkbox"/> 当年度 <input checked="" type="checkbox"/> 後年度(R6年度) | | | | | | |
| 実施方法 | <input type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 補助 <input type="checkbox"/> 負担 <input type="checkbox"/> その他() | | | | | | |
| 予算額・執行額 【単位:千円】 (「交付金」+「市町村負担」ベース) | | | R1年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R4年度(繰越) |
| | 予算の状況 | (a) 当初予算額 | | 14,000 | | 54,000 | - |
| | | (b) 予算現額 | | 10,000 | | 102,186 | - |
| | | (c) 増減額(b-a) | | ▲ 4,000 | | 48,186 | - |
| | | (d) 繰越額 | | - | | - | 60,623 |
| | A. 計(b+d) | | | 10,000 | | 102,186 | 60,623 |
| | B. 執行済額 | | | 8,800 | | 41,563 | 55,559 |
| | うち交付金充当額 | | | 7,040 | | 33,250 | 44,447 |
| | 次年度繰越額 | | | 0 | | 60,623 | 0 |
| | 執行率(%) (B/A) | | | 88.0% | | 40.7% | 91.6% |
| 予算の状況の説明 | | 補正については、事業内容の変更にもなう増である。概ね事業計画どおりに執行した。 | | | | | |
| 活動目標(指標)及び達成状況 | R4活動目標(指標) | | 達成状況 | | | | |
| | | | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | |
| | 再整備基本計画の策定完了 | 目標 | (完了) | () | () | () | |
| | | 実績 | 完了 | | | | |
| | 陸上競技場再整備基本設計の実施 | 目標 | () | () | (実施) | () | |
| | | 実績 | | | 実施 | | |
| スポーツ施設の整備 | 目標 | () | () | (完了) | () | | |
| | 実績 | | | 完了 | | | |
| 達成状況説明 | (都市建設課) ・石垣市中央運動公園陸上競技場の再整備基本計画を策定した。 (施設管理課) ・令和4年度(繰越)、令和5年度8月、備品購入完了。 | | | | | | |
| 成果目標(指標)及び進捗状況 | R4成果目標(指標) | | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | 目標値 |
| | 再整備基本計画の策定完了 | 目標 | (完了) | () | () | () | () |
| | | 実績 | 完了 | | | | |
| | 陸上競技場再整備基本設計の完了 | 目標 | () | () | (完了) | () | () |
| | | 実績 | | | 完了 | | |
| | スポーツ施設の整備 | 目標 | () | () | (完了) | () | () |
| | | 実績 | | | 完了 | | |
| | 【R6成果目標】 リニューアル整備後の施設を活用したスポーツ大会等の参加者数13,000人以上/年間 | 目標 | () | () | () | () | (13,000人) |
| 【R5成果目標】 スポーツ合宿件数22件/年間 | 目標 | () | () | () | () | (22件) | |
| | 実績 | | | | | 19件 | |


| | | | | | | |
|---|---|-----|-----|-----|-----|--------|
| 【R14成果目標】 再整備後の施設を活用した団体等が主催するスポーツ大会等の開催数6回以上/年間 | 目標 | () | () | () | () | (6回) |
| | 実績 | | | | | |
| 進捗状況説明 | (都市建設課) ・石垣市中央運動公園陸上競技場再整備基本計画の中で、施設の機能、規模、配置計画等を設定し、再整備の方針を明確にした。 (施設管理課) ・令和5年8月に備品購入完了し利用を開始している。 | | | | | |

| | 推進上の留意点(推進上の問題、外部環境の変化) | 改善余地の検証(効率の更なる向上の視点) |
|-------|---|---|
| 取組の検証 | (都市建設課) ・陸上競技場を使用するスポーツ関係団体等と意見交換会を開催し、陸上競技場の機能・規模・配置計画を決定した。 ・今後の設計業務においては、本計画をもとに関係者と意見交換しながら詳細を決めていく必要がある。 (施設管理課) ・各スポーツ競技にかかる備品等の整備が完了し、施設機能強化を図ることができた。 | (都市建設課) ・意見交換会の開催日程の調整が難航し、業務完了が年度末直前となった。今後は早期着手、余裕を持った工程管理が必要である。 (施設管理課) ・施設の備品機能強化の周知を図り、スポーツ合宿件数の増に繋げる。 |

| 今後の取り組み方針 | |
|-----------|---|
| (都市建設課) | ・今後は基本設計及び実施設計を行い、公園施設の更新を推進していく。 |
| (施設管理課) | ・石垣市のホームページや、公式LINE等で施設情報の発信を強化し、スポーツ合宿、大会開催数を増やすことで、利用者の増加に取り組む。 |

資金の流れ
(資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する)(単位:千円)

| 総事業費 | 交付対象事業費 | 交付金充当額 | 市町村負担金 | 交付対象外経費 |
|--------|---------|--------|--------|---------|
| 97,123 | 97,123 | 77,698 | 19,425 | 0 |

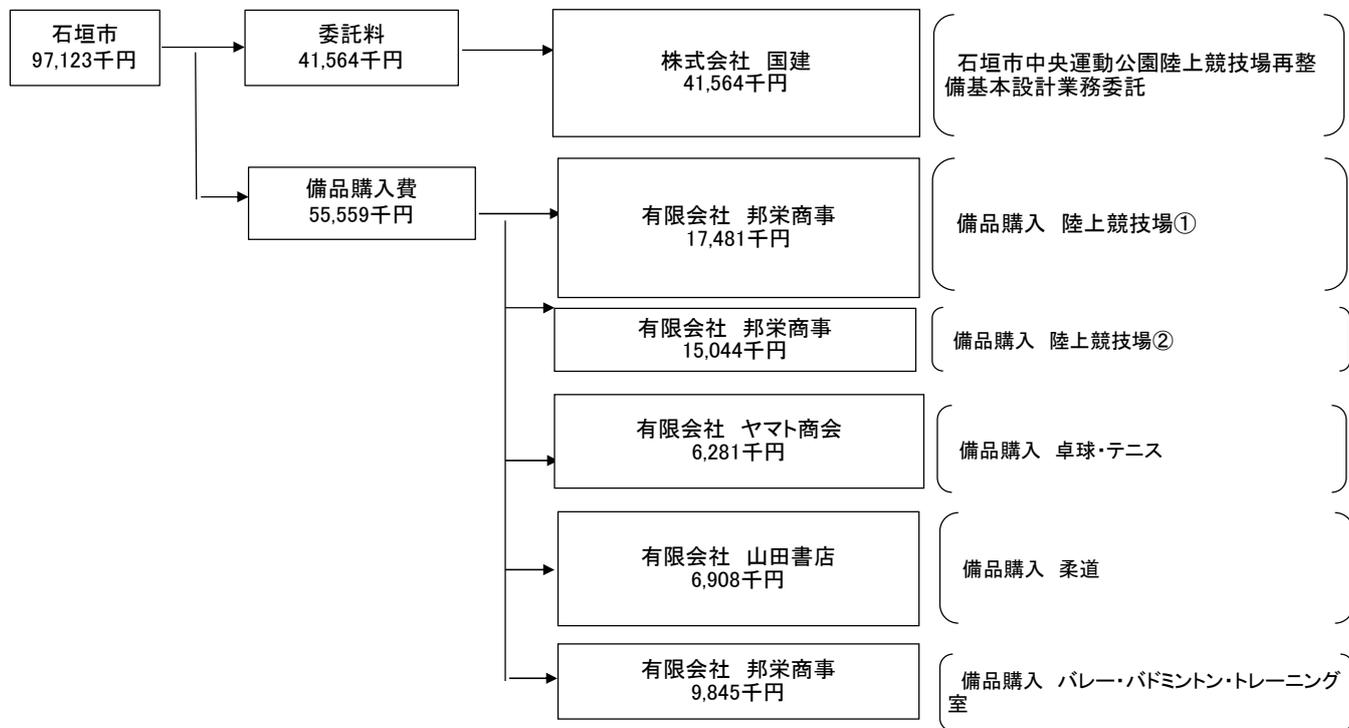

| 資金の流れ、評価 | 評価 | 点検項目 | 評価に関する説明 |
|----------|----|--------------------------------|--|
| | ○ | 支出先の選定方法は妥当か。 | ○委託事業者は指名競争入札で選定しており、妥当である。 ○予算規模は必要最小限での構造・規格となっており、妥当と考えている。 ○費目、使途については精算段階で検査を実施しており、目的に即し、必要なものであったと判断した。 |
| | ○ | 予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。 | |
| | - | 受益者との負担関係は妥当であるか。 | |
| | ○ | 費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。 | |
