

平成23年度

事業概要



本部町 ハーソー公園 農業体験



沖縄県農林水産部
北部農林水産振興センター農業水産整備課

〒905-0015 沖縄県名護市大南1丁目13番地11号
TEL (0980) 52-3766 (代表) FAX (0980) 53-6835



平成23年度事業概要
沖縄県農林水産部
北部農林水産振興センター
農業水産整備課

〒905-0015
沖縄県名護市大南1丁目13番地11号
TEL (0980) 52-3766 (代表)
FAX (0980) 53-6835



概要

目次／地域の概要／組織機構図

目次／地域の概要／組織機構図

目次

《概要》		■人材育成と施設保全活動の支援	13
■地域の概要	1	《市町村の紹介》	
■組織機構図	1	■市町村の紹介	15
■耕地面積と農家数	2	《事業地区位置図》	
■主要作物の生産状況	2	■北部管内全体	19
■平成23年度事業別総括表	3	■国頭村	21
■農業農村整備事業 市町村別整備実績	3	■大宜味村・東村	23
■平成23年度事業費構成比率	3	■今帰仁村・名護市	25
《事業地区一覧表》		■伊江村・本部町	27
■農業農村整備事業	4	■恩納村	29
■海岸漁港漁場整備事業	10	■金武町・宜野座村	31
■用語解説	12	■伊平屋村・伊是名村	33

○表紙の写真：田園空間整備事業 本部半島地区（H21完成）

地域の概要

本地域は、沖縄本島北部地域は名護市及び国頭村・大宜味村・東村・今帰仁村・本部町・恩納村・宜野座村・金武町と離島の伊江村・伊平屋村、伊是名村の1市2町9村からなる。


面積は本県総面積の36%にあたる824.6km²であり、山地が多く、一般に耕地は小規模な団地で海岸沿いに分布している。耕地面積は7,610haで耕地率が約9.2%で県全体の耕地面積に占める割合は19.4%となっている。

本地域の気候は年平均気温22.9℃、年平均降水量2,086mmである。土壌は、大部分が国頭マージで、土性は鮮やかな赤色を呈した酸性土壌で降雨により浸食を受けやすい。また、本部半島、伊江村及び恩納村の一部で島尻マージ、低平地において沖積土壌が分布する。

農業は、畑作ではサトウキビ、野菜、花き、パインアップルが主要作物となっているが、近年は果樹栽培が増えている。また、水稻は伊平屋村、伊是名村及び本島の一部で作付けされている。営農形態は土地利用型から集約栽培型へと移行しつつある。

水産業については水産資源の開発利用を目的として、周辺海域には魚礁が設置され、沿岸魚類などの養殖場が造成されている。水産業の基本施設となる漁港については、29港が漁港指定を受けている。

組織機構図

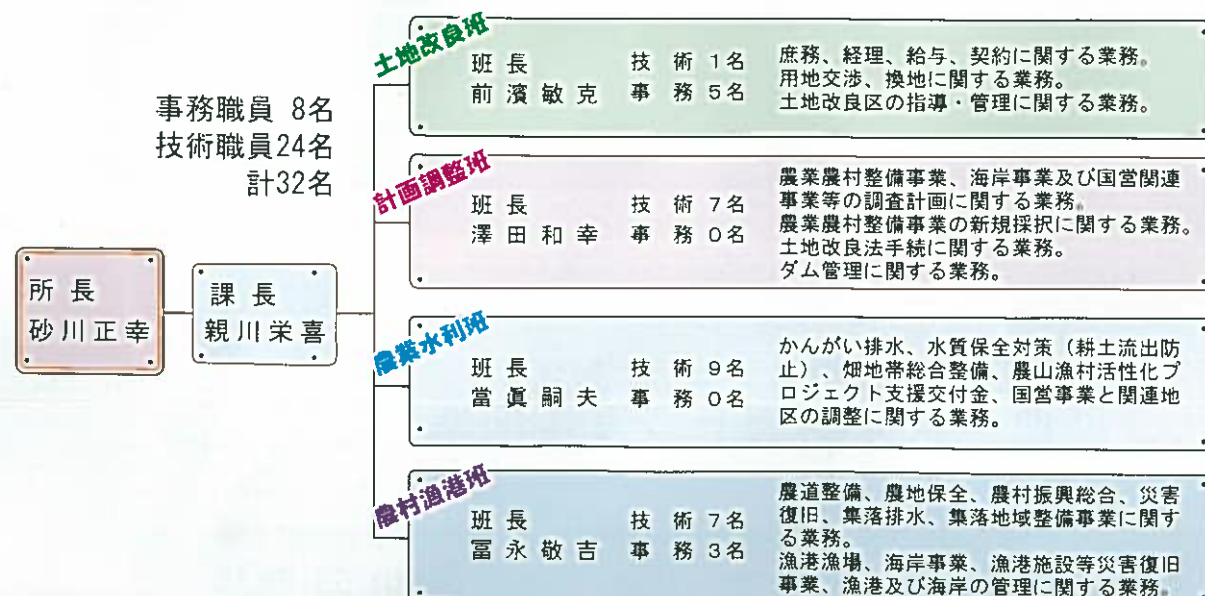

耕地面積と農家数／主要作物の生産状況

概要

農業の概要

■耕地面積と農家数

市町村名	総面積 (ha)	耕地面積 (ha)	耕地率 (%)	耕地の内訳 (ha)		総人口 (人)	世帯数 (戸)	専業別農家数		
				水	畑			計	専業	兼業
国頭村	19,482	716	3.7	6	710	5,294	2,416	261	143	118
大宜味村	6,344	305	4.8	13	292	3,398	1,661	167	84	83
東村	8,179	458	5.6	—	458	1,946	909	182	104	78
今帰仁村	3,989	830	20.8	—	830	9,518	3,895	526	268	258
本部町	5,433	647	11.9	3	644	13,749	5,928	274	128	146
名護市	21,037	1,530	7.3	30	1,500	60,160	25,631	749	475	274
恩納村	5,087	358	7.0	10	348	10,435	4,407	300	131	169
宜野座村	3,132	484	15.5	0	484	5,647	2,107	245	99	146
金武町	3,779	306	8.1	70	236	11,215	4,919	260	143	117
伊江村	2,277	1,090	47.9	—	1,090	4,840	2,211	379	268	111
伊平屋村	2,172	347	16.0	124	223	1,317	552	106	38	68
伊是名村	1,544	543	35.2	55	488	1,591	769	195	74	121
北部地域	82,455	7,610	9.2	311	7,300	129,110	55,405	3,644	1,955	1,689
沖縄県	227,615	39,200	17.2	878	38,300	1,413,583	568,860	15,123	7,594	7,529

※総面積は、平成22年10月1日時点の国土地理院調査による。 ※総人口及び世帯数は、平成23年3月31日現在の住民基本台帳による。
※耕地面積は、平成22年農林水産省耕地面積調査による。 ※専業別農家数は、2010年農林業サンセスによる。

■主要作物の生産状況

市町村名	サトウキビ (平成22/23年産)			パインアップル (平成19年産)		水稲 (平成22年産)		花き類 (平成19年産)		野菜類 (平成18年産)		
	収穫面積 (ha)	反収 (kg/10a)	収穫量 (t)	収穫面積 (ha)	収穫量 (t)	作付面積 (ha)	収穫量 (t)	作付面積 (ha)	出荷量 (千本)	作付面積 (ha)	収穫量 (t)	出荷量 (t)
国頭村	141	3,510	4,941	62	1,480	X	X	19	5,320	34	675	557
大宜味村	21	2,362	495	5	120	2	5	10	3,789	19	351	265
東村	36	2,092	751	160	3,650	—	—	12	2,110	13	259	215
今帰仁村	180	4,622	8,334	20	470	—	—	95	35,426	204	6,030	5,160
本部町	102	4,390	4,468	3	50	—	—	46	14,783	71	1,510	1,320
名護市	474	3,813	18,083	73	1,930	42	133	86	25,008	125	2,190	1,860
恩納村	129	3,948	5,081	2	30	16	40	89	27,313	24	401	315
宜野座村	147	3,768	5,532	12	300	—	—	15	5,448	56	1,300	1,090
金武町	40	3,791	1,524	3	60	64	181	33	16,720	36	582	464
伊江村	90	6,276	5,656	—	—	—	—	81	32,799	45	1,340	1,210
伊平屋村	93	4,730	4,412	—	—	120	411	1	7	2	33	17
伊是名村	380	3,977	15,093	—	—	75	273	X	X	8	173	129
北部地域	1,833	4,057	74,370	340	8,090	319	1,043	485	168,723	638	14,800	12,600
沖縄県	12,761	6,429	820,403	438	10,400	909	2,671	982	342,422	2,560	54,900	44,500

※沖縄県農林水産部、農林水産省調査による。
※統計数値の中には、四捨五入の関係で、計と内訳が一致しない場合がある。
※統計表中に使った符号は次のとおり。
※「—」調査は行ったが事実のないもの、「X」…秘密保護上統計数値を公表しないもの。



パイン畑



キク畑



水田



お茶畑

概 要		平成23年度事業別総括表/市町村別整備実績					
平成23年度 事業費							
平成23年度事業別総括表							
区分	事業名	地区数	23年度事業費	事業名	地区数	23年度事業費	
農業農村整備事業	県営かんがい排水事業	6	947,000	農山漁村活性化プロジェクト支援交付金(基盤整備)	10	650,741	
	県営水質保全対策事業(排土流出防止型)	9	772,700	農山漁村活性化プロジェクト支援交付金(農山漁村体験施設)	1	1,400	
	県営畑地帯総合整備事業(担い手支援型)	1	50,000	団体営不発弾等事前探査事業	2	21,000	
	県営経営体育成基盤整備事業	1	94,900	団体営農地保全整備事業	8	221,720	
	県営不発弾等事前探査事業	1	1,000	団体営ため池等整備事業	1	20,000	
	県営一般農道整備事業	1	14,000	村づくり交付金事業(村づくり交付金)	6	527,165	
	県営農地保全整備事業	3	132,544	集落地域整備事業(村づくり交付金)	2	86,500	
	県営ため池等整備事業	7	259,751	農業集落排水事業(村づくり交付金)	3	428,001	
	海岸保全施設整備事業	3	145,557	農業集落排水事業(農業集落排水資源循環統合補助事業)	4	442,935	
	県単・かんがい排水調査計画費	1	3,000				
	県単・農地防災調査費	1	2,000				
	(ハード事業)小計	34	2,422,452	(ハード事業)小計	37	2,399,462	
	国営造成施設管理体制整備促進事業(県)	2	1,000	国営造成施設管理体制整備促進事業	2	27,200	
	県単・県営ダム管理費	1	20,325	基幹水利施設管理事業	1	53,100	
	中山間地域等直接支払推進交付金(県)	3	300	中山間地域等直接支払推進交付金	3	600	
				中山間地域等直接支払交付金	3	24,205	
				耕作放棄地再生利用緊急対策交付金	10	61,891	
				農地・水・農村環境保全向上活動支援事業	12	1,550	
				農地・水・保全管理支払交付金事業	7	47,756	
				ふるさと農村活性化基金事業	3	840	
	(ソフト事業)小計	6	21,625	(ソフト事業)小計	33	217,942	
	計	40	2,444,077	計	70	2,617,404	
漁業漁港整備事業	広域漁場整備事業	1	150,000	漁港地域水産物供給基盤整備事業	1	250,000	
	水産物供給基盤機能保全事業	4	95,500	漁村再生交付金	2	88,000	
	県単・県営漁港管理費	1	7,509	海岸保全施設整備事業(高潮)	1	187,600	
	漁港計	6	253,009	漁港計	4	525,600	
計	県 営	46	2,697,086	団 体 営	74	3,143,004	
				農業水産整備課合計		120	5,840,090

農業農村整備事業 市町村別整備実績(平成22年度までの実績見込)

区域	市町村名	水源整備 (ha)			かんがい施設整備 (ha)			ほ場整備 (ha)		
		整備済	要整備量	整備率(%)	整備済	要整備量	整備率(%)	整備済	要整備量	整備率(%)
北 部	国頭村	169.0	781.0	21.6	159.5	781.0	20.4	340.0	640.0	53.1
	大宜味村	47.8	332.0	14.4	61.2	332.0	18.4	115.0	291.0	39.5
	東 村	0.0	551.0	0.0	21.0	551.0	3.8	227.0	504.0	45.0
	今帰仁村	197.2	939.0	21.0	177.6	939.0	18.9	221.5	844.0	26.2
	本部町	89.0	716.0	12.4	16.8	716.0	2.3	89.0	693.0	12.8
	名護市	1,260.0	1,638.0	76.9	807.2	1,638.0	49.3	701.8	1,612.0	43.5
	恩納村	165.4	401.0	41.2	140.7	401.0	35.1	312.1	394.0	79.2
	宜野座村	276.8	469.0	59.0	467.9	469.0	99.8	362.0	430.0	84.2
	金武町	218.6	325.0	67.3	222.2	325.0	68.4	288.0	317.0	90.9
	伊江村	387.1	1,076.0	36.0	459.9	1,076.0	42.7	144.0	708.0	20.3
南 部	伊是名村	547.2	543.0	100.8	405.3	543.0	74.6	519.1	515.0	100.8
	伊平屋村	118.4	372.0	31.8	68.8	372.0	18.5	249.5	358.0	69.7
北 部 計		3,476.5	8,143.0	42.7	3,008.1	8,143.0	36.9	3,569.0	7,306.0	48.9
県 計		22,787.2	40,600.0	56.1	16,751.4	40,600.0	41.3	18,760.8	35,000.0	53.6

平成23年度事業費構成比率



農業農村整備事業

事業地区一覧表

平成23年度

●県営 □団体営

かんがい排水事業

農業用水を確保し活用するとともに、排水不良地を解消する

番号	地区名	市町村名	事業主体	全 体		平成22年度まで		平成23年度		工 期	進捗率 22年度迄
				事業量	事業費	事業量	事業費	事業量	事業費		
①	羽 地	名護市	県	管水路 畑地かんがい、 L=22,020m A=176.3ha	1,132,000	管水路 畑地かんがい、 L=21,195m A=156ha	1,062,000	管水路 畑地かんがい、 L=825.0m A=20.3ha	70,000	H16~H23	93.8
②	伊是名東部	伊是名村	県	管水路 畑地かんがい、 L=34,370m A=216.2ha	1,445,000	管水路 畑地かんがい、 L=29,976m A=193.5ha	1,218,000	管水路 畑地かんがい、 L=4,394m A=22.7ha	227,000	H17~H23	84.3
③	東 江 上	伊江村	県	畑地かんがい、 A=97.2ha 中継水槽 1基 加圧施設 2基	1,026,000	畑地かんがい、 A=91.5ha	587,000	畑地かんがい、 A=5.7ha 加圧施設 2基	210,000	H18~H24	58.7
④	伊平屋北部1期	伊平屋村	県	貯水池 頭首工 管水路 2ヶ所 2基 L=3,887m	4,464,000	貯水池 頭首工 管水路 1ヶ所 2基 L=145.1m	2,373,000	貯水池 管水路 2ヶ所 L=3,742m	90,000	H15~H24	53.2
⑤	ア マ ギ	伊江村	県	畑地かんがい、 A=52.8ha 中継水槽 揚水・加圧施設 1基 4基	698,000	畑地かんがい、 A=52.8ha 中継水槽 1基	556,100	揚水・加圧施設 4基	160,000	H20~H23	79.7
⑥	伊平屋北部2期	伊平屋村	県	管水路 揚水機場 畑地かんがい、 L=6,721m 2基 A=201ha	1,900,000	測量設計 一式	70,000	管水路 揚水機場 L=5,790m 1基	190,000	H22~H27	3.7
計			6		10,665,000		5,866,100		947,000		

※国営関連(東江上、アマギ)



伊平屋北部1期地区



屋嘉地区

(国営かんがい排水事業)

伊江地区の概要

本地区は、沖縄本島北西の伊江島に位置しており、さとうきび・葉たばこを基幹作物とし、近年では、野菜・花卉等が導入され、農業振興が図られている地域である。農業用水は地区の一部でため池を利用しているものの、降雨依存型で不安定であることから干ばつ被害が恒常的に発生し、農業振興の妨げになっている。

本事業で地下ダムを新設し、既設のため池と併せた用水利用を図り、安定的な畑地かんがいの用水供給を行い、農業経営の安定と農業所得の向上を図る。



事業概要

事業工期	水田	普通畑	樹園地	牧草地	計	備 考
H16~H25	—	668	—	—	668	

凡 例	
受益地	用水路(国営)
ため池(既設)	用水路(開運)
地下ダム	送水路(既設利用)
地下ダム付帯施設	揚水機場
	ファームボンド



事業地区一覧表

平成23年度

農業農村整備事業

●県営 □団体営

■水質保全対策事業（耕土流出防止型）

農地から耕土流出を防ぐ

(単位：千円、%)

番号	地区名	市町村名	事業主体	全 体		平成22年度まで		平成23年度		工 期	進捗率 22年度迄
				事業量	事業費	事業量	事業費	事業量	事業費		
7	本部町第1	本部町	県	排水路工 沈砂池工 植生工 勾配修正工 法面工	L=2,723m 5基 L=2,688m A=7.3ha A=2,805㎡	521,000	排水路工 沈砂池工 植生工 勾配修正工 法面工	L=2,379m 4基 L=2,187m A=5.6ha A=1,805㎡	400,500	H18~H23	76.9
8	宜野座村第2	宜野座村	県	勾配修正工 沈砂池工 畦畔工 排水路工	A=14.7ha 7基 L=4,500m L=6,600m	699,000	勾配修正工 沈砂池工 畦畔工 排水路工	A=8.7ha 5基 L=3,508m L=5,625m	645,816	H17~H23	92.4
9	金武町第2	金武町	県	勾配修正工 沈砂池工 植生工 畦畔工 排水路工 法面保護工	A=8.5ha 8基 L=2,493m L=177m L=1,364m A=2,330㎡	530,000	勾配修正工 沈砂池工 植生工 畦畔工 排水路工 法面保護工	A=8.5ha 6基 L=2,493m L=177m L=3,864m A=2,330㎡	469,030	H17~H23	88.5
10	伊是名村第1	伊是名村	県	沈砂池工 植生工 畦畔工 排水路工 法面保護工	5基 L=18,324m L=20,017m L=6,005m A=286㎡	549,000	植生工 排水路工 法面保護工	L=2,493m L=3,186m A=370㎡	193,018	H19~H24	35.2
11	宜野座村第3	宜野座村	県	勾配修正工 沈砂池工 排水路工 植生工 畦畔工 暗渠工	A=13.8ha 8基 L=6,685m L=4,150m L=875m L=2,400m	607,000	勾配修正工 沈砂池工 排水路工 植生工 暗渠工	A=4.3ha 5基 L=3,092m L=2,048m L=1,599m	298,210	H19~H24	49.1
12	宜野座村第4	宜野座村	県	勾配修正工 沈砂池工 排水路工 畦畔工 暗渠排水工 土層改良工 沈砂池工(修繕・変更)	A=7.9ha 4基 L=3,594m L=2,610m L=4,265m A=2.7ha 4基	481,000	勾配修正工 沈砂池工 排水路工 畦畔工 暗渠排水工 沈砂池工(修繕・変更)	A=2.0ha 4基 L=744m L=2,332m 2基	138,500	H20~H25	28.8
13	恩納村第2	恩納村	県	勾配修正工 畦畔工 植生工 排水路工 法面保護工 沈砂池工 沈砂池工(修繕・変更)	A=17.9ha L=3,890m L=2,676m L=8,270m A=4,060㎡ 6基 12基	790,000	勾配修正工 排水路工 植生工 排水路工 沈砂池工	A=5.8ha L=1,730m L=2,392m 2基	227,300	H20~H26	28.8
14	東村第2	東村	県	勾配修正工 畦畔工 植生工 土層改良 法面保護 排水路工 沈砂池工	A=2.2ha L=5,340m L=930m A=6.6ha A=3,980㎡ L=3,550m 2基	430,000	測量設計 一式		30,000	H22~H28	7.0
15	天仁屋名護市	名護市	県	勾配修正工 畦畔工 暗渠排水工 排水路工 法面保護工 グリーンベルト工 沈砂池工 土層改良 路面保護工	A=22.3ha L=9,940m L=800m L=9,650m A=440㎡ A=100㎡ 12基 A=38.5ha L=1,500m	833,000	勾配修正工 排水路工 沈砂池工	A=0.8ha L=224m 2基	82,152	H21~H27	9.9
計			9		5,440,000		2,484,526		772,700		



宜野座村第2地区



宜野座村第3地区



本部町第1地区

農業農村整備事業

事業地区一覧表

平成23年度

●県営 □団体営

■畑地帯総合整備事業（担い手支援型）

農業生産基盤や集落環境整備を総合的に行う

(単位：千円、%)

番号	地区名	市町村名	事業主体	全 体		平成22年度まで		平成23年度		工 期	進捗率 22年度迄
				事業量	事業費	事業量	事業費	事業量	事業費		
16	小浜	金武町	県	貯水池 ファームバンド 2基 2ヶ所 頭首工 畑かん 農道 L=175m	1,189,000	貯水池 2基	461,000	貯水池 一式 頭首工 一式	50,000	H19~H27	36.8
計			1		1,189,000		461,000		50,000		

■一般農道整備事業

受益地内の農道を整備する

(単位：千円、%)

番号	地区名	市町村名	事業主体	全 体		平成22年度まで		平成23年度		工 期	進捗率 22年度迄
				事業量	事業費	事業量	事業費	事業量	事業費		
17	島の上3期	大宜味村	県	農道 L=540m	1,223,000	農道 L=219m	1,113,000	測量設計 一式	14,000	H15~H24	91.0
計			1		1,223,000		1,113,000		14,000		

■農地保全整備事業

農地の侵食防止、防風対策等を行う

(単位：千円、%)

番号	地区名	市町村名	事業主体	全 体		平成22年度まで		平成23年度		工 期	進 捗 率 22年度迄		
				事業量	事業費	事業量	事業費	事業量	事業費				
18	辺 名 地	本部町	県	排水路工 集水路 排水路 開通農道工 水兼農道工 畑地かんがい 防風工	L=625m L=1,530m L=594m L=865m L=1,683m 一式 一式	595,000	排水路工 集水路 開通農道工 水兼農道工	L=270m L=970m L=665m L=300m	233,000	農道 一式	20,000	H19～H26	39.2
19	川 平 第 1	伊 江 村	県	防風施設工 排水路工 水兼農道工	L=5,119m L=2,355m L=1,420m	451,000	防風施設工 排水路工 水兼農道工	L=1,906m L=2,355m L=1,336m	254,000	防風施設工 一式	45,000	H20～H25	56.3
20	川 平 第 2	伊 江 村	県	防風施設工 排水路工 水兼農道工 農道工 浸透池工	L=5,916m L=2,201m L=2,198m L=2,504m 5基	640,000	測量設計 一式		44,000	水兼農道工 浸透池工 一式	67,544	H22～H26	6.9
21	西 崎 第 1	伊 江 村	村	防風施設工 排水路工	L=1,810m L=945m	321,000	防風施設工 排水路工	L=1,463m L=844m	275,000	防風施設工 L=50m	10,607	H20～H24	85.7
22	松 田 東	宜野座村	村	防風施設工	L=3,815m	309,000	防風施設工	L=1,747m	201,000	防風施設工 L=190m	10,000	H19～H26	85.0
23	西 崎 西	伊 江 村	村	防風施設工	L=5,726m	442,000	防風施設工	L=5,303m	416,000	防風施設工 L=423m	26,000	H22～H23	94.1
24	西 崎 第 2	伊 江 村	村	防風施設工 排水施設工 水兼農道工	L=3,120m L=1,625m L=1,750m	576,000	防風施設工	L=800m	165,000	防風施設工 L=253m 排水施設工 L=253m	57,113	H21～H25	28.6
25	コ ー チ 原	伊平屋村	村	石礫除去 防風施設工	A=11.1ha L=1,105m	182,000	石礫除去 防風施設工	A=3.6ha L=235m	86,000	石礫除去 A=3.6ha	24,000	H21～H25	47.3
26	松 田 西 1 期	宜野座村	村	防風設置工	L=2,575m	158,000	測量設計 一式		30,000	防風施設工 L=660m	30,000	H22～H26	19.0
27	フ ナ ズ	伊 江 村	村	防風設置工	一式	630,000	—	—	—	測量設計 一式	40,000	H23～H27	0.0
28	前 泊	伊平屋村	村	防風施設工 石礫除去工	L=1,280m A=23ha	366,000	—	—	—	測量設計 一式	24,000	H23～H27	0.0
	計		11			4,670,000		1,704,000		354,261			



川平第1地区



松田東地区



施工前



施工後

事業地区一覧表

平成23年度

農業農村整備事業

●県営 ●団体営

■ため池等整備事業

農地及び農業施設を災害から未然に防ぐ

【ため池等整備事業(ため池)】

番号	地区名	市町村名	事業主体	全 体		平成22年度まで		平成23年度		工 期	進捗率 22年度迄
				事業量	事業費	事業量	事業費	事業量	事業費		
37	瀬	高名護市	県	堤体工 一式 洪水吐工 一式 底樋工 一式 斜樋工 一式 管理道路 L=298m	584,000	堤体工 一式 洪水吐工 一式 底樋工 一式	474,848	堤体工 一式	80,000	H18~H24	81.3
38	瀬	川名護市	県	堤体工 一式 底樋工・取水工 一式 洪水吐工 一式 管理道路 L=350m	421,000	堤体工 一式 底樋工・取水工 一式 洪水吐工 一式	267,000	測量設計 一式	8,000	H19~H25	63.4
39	門	原伊平屋村	県	底樋工 一式 斜樋工 一式 管理道路工 一式 ため池敷設工事 一式	150,000	底樋工 一式 斜樋工 一式 管理道路工 一式	124,000	底樋工 一式	26,000	H20~H23	82.7
40	イリシナ	伊平屋村	県	洪水吐工 一式 底樋工 一式 斜樋工 一式 管理施設工 一式 法面保護工 一式 水路工 一式 護岸工 一式	402,000	洪水吐工 一式 管理施設工 一式	80,000	洪水吐工 一式 斜樋工 一式	76,862	H21~H25	19.9
41	前	原伊平屋村	県	堤体工 一式 洪水吐工 一式 底樋工 一式 斜樋工 一式 管理道路工 一式 水路工 一式	273,000	測量設計 一式	17,000	測量設計 一式	15,000	H22~H25	6.2
42	谷	川伊平屋村	県	堤体工 一式 洪水吐工 一式 底樋工 一式 斜樋工 一式 水路工 一式 崩壊対策 一式	430,000	—	—	測量設計 一式	30,000	H23~H26	0.0
計			6		2,260,000		962,848		235,862		

【ため池等整備事業(用排水施設)】

番号	地区名	市町村名	事業主体	全 体		平成22年度まで		平成23年度		工 期	進捗率 22年度迄
				事業量	事業費	事業量	事業費	事業量	事業費		
43	カピチ	伊是名村	県	法面保護工 A=650㎡ 補強土工 L=500m 排水路工 L=500m 舗装工 A=2,760㎡ 防護柵工 L=584m	124,000	法面保護工 一式 補強土工 一式 排水路工 一式 舗装工 一式 防護柵工 一式	100,000	法面保護工 一式	23,889	H20~H23	80.6
36	比地第1	国頭村	村	法面保護 一式	113,000	法面保護 一式	55,000	法面保護 一式	20,000	H22~H24	48.7
計			2		237,000		155,000		43,889		



イリシナ地区



門原地区



■不発弾等事前探査事業

番号	地区名	市町村名	事業主体	全 体		平成22年度まで		平成23年度		工 期	進捗率 22年度迄
				事業量	事業費	事業量	事業費	事業量	事業費		
47	辺名地	本部町	県	磁気探査 一式	1,000	—	—	磁気探査 一式	1,000	H23	0.0
計			1		1,000		—		1,000		

農業農村整備事業

事業地区一覧表

平成23年度

●県営 ●団体営

■経営体育成基盤整備事業

農地の区画整理等を行い効率的かつ安定的な経営体の育成と農用地の利用集積を促進する

(単位:千円、%)

番号	地区名	市町村名	事業主体	全 体		平成22年度まで		平成23年度		工 期	進捗率 22年度迄
				事業量	事業費	事業量	事業費	事業量	事業費		
38	我喜屋	伊平屋村	県	整地工 A=25.4ha 用水路工 L=6,530m 暗渠排水工 A=14.9ha	497,000	整地工 A=1.5ha 用水路工 L=1,085m 暗渠排水工 A=1.4ha	79,867	整地工 A=4.5ha 用水路工 L=2,000m 暗渠排水工 A=4.5ha	94,900	H21~H26	16.1
計			1		497,000		79,867		94,900		

■農山漁村活性化プロジェクト支援交付金

小規模な受益地に対してかんがい施設等の整備を行う

【農山漁村活性化プロジェクト支援交付金(基盤整備)】

(単位:千円、%)

番号	地区名	市町村名	事業主体	全 体		平成22年度まで		平成23年度		工 期	進捗率 22年度迄
				事業量	事業費	事業量	事業費	事業量	事業費		
39	渡喜仁第2	今帰仁村	区	畑地かんがい A=22.4ha 被害防止施設 A=4.2ha	378,000	畑地かんがい A=21.5ha 被害防止施設 A=2.1ha	255,958	被害防止施設 A=2.1ha	119,042	H19~H23	67.7
40	タチハ	伊是名村	村	畑地かんがい A=27.8ha	240,000	畑地かんがい A=20.8ha	197,000	畑地かんがい A=7.0ha	43,000	H19~H23	82.1
41	仲尾次1期	今帰仁村	区	畑地かんがい A=18.3ha 創意工夫 A=1.6ha	344,000	畑地かんがい A=1.5ha	50,000	畑地かんがい 一式	120,000	H20~H24	14.5
42	仲尾次2期	今帰仁村	区	農道工 L=2,854m 農業用排水路 L=1,398m	186,000	農道工 L=204m	34,000	農道工 L=230m	20,000	H21~H24	18.3
43	鳥田	伊是名村	村	畑地かんがい A=26.2ha	285,000	畑地かんがい A=12.5ha	170,719	畑地かんがい A=9.0ha	84,000	H20~H24	59.9
44	仲泊	恩納村	村	畑地かんがい A=12.4ha ファームポンド 1基 貯水池 2基 創意工夫 A=1.9ha	698,000	ファームポンド 1基	169,000	貯水池 1基	130,000	H21~H25	24.2
45	仲田	伊是名村	村	畑地かんがい A=28.9ha	220,000	畑地かんがい A=3.7ha	71,000	畑地かんがい A=5.2ha	40,000	H21~H25	32.3
46	東江前第1	伊江村	村	畑地かんがい A=41.0ha	446,000	—	0	畑地かんがい A=4.0ha	70,000	H22~H26	0.0
47	第2野国名	名護市	市	水灌漑道 L=2,550m 農道工 L=260m 排水路工 一式 防災工 一式 営農飲雑用水 一式	180,000	—	—	測量設計 一式	12,300	H23~H27	0.0
48	並里	金武町	町	畑地かんがい A=43.4ha	480,000	—	—	測量設計 一式	12,399	H23~H27	0.0
計			10		3,457,000		947,677		650,741		

【農山漁村活性化プロジェクト支援交付金(農山漁村体験施設)】

(単位:千円、%)

番号	地区名	市町村名	事業主体	全 体		平成22年度まで		平成23年度		工 期	進捗率 22年度迄
				事業量	事業費	事業量	事業費	事業量	事業費		
49	安波	国頭村	村	農山漁村体験施設 施設整備附属事業 一式	249,200	農山漁村体験施設 施設整備附属事業 一式	246,400	施設整備附属事業 一式	1,400	H20~H24	98.9
計			1		249,200		246,400		1,400		



仲泊地区



渡り地地区 (H22完了)

事業地区一覧表

平成23年度

農業農村整備事業

●県営 □団体営

■村づくり交付金事業（村づくり交付金）

農業生産基盤と生活環境の総合的な整備を行う

（単位：千円、％）

番号	地区名	市町村名	事業主体	全 体		平成22年度まで		平成23年度		工 期	進捗率 22年度迄
				事業量	事業費	事業量	事業費	事業量	事業費		
50	我部祖河名護市	市	農業防災安全施設一式 農業用排水路 L=1,028m 農道 L=3,674m 農業集落道 L=2,424m 農業集落排水路 L=2,195m	725,000	農業用排水路 L=748m 農道 L=2,916m 農業集落道 L=2,280m 農業集落排水路 L=1,295m	550,000	集落道整備 一式	35,000		H18～H24	75.9
51	今帰仁西部	今帰仁村	農業集落道 L=5,976m 農業用排水路 L=1,045m 農道 L=3,078m 営農飲雑用水 2基 集落防災安全施設 36基 自然環境・生態系 A=2.5ha 市町村創造型整備 1ヶ所	961,000	農業集落道 L=1,932m 農道 L=294m 市町村創造型整備 1ヶ所	280,000	農業集落道 L=758m 農道 L=493m	75,165		H20～H25	29.1
52	今帰仁中部	今帰仁村	農業集落道 L=2,750m 農道 L=813m 農業集落排水路 L=2,219m 防災安全施設整備 44ヶ所 市町村創造型整備 13ヶ所	495,000	農業集落道 L=500m 農業集落排水路 L=1,132m	135,000	農業集落道 L=655m	57,000		H21～H26	27.3
53	伊 江	伊江村	集落農園 1ヶ所 農用地保全 L=700m 地域資源利用活用施設 1ヶ所 堆肥施設 一式	1,695,000	地域資源利用活用施設 1ヶ所	500,000	堆肥施設 一式	290,000		H21～H26	29.5
54	今帰仁東部	今帰仁村	農道整備 L=1,020m 農業用排水整備 L=940m 集落排水整備 L=300m 集落道整備 L=2,500m 防災安全施設整備 57ヶ所 農産物提供施設 1ヶ所	516,000	測量設計 一式	10,000	集落排水整備 L=300m 集落道整備 L=250m 防災安全施設整備 8ヶ所	50,000		H22～H27	1.9
55	松 川	宜野座村	ほ場整備 A=5.0ha 農道整備 L=3,695m 集落道整備 L=660m 地域資源利用活用施設 1ヶ所 防災安全施設整備 40ヶ所 堆肥施設等 一式	544,000	測量設計 一式	30,000	地域資源利用活用施設 1ヶ所	20,000		H22～H27	4.5
56	並 里	金武町	水辺環境整備 一式 集排施設 L=1,000m 集落防災安全 一式 地域資源利用活用施設 一式	215,000	水辺環境整備 一式 集排施設 L=838m 集落防災安全 一式	60,000	集排施設 L=162m 集落防災安全 一式	16,500		H19～H24	27.9
計				5,151,000		1,565,000		543,665			

■農業集落排水事業（村づくり交付金）

集落の生活雑排水を処理する

（単位：千円、％）

番号	地区名	市町村名	事業主体	全 体		平成22年度まで		平成23年度		工 期	進捗率 22年度迄
				事業量	事業費	事業量	事業費	事業量	事業費		
57	屋 嘉	金武町	処理施設 一式 管路施設 L=16.2km ポンプ施設 8ヶ所	2,025,000	処理施設 一式 管路施設 L=16.2km	1,785,000	処理施設 一式 ポンプ施設 8ヶ所	239,622		H17～H23	88.1
58	山 田	恩納村	処理施設 一式 管路施設 L=19.8km ポンプ施設 一式	2,104,000	処理施設 一式 管路施設 L=19.0km ポンプ施設 一式	1,977,000	処理施設 一式 管路施設 L=0.8km	126,900		H17～H23	91.0
59	並里・金武	金武町	処理施設 一式 管路施設 L=25.9km ポンプ施設 8ヶ所	3,215,000	処理施設 一式 管路施設 L=23.9km	1,308,000	管路施設 L=1.0km	61,479		H19～H25	40.7
60	並里・金武2期	金武町	処理施設 一式 管路施設 L=21.9km メタン発酵施設 一式	2,551,000	測量設計 一式	70,000	測量設計 一式	70,000		H22～H27	2.7
計				9,895,000		5,140,000		498,001			



山田地区

農業農村整備事業／海岸・漁港・漁場整備事業

事業地区一覧表

平成23年度

●県営 □団体営

■農業集落排水事業（農業集落排水資源循環統合補助事業）

集落排水処理施設の機能強化を図る

（単位：千円、％）

番号	地区名	市町村名	事業主体	全 体		平成22年度まで		平成23年度		工 期	進捗率 22年度迄
				事業量	事業費	事業量	事業費	事業量	事業費		
61	恩納1期	恩納村	村	処理施設 一式 管路施設 L=12,140m ポンプ施設 一式	2,409,000	管路施設 L=1,914m	300,000	管路施設 L=1,914m	100,000	H21～H26	12.5
62	伊 平 屋	伊平屋村	村	処理施設 一式 管路施設 L=639m ポンプ施設 2基	499,000	処理施設 一式 管路施設 L=535m ポンプ施設 2基	450,000	処理施設 一式 管路施設 L=104m	36,735	H19～H23	90.2
63	恩 慶	宜野座村	村	処理施設 一式 管路施設 L=1,745m	407,000	処理施設 一式 管路施設 L=1,285m	165,000	処理施設 一式	241,200	H21～H23	40.5
64	宜 野 座	宜野座村	村	循環施設 一式	326,000	循環施設 一式	125,000	循環施設 一式	65,000	H21～H25	38.3
計			4		3,641,000		1,040,000		442,935		

■海岸保全施設整備事業（農村振興局所管）

侵食や高潮から国土の保全を図る

【海岸保全施設整備事業（高潮）】

（単位：千円、％）

番号	地区名	市町村名	事業主体	全 体		平成22年度まで		平成23年度		工 期	進捗率 22年度迄
				事業量	事業費	事業量	事業費	事業量	事業費		
55	浜	国頭村	県	人口リーフ L=440m 養浜工 付属工 一式	1,273,000	人口リーフ L=440m 養浜工 一式	1,005,913	養浜工 一式	56,000	H15～H24	79.0
56	辺 上 名	国頭村	県	突堤工 L=261m 養浜工 L=580m 離岸堤 L=60m	1,229,000	突堤工 L=261m	951,282	離岸堤 一式	56,223	H16～H26	77.4
計			2		2,502,000		1,957,195		112,223		

【海岸保全施設整備事業（侵食）】

（単位：千円、％）

番号	地区名	市町村名	事業主体	全 体		平成22年度まで		平成23年度		工 期	進捗率 22年度迄
				事業量	事業費	事業量	事業費	事業量	事業費		
57	久 志	名護市	県	護岸工 I L=282m 護岸工 II L=161m	361,000	護岸工 I L=258m	109,830	護岸 一式	33,334	H20～H24	30.4
計			1		361,000		109,830		33,334		



辺上名地区



久志地区



浜 地区

■漁港地域水産物供給基盤整備事業

水産物の生産及び流通機能を整える

（単位：千円、％）

番号	地区名	市町村名	事業主体	全 体		平成22年度まで		平成23年度		工 期	進捗率 22年度迄
				事業量	事業費	事業量	事業費	事業量	事業費		
58	漢 那	宜野座村	村	漁港整備 一式	950,000	漁港整備 一式	566,909	漁港整備 一式	250,000	H20～H24	59.7
計			1		950,000		566,909		250,000		

事業地区一覧表

平成23年度

海岸・漁港・漁場整備事業

●県営 □団体営

漁村再生交付金

農村の再生目標を立て、漁港施設整備の整備、生活環境施設の整備を行う

(単位：千円、%)

番号	地区名	市町村名	事業主体	全 体		平成22年度まで		平成23年度		工 期	進捗率 22年度迄
				事業量	事業費	事業量	事業費	事業量	事業費		
69	漁	国頭村	村	漁港整備 一式	298,000	漁港整備 一式	180,600	漁港整備 一式	50,000	H19～H23	60.6
70	漁	大宜味村	村	漁港整備 一式	266,000	—	—	漁港整備 一式	38,000	H23～H28	0.0
計			2		564,000		180,600		88,000		

広域漁場整備事業

水産資源が確保育成できる漁場を造る

(単位：千円、%)

番号	地区名	市町村名	事業主体	全 体		平成22年度まで		平成23年度		工 期	進捗率 22年度迄
				事業量	事業費	事業量	事業費	事業量	事業費		
71	宜野座	宜野座村	県	浮魚礁設置 一式	150,000	—	—	浮魚礁設置 一式	150,000	H23	0.0
計			1		150,000		0		150,000		



伊平屋西地区(H22完成)『浮魚礁(バヤオ)』



伊平屋西地区(H22完成)『浮魚礁(バヤオ)』

海岸保全施設整備事業(高潮)(水産庁所管)

高潮、津波から被害を守るための海岸保全施設の整備

(単位：千円、%)

番号	地区名	市町村名	事業主体	全 体		平成22年度まで		平成23年度		工 期	進捗率 22年度迄
				事業量	事業費	事業量	事業費	事業量	事業費		
72	屋我地	名護市	市	護岸・突堤・養浜 一式	995,000	護岸工 一式	400,024	突堤・養浜 一式	187,600	H20～H25	40.2
計			1		995,000		400,024		187,600		

水産物供給基盤機能保全事業

漁港施設の長寿命化をはかり、漁港機能を保全する

(単位：千円、%)

番号	地区名	市町村名	事業主体	全 体		平成22年度まで		平成23年度		工 期	進捗率 22年度迄
				事業量	事業費	事業量	事業費	事業量	事業費		
73	安田漁港	国頭村	県	スリマネ 一式	58,000	—	—	調査 一式	58,000	H23	0.0
74	名護漁港	名護市	県	スリマネ 一式	13,000	—	—	調査 一式	13,000	H23	0.0
75	打間漁港	名護市	県	スリマネ 一式	12,000	—	—	調査 一式	12,000	H23	0.0
76	辺上名漁港	国頭村	県	スリマネ 一式	12,500	—	—	調査 一式	12,500	H23	0.0
計			4		95,500		0		95,500		

施設管理事業 (県営)

施設管理事業

(単位：千円)

事業区分	地区名	市町村名	事業主体	平成23年度		事業の目的
				事業量	事業費	
海岸保全管理費	稲嶺海岸	名護市	県	海岸管理一式	300	農地保全に係る農村振興局所管海岸保全区域の快適で良好な海岸区域の保持を目的とする。
国営土地改良施設管理費	真喜屋ダム	名護市	県	ダム管理一式	20,325	国営かんがい排水事業利地大川地区で造成された施設で管理委託協定書に基づいて維持管理を行う。
漁港管理事業費	名護・宜名真	名護市・国頭村	県	漁港管理一式	7,509	漁港に係る水産庁所管の漁港施設の維持管理を目的とする。
計			3		28,134	

用語解説

用語集

解 説

農業農村整備事業(NN事業) 土地改良法に基づき実施する、かんがい施設、排水施設、農地の造成や水質保全対策や農地防災対策に加えて農村の生活環境等の整備事業をさす。これらの事業を土地改良、また農業土木ともよんでいる。

漁港漁場整備事業 漁業の振興を図るため、漁業の拠点となる漁港や、魚礁を設置するなどして漁場を造成する事業。

県営事業 沖縄県が主体となって実施する事業。団体営事業と比較して工事する規模が大きい。

団体営事業 市町村や土地改良区など、国と県以外の団体が主体となって実施する事業。

受益面積 事業を実施することで利益を受ける面積。かんがい排水事業であれば、農業用水を行き渡らせることができる面積。

土地改良区 事業実施地区内の組合員(農家)によって組織され、組合員の負担金などで運営している。事業の実施主体となるほか、できあがった施設の管理なども行う。水土里(みどり)ネットともいう。

かんがい ダムや用水路、かんがい施設を整備し、作物の育成に必要な水を耕地に注ぐこと。かんがい施設のタイプとして、Ⅰ型(スプリンクラー)、Ⅱ型(給水栓)、Ⅲ型(大型給水所)がある。

暗渠排水(あんきょはいすい) 地中に穴あき排水管等を埋め込んで地下排水を行う。水はけの悪い農地を改善することができる。

農道(農業用道路) 主として農業上の利用に供する道路。農村などでは、社会生活基盤としての役割も担っている。

区画整理 合理的な区画整理の再形成と換地による農業の集団化を図り、機械の導入など近代的農法に適する区画の造成を行う。

農地の集団化 各農家が所有する農地が分散している場合、権利の調整を行って各農家がまとまった広さの農地を所有・利用できるようにする。

勾配修正 勾配のある農地の傾斜を緩やかにすることにより、赤土の流出を抑えるとともに耕作しやすい農地をつくる工事。

グリーンベルト 農地からの耕土流出防止を目的として、農地周辺にゲットウやリュウノヒゲなどの植物を帯状に植えたもの。

畦畔(けいはん) 土で造成した小高いしきり(土手)をいう。畑周辺に作ることによって境界の役割となるとともに耕土の流出を抑える機能も持つ。

客土(きゃくど) その土地の土壌の質を改善するため、他の場所から目的に合った土を運び入れること。例えば砂丘地や泥炭地など、保水性や水はけに問題のある土壌の改良に用いる。

浸透池(しんとういけ) 降雨時の泥水を沈積させるための池。雨水は浸透して地下に流れ、泥(赤土)はその場に残るため、海への赤土流出を防ぐ機能を持つ。

沈砂池(ちんさち) 浸透池同様に赤土を沈積させる機能を持つが、雨水は浸透せず流れていく。

貯水池(ちよすいち) 農業用水を確保するための池。地下浸透や流出はさせない。

親水広場(しんすいひろば) 水辺(ダムなど)環境整備にあたって、人々が水に親しめるようなレクリエーション等の活動ができる広場。

魚礁(ぎょしょう) 魚類が集まり住むのに適した水底の空間をもつ岩等がある場所を礁という。コンクリートや鋼等の構造物を沈めることで、人工的に魚礁を造成することが可能。海面に浮く鋼製の浮魚礁、海中に浮かせた中層型浮魚礁もある。

護岸(ごがん) 河岸・海岸などを保護・強化して水害を防ぐこと。コンクリート、石積みなど、様々な強化方法があるほか、直立式、階段式などのタイプがある。海岸には背後の土地利用により、一般護岸、農地護岸、港湾護岸、漁港護岸がある。

平成23年度 人材育成と施設保全活動の支援

農地・水・環境保全向上対策事業

過疎化、高齢化、混住化の進行に伴う集落機能の低下により保全活動が困難となっている地域において、農地・水・環境の良好な保全とその質的向上を図ることを通して地域の振興に資するため、地域ぐるみの共同活動を一体的かつ総合的に支援する

単位：千円

平成23年度			
事業費区分	実施地区	事業内容及活動内容	交付金額
推進交付金	北部12市町村	活動組織と結ぶ協定の審査及び活動組織に対する指導業務と活動の実施確認、その他実施に必要な事について	1,550
支援交付金	北部7市町村(7地区) 活動面積:2,292ha	点検活動：道休農地等発生状況の確認、排水路の施設点検、農道施設の点検 実践活動：農用地法面及び排水路周辺の草刈り、防風林の下草刈り農道路肩・法面の保護、排水路及び沈砂池の泥上げ	47,756



伊江村



伊平屋村

中山間地域等直接支払交付金

農業生産活動を行う上で、地理的・経済的条件が厳しい地域において、担い手の減少と耕作放棄地の発生防止のために、担い手農業者の育成等による農業生産の維持を通して多面的機能の確保を目的とする事業

単位：千円

平成23年度			
事業費区分	活動地区	事業内容及目的	事業費
中山間地域等直接支払推進交付金	名護市	集落説明会の開催、基準検討会の開催、その他推進事務の実施に必要な事項現地確認作業の確保事務作業	200
	伊是名村		200
	伊平屋村		200
中山間地域等直接支払交付金	名護市	認定農業者の育成、農作業の共同化、農業施設の維持管理、集落協定に基づく作業によって農地の保全や農作業の負担軽減を図り、集落の農業生産活動等の体制整備を図る。	2,067
	伊是名村		16,019
	伊平屋村		6,120



道路草刈作業(伊是名村)



景観作物植え付け(名護市)

耕作放棄地再生利用緊急対策交付金

耕作放棄されている農地を再生・利用するために、再生利用活動・再生作業に対する支援や土壌改良、営農定着に対する支援に伴い、必要な施設に対する施設補完整備に対して総合的・包括的に支援する事業

単位：千円

平成23年度			
事業費区分	実施地区	事業内容及目的	事業費
耕作放棄地再生利用緊急対策交付金	国頭村・大宜味村・東村・本部町・名護市・恩納村・金武町・宜野座村・伊平屋村・今帰仁	耕作放棄地を解消するため、土地利用の集積、幹線をするとともに耕作放棄地に対しては、再生作業(障害物除去、整地、耕起・深耕)、土壌改良、営農定着、施設等補完整備(用排水施設、農業用施設・機械購入)等を実施する。	61,891

平成23年度 人材育成と施設保全活動の支援

ふるさと百選認定

「沖縄、ふるさと百選」とは

農山漁村は、厳しい自然環境の中にありながらも、そこに住み、暮らす人々の知恵と努力によって、生産と生活が一体となった豊かな景観を育んできた地域であり、また、都市住民にとっても、「癒し」と「安らぎ」を与えてくれる魅力ある地域でもあります。

そのため、このような多面的機能を有する農山漁村の持つ魅力を県民に広く紹介し、農山漁村に対する理解を進めるために「沖縄、ふるさと百選」として認定し、もって農山漁村の活性化に役立てるものです。

〔認定の対象と部門〕

農林水産業と関わりを持ち、地域が誇れる魅力ある農山漁村を形づくる「ふるさとづくり」を、下記の基準により認定します。

1. 集落部門：人々の生活、地域の特色等が反映され調和のとれていると認められる地域
2. 生産部門：生産基盤の保全、新しい生産活動等周辺環境と調和していると認められる地域
3. 交流部門：農山漁村の祭り、イベント、生業体験等を通じまちと村の交流があると認められる地域

ふるさと農村活性化基金

過疎化、高齢化等の著しい進行により、地域の活力が低下しつつあるなかで、農地や土地改良施設の有する多面的機能の良好な発揮と地域住民活動の活性化を図るため、地域住民活動を推進する人材の育成、施設や農地の利活用及び保全整備活動の促進に対する支援を目的とする事業

単位：千円

平成23年度					
活動名	活動組織	活動地区	活動内容	目的	支援額(千円)
稲嶺土地改良区環境保全活動	稲嶺区	名護市稲嶺区	サガリバナの植樹・草刈り・清掃・雑木の伐採作業を行う。	土地改良区内の農道の草刈り及び雑木の伐採作業等を実践することにより、土地改良施設の機能回復を図るとともに、サガリバナの植樹を行い、受益者及び関係者の農業を取り巻く環境及び土地改良地域の環境保全に対する認識を高める。	273
真喜屋土地改良区環境保全活動	真喜屋区 真喜屋区 土地改良区	名護市真喜屋区	道路沿いの草刈、雑草伐採、排水溝土砂除去清掃を行う。	道路沿いの雑草伐採、草刈、排水溝の上砂除去、清掃作業を行うことにより、土地改良施設の機能回復を図るとともに、組合員並びに地域住民が連携して作業に取り組むことで、土地改良地域の環境保全への意識高揚を図る。	273
新里区内ふるさと環境づくり	新里区	本部町新里区	道路の草刈・清掃、雑木の伐採、排水溝の土砂除去作業を行う。	崎本部区内の農道、排水路等の清掃、土砂除去の作業を実施することにより、受益者及び関係者の農業を取り巻く環境保全への認識を高め、崎本部地域への啓蒙を図る。	291

H22年度 認定地区

伊平屋村田名区
田園風景と伝統文化が育むふるさとづくり名護市勝山区
シークワサーがさわやかに香るふるさとづくり恩納村 恩納漁業共同組合
サンゴを守り育て、環境に優しい漁業によるふるさとづくり伊江村 伊江畜産青年部会「島牛会」
伊江島牛で日本一を目指すふるさとづくり

H23年度 本部町新里区



H23年度 名護市真喜屋区

H23年度 名護市稲嶺区

農業用水利施設管理・機能保全事業

平成23年度			
事業名	地区名	事業内容	事業費(千円)
基幹水利施設管理事業	羽地大川	団体営：基幹的小規模の農業用水利施設の適正な管理を行う	53,100
国営造成施設管理・機能保全事業(管理体制整備型)	羽地大川	農業水利施設の多面的機能を発揮させ、管理体制の整備を図る	9,700
	伊是名		17,500

宜野座村 の基幹産業である農業は、近代的農業施設・機械設備と最新の技術を駆使して生産性の高い安定した経営が行われている。特産物の馬鈴薯と菊、蘭等の花卉及びマンゴー等の熱帯果樹、肉用牛の産地が形成され、生産が大幅に拡大し、県内外への出荷が盛んに行われており更に基幹産物のさとうきびは輪作体系と間作体系の確立により、農業生産の特化と拡大が進展している。漁業は、本村の沿岸に広がる豊かな珊瑚礁海域を中心に、人工漁礁を設置してのパヤオ漁やウニ、もずくなどの有用水産動植物の種苗の生産、放流、育成などの資源維持培養型、いわゆる「つくり育てる」漁業が展開されている。

このような産業の活性化の進展が、若い人々や継続者の定着を促進し、村内に活気と新たな発展のエネルギーをもたらしている。緑に覆われた森林、清冽な流水、変化に富む海岸線など、本村の自然環境は、全村公園化の構想の推進と村民の努力とが相まって、的確に保全されている。この自然環境は適切な管理の下に、住宅、公園、緑地、環境衛生施設、生活排水施設等並びに農業、漁業、観光等、村民の生活・生産基盤として整備され、活用されている。その結果、村民は安全で、快適性・利便性に富んだゆとりある住環境の下で、自然とふれあいながら楽しく暮らしている。



カステラ



ジャガメンインスタント



ジャガモチ



海ぶどう



ちな焼き



もずく採り

恩納村 は、沖縄本島のほぼ中央部西海岸側に位置し、北に名護市、東に宜野座村、金武町、うるま市石川地区（旧石川市）、南に沖縄市、読谷村の各市町村と隣接しています。面積は50.87平方kmで、南北に27.4km、東西4.2kmと細長い形をしており、うるま市石川地区（旧石川市）と隣接する部分は沖縄本島の東西にもっとも狭い地域にあたります。

戦前、戦後を通じて半農半漁の静かな村として時を刻んできた恩納村に、大きな転機が訪れたのは、本土復帰後開催された国際海洋博覧会以降。サンゴ礁の広がる美しい海岸線が観光資源として注目され、大型のリゾートホテルが競って並び建つようになったのです。

多くの村民が生業としてきた農業・漁業も、時代の流れに伴い大きな様変わりを見せています。農業ではこれまでのサトウキビ栽培に加えて、ランやキクなどの花卉、熱帯果樹、野菜類など多様な作物が栽培されています。

漁業も「獲る漁業」だけに頼らず、モズクやウミブドウなどの養殖漁業が年々成果を上げています。また、観光と結びついた工芸産業、商業、サービス業などが芽生えてきており、恩納村では新しい世紀へ向けての村づくりが着々とすすんでいます。



海ぶどう



パッションフルーツ



菊



ドラセナ(観葉植物)



アーサ

金武町 の農業は、キャンプ・ハンセン基地の建設で多くの優良地が接収され、一時期大きく減退しました。しかし、今日は土地改良など農業の基盤整備が進み、また若年農業従業者による熱帯果実や花卉などの栽培が盛んに行われるようになり、専業農家も増え活気を取り戻しつつあります。耕種部門では花卉が一番多く次いで、野菜、さとうきびとなっています。近年は、田芋・水稻・果樹なども増加傾向にあります。畜産部門では豚が最も多く、次いで鶏卵・乳用牛となっています。

金武町の漁業の主な漁法は、刺し網・一本釣り・はえ縄・定置網・海面養殖などです。魚種別にみると、マグロ類・ブリ類・ハタ類・その他魚類を中心にした生産が主体となっていますが、他に、イカ類・タコ類・海藻類なども生産されています。近年、パヤオ操業の普及により漁船等が大型化したため、漁港施設の整備拡張、漁業施設の整備等を進めています。



泡盛 龍



泡盛 松藤



金武 たいもパイ



田芋チーズケーキ



田んぼフェスタ

伊江村 本部半島の北西約9km、東西8.4km、南北3km、周囲22.4kmの位置にある伊江村は、北海岸は約60mの断崖絶壁、南海岸はほとんど砂浜で、島の中央よりやや東よりに、海拔172mの古生代チャートの城山（ぐすくやま）は本島からもよく見え、伊江島タッチー（イータッチー）の愛称で親しまれている。産業は主に農業、漁業から成り立っている。本部港からもフェリーで30分あまりということもあり、「日帰り可能な離島」としての人気も高い。また、戦争に関する施設・史跡もあることから県内外からの修学旅行の需要も多い。気候は温暖で、さとうきび、葉タバコ、花き、野菜、果樹、肉用牛、乳用牛等の産業が盛んである。



伊江村全景



らっきょう煙



島らっきょう



ジーマーミー



伊江牛



菊(平張りハウス)



ハイビスカス(アポロ)

伊平屋村 は、沖縄県の最北端で、東シナ海洋上に浮かぶ離島村です。北緯27.2度、東経127度58分に位置し、那覇市から北方に117km、フェリー発着の今帰仁村運天港より41.1kmの距離にあります。

村は伊平屋島(面積20.66km²、周囲34.23km)と、野甫大橋でつながれた野甫島(1.06km²、4.8km)の2つの島からなり、田名・前泊・我喜屋・島尻・野甫の5つの字に分かれています。

人口は1,405人、世帯数575世帯(平成21年7月)。

年間を通じて安定した温暖気候で、水産業・農業を基幹産業としています。近年、村の活性化図るために、島の自然や歴史文化等の地域資源を活用した体験型観光振興に力を入れ、様々な取り組みを展開しています。



ハシルー上で阿麻和利と護佐丸が太刀で切り結ぶ



一口黒糖



モズク麺



モズク



地酒 黒島・芭蕉布・平松ロック・たつ波



地酒 黒島・芭蕉布・平松ロック・たつ波

伊是名村 沖縄本島の北方、北緯26度56分30秒、東経127度56分35秒に位置し、総面積は15.42km²で伊是名島のほか、具志川島、屋那覇島、降神島の4島から成り立っています。伊是名島を除くたの3島は起伏の少ない隆起珊瑚礁の島ですが、伊是名島はほぼ中央を120mから129mの高台山地が山脈状をなし、南北に走り、これを分水嶺として海岸になだらかに勾配をもち、耕地が広がっています。集落は海岸沿いに発展し、南に伊是名区、西に勢理客区、東に諸見区、仲田区、北に内花区の5区の集落からなっています。

土地は全体として国頭マージで耕作には便利ですが地力はありません。主な農作物はサトウキビのほか、沖縄県内では数少ない稲作も行われています。

水産業ではモズクの養殖が盛んに行われ、伊是名島の特産品として定着し、県内外へ出荷されています。



海ギタラ 屋那覇島風景



もずくようかん



たまねぎスープもずく入り



いかすみかりんとう



アースの佃煮・ジャム



もずくの佃煮



地酒 常盤/伊是名島

国頭村ミニ情報



やんばる学びの森



やんばる学びの森落成式



辺戸岬



ヤンバルクイナ展望台



ゆいゆい国頭




茅打ちパンタ



奥やんばるの里

国頭村

- 36 団体営ため池等整備事業(比地第1)
- 49 農山漁村活性化プロジェクト支援交付金(農山漁村体験施設)(安波)
- 65 海岸保全施設整備事業(浜)
- 66 海岸保全施設整備事業(辺土名)
- 69 漁村再生交付金(浜)
- 73 水産物供給基盤機能保全事業(安田)
- 76 水産物供給基盤機能保全事業(辺土名)

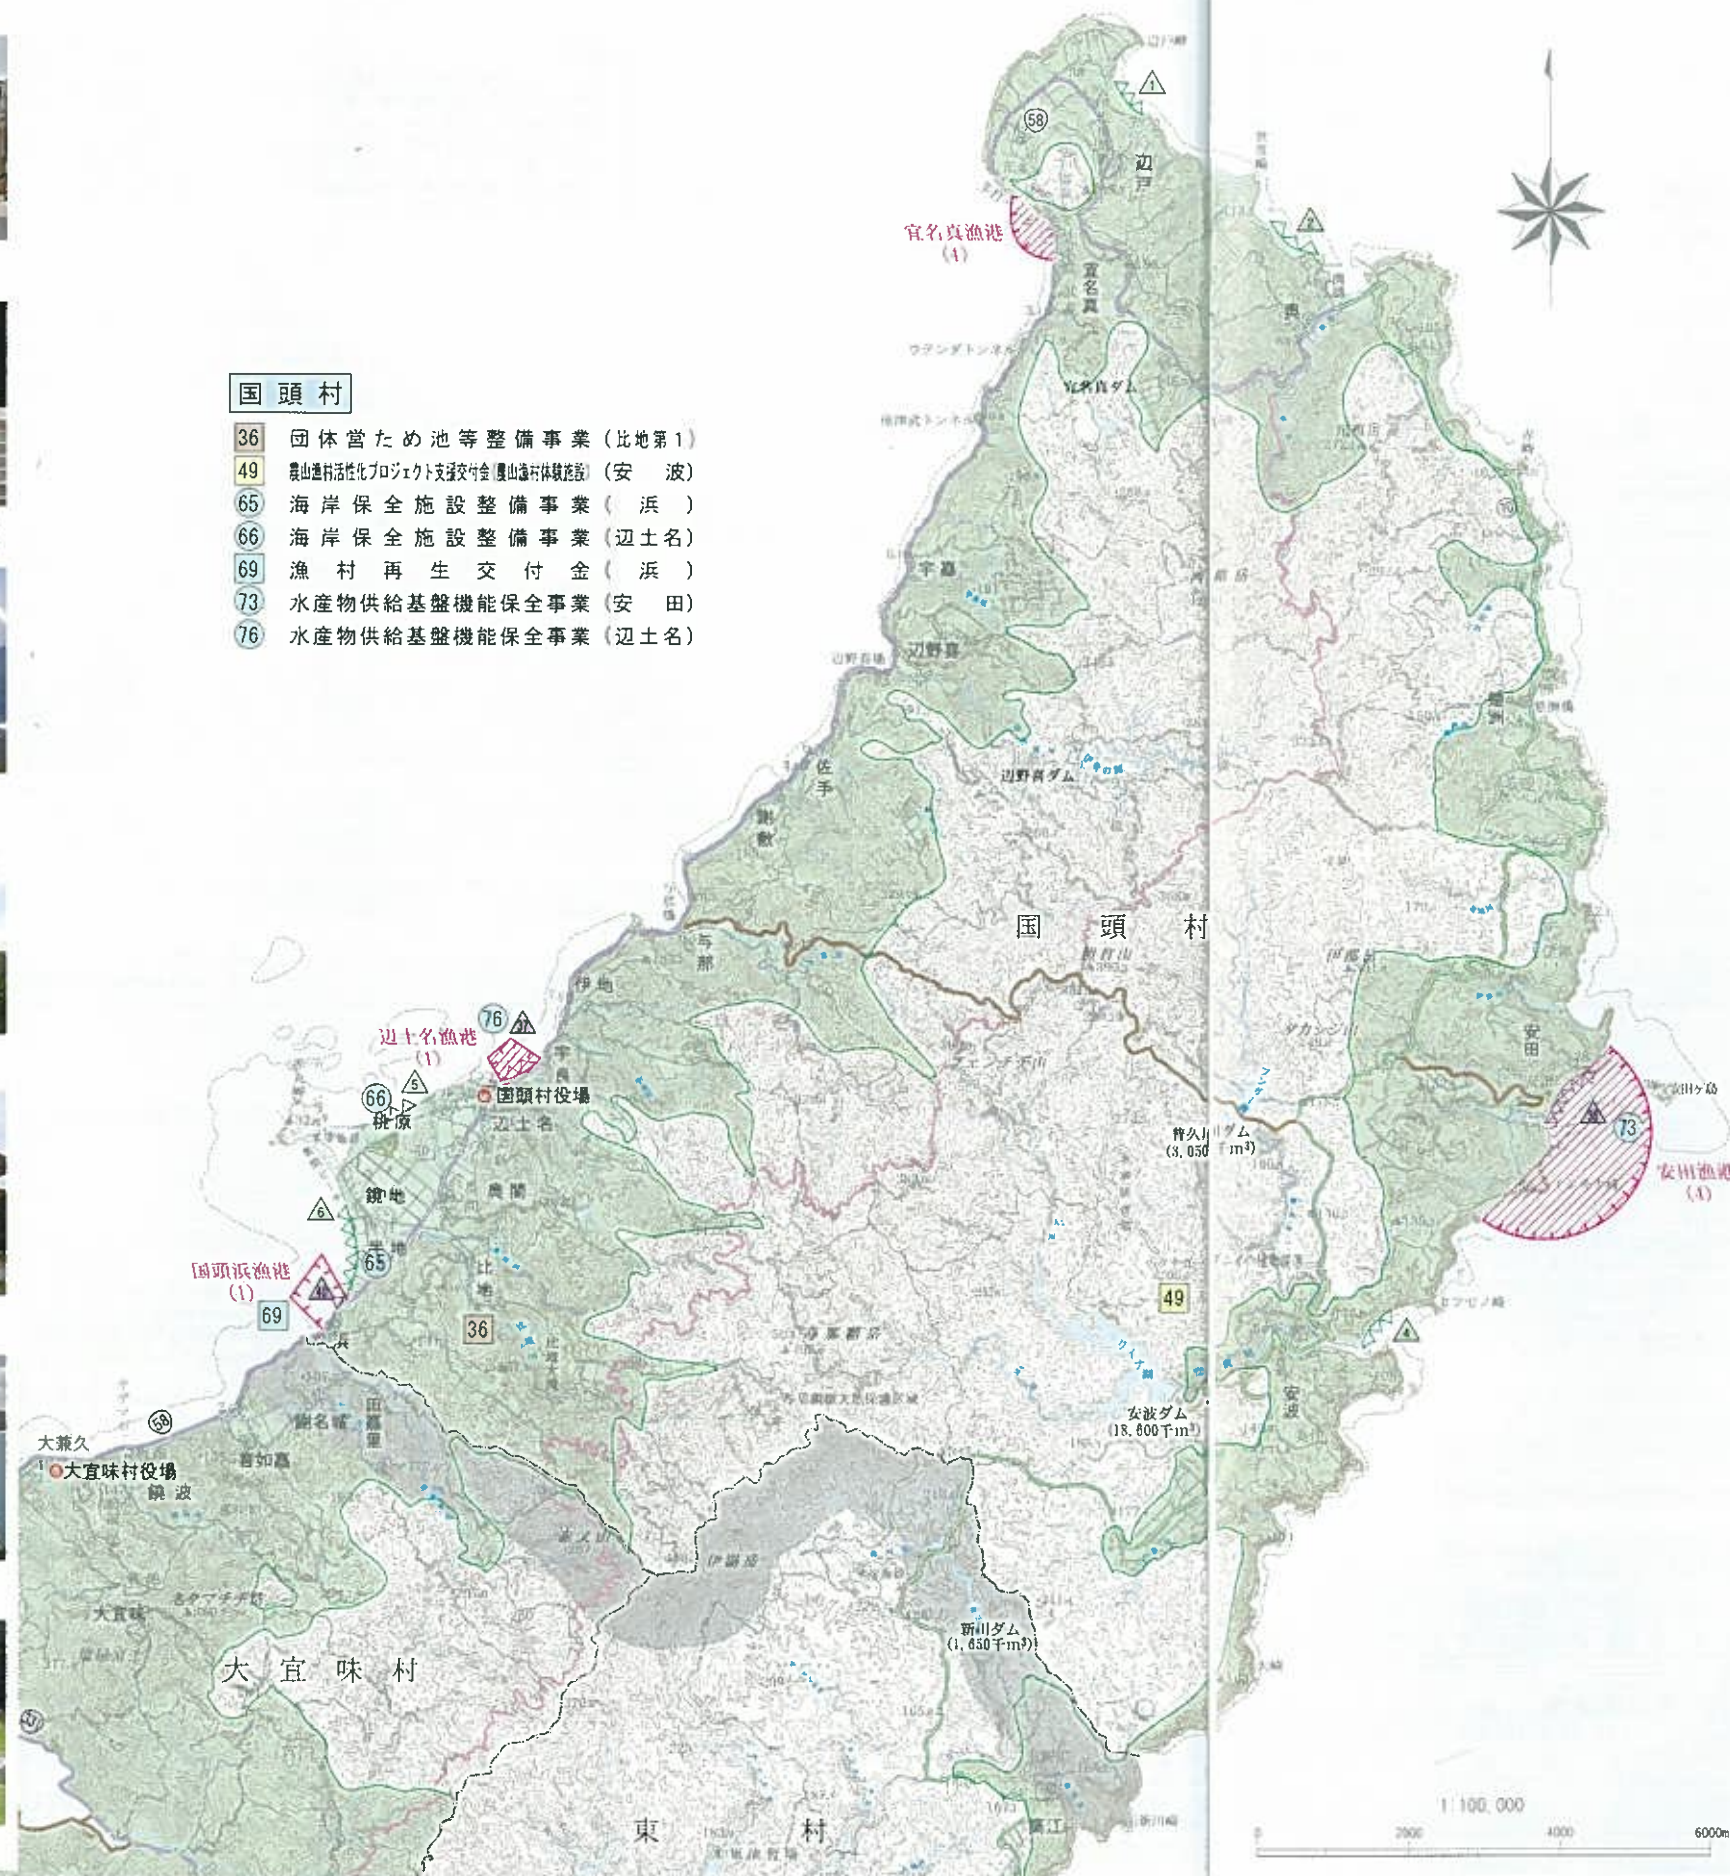

海岸保全施設整備事業(高潮)安田地区(完成後)

海岸保全区域一覧表(農水省所管)

水産庁所管 (m)			農村振興局所管(県管理) (m)		
番号	海岸名	延長	番号	海岸名	延長
△	安田	1,280	△	辺戸	664
△	辺土名	443	△	奥世波原	760
国頭村管理			△	安波	210
△	国頭浜	530	△	辺土名	1,175
			△	浜	1,152

凡 例	
○No	県営事業
△No	団体営事業
△	ほ場の整備
△	農道の整備
△	用排水施設の整備
△	農地の防災・保全
△	農村の総合整備
△	漁港・漁港及び沿岸保全施設の整備
△	漁港区域(ハッチは県管理)
△	海岸保全区域(農村振興局所管)
△	海岸保全区域(水産庁所管)
△	農振地域域
△	ダ ム
△	国 道
△	主要地方道
△	県 道
△	広域基幹林道

大宜味村ミニ情報



道の駅



きゆな牧場



芭蕉布会館



ねろめ食堂



結の浜



大保ダム

県営一般農道整備事業
(島の上3期)大宜味村

大宜味村

- ①7 県営一般農道整備事業(島の上3期)
⑦0 漁村再生交付金(塩屋)



東村ミニ情報



つつじ園



ヒルギ公園



グリーンツーリズム



総合農産加工施設



パイン街路ライン



サンライズひがし



山と水の生活博物館

凡 例	
①	県 営 事 業
②	団 体 営 事 業
③	ほ 場 の 整 備
④	農 道 の 整 備
⑤	用 排 水 施 設 の 整 備
⑥	農 地 の 防 災 ・ 保 全
⑦	農 村 の 総 合 整 備
⑧	漁 港 ・ 漁 船 及 び 漁 業 保 全 施 設 の 整 備
⑨	漁 港 区 域 (ハッチは県管理)
⑩	海岸保全区域(農林漁業所管)
⑪	海岸保全区域(水産庁所管)
⑫	農 保 池 域
⑬	ダ ム
⑭	国 道
⑮	主 要 地 方 道
⑯	県 道
⑰	広 域 基 幹 林 道

東 村

- ①4 県営水質保全対策事業(耕土流出防止型)(東村第2)

海岸保全区域一覧表(農水省所管)

水産庁所管 (m)			農村振興局所管(県管理)(m)		
番 号	海 岸 名	延 長	番 号	海 岸 名	延 長
東村管理			△	慶 佐 次	3,200
△	慶 佐 次	1,360			
大宜味村管理					
△	塩 屋	1,115			


1:75,000

0 1000 2000 3000 4000m

事業地区位置図

今帰仁村/名護市内

北部管内事業位置図 S=1:100,000

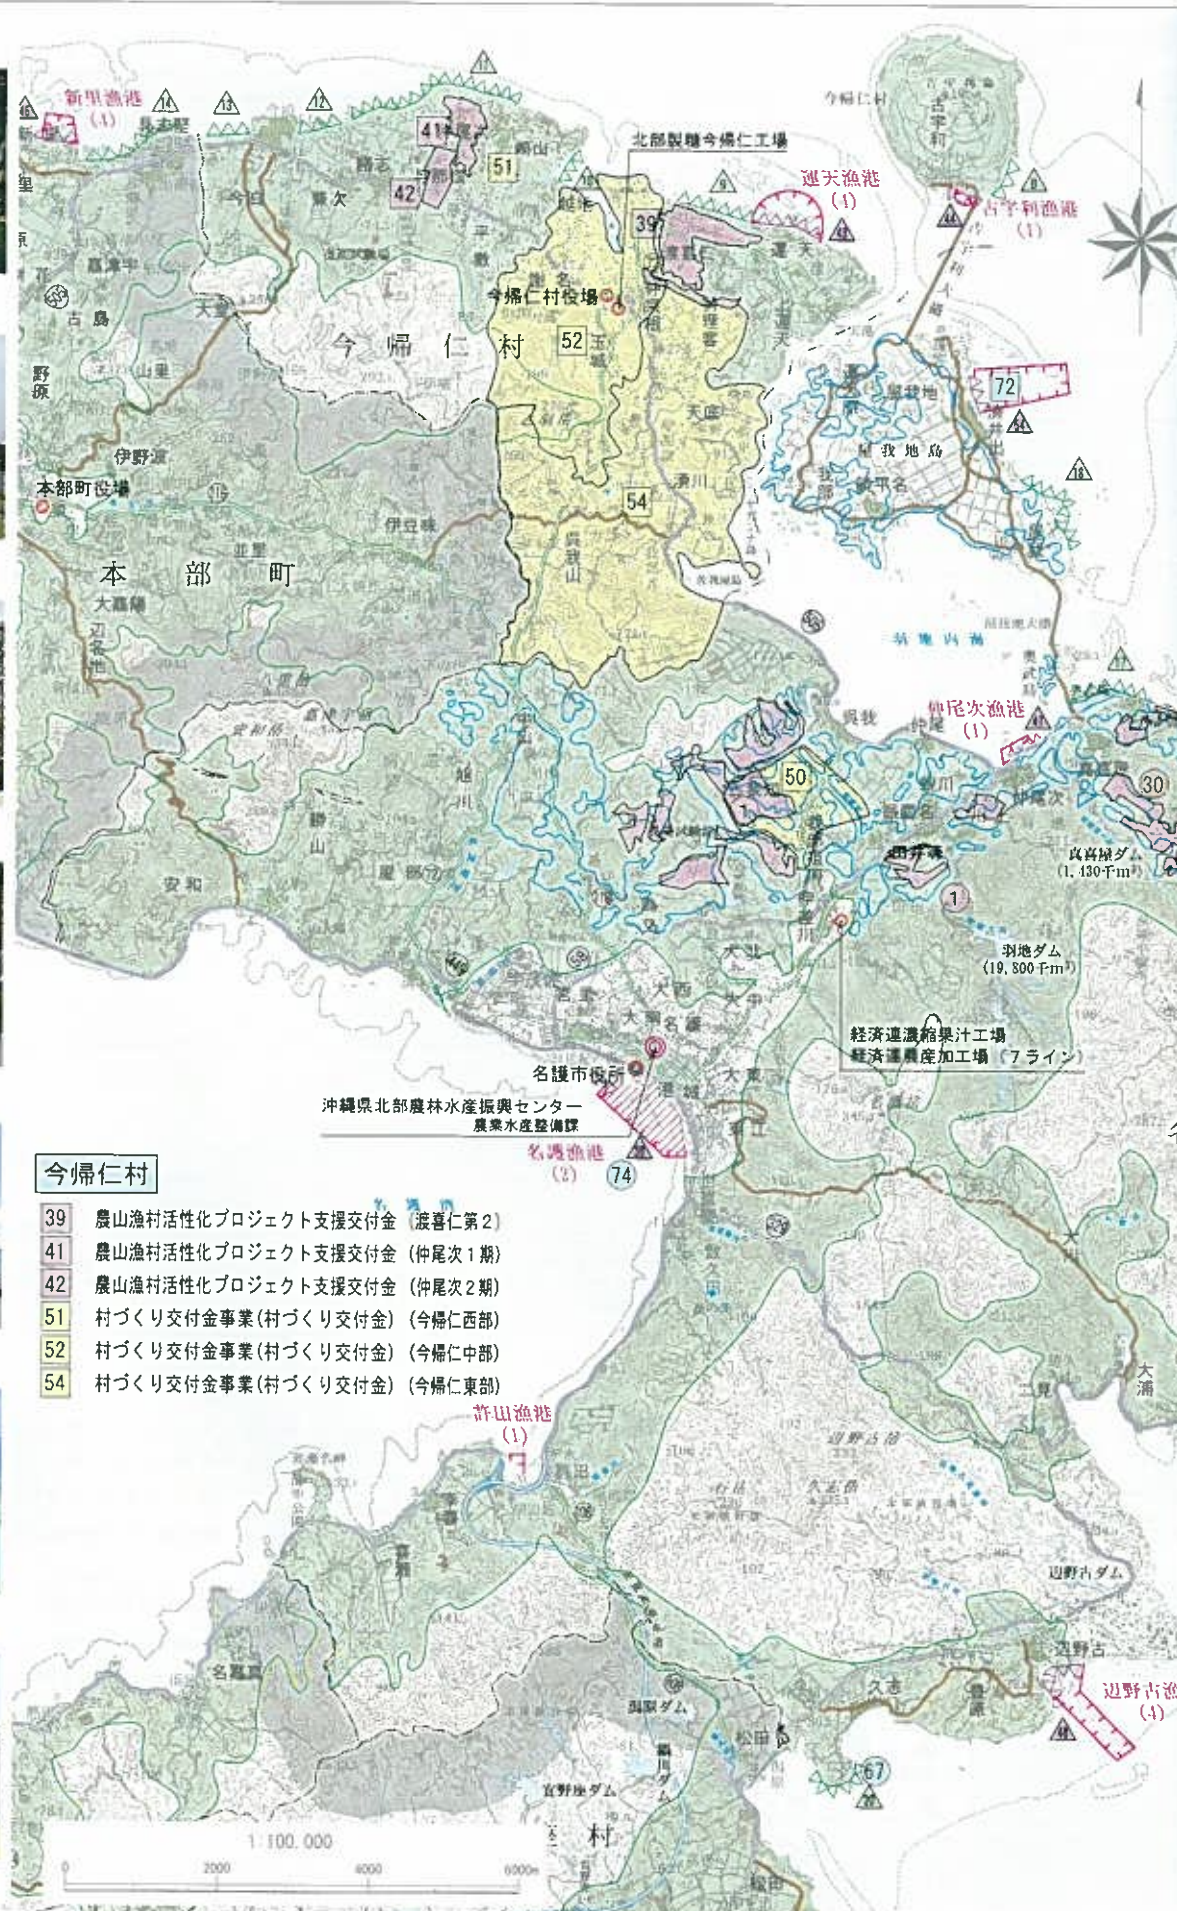

今帰仁村

- 39 農山漁村活性化プロジェクト支援交付金 (渡喜仁第2)
- 41 農山漁村活性化プロジェクト支援交付金 (仲尾次1期)
- 42 農山漁村活性化プロジェクト支援交付金 (仲尾次2期)
- 51 村づくり交付金事業(村づくり交付金) (今帰仁西部)
- 52 村づくり交付金事業(村づくり交付金) (今帰仁中部)
- 54 村づくり交付金事業(村づくり交付金) (今帰仁東部)

今帰仁村ミニ情報



今帰仁城跡の全景



今帰仁城跡



今帰仁グスクまつり



村民の浜



古宇利大橋



崎山




クラブハウス

今帰仁村/名護市

事業地区位置図

今帰仁村/名護市内

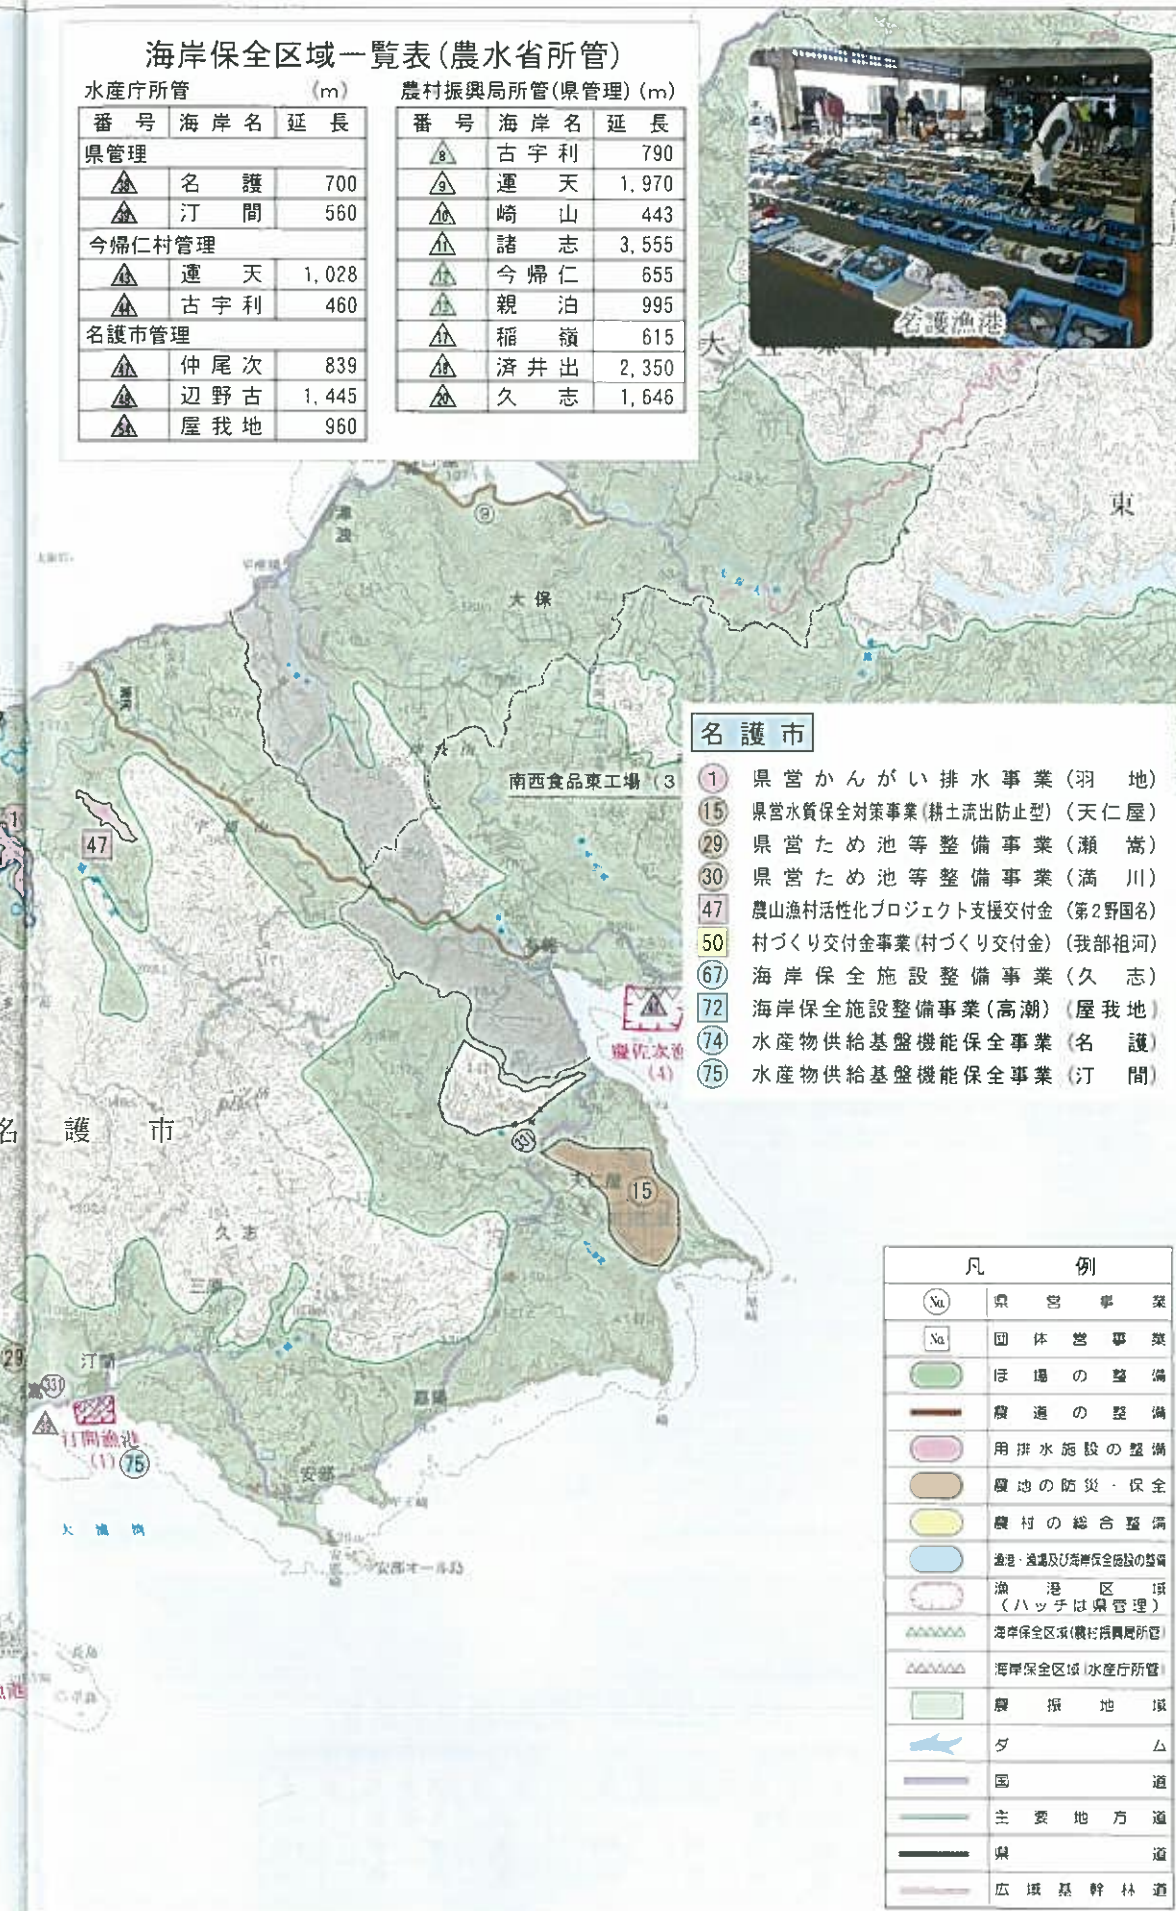

海岸保全区域一覧表(農水省所管)

水産庁所管 (m)			農林振興局所管(県管理) (m)		
番号	海岸名	延長	番号	海岸名	延長
県管理			△	古宇利	790
△	名護	700	△	運天	1,970
△	汀間	560	△	崎山	443
今帰仁村管理			△	諸志	3,555
△	運天	1,028	△	今帰仁	655
△	古宇利	460	△	親泊	995
名護市管理			△	稲嶺	615
△	仲尾次	839	△	済井出	2,350
△	辺野古	1,445	△	久志	1,646
△	屋我地	960			

名護市

- ① 県営かんがい排水事業(羽地)
- ⑮ 県営水質保全対策事業(耕土流出防止型)(天仁屋)
- ⑲ 県営ため池等整備事業(瀬崎)
- ⑳ 県営ため池等整備事業(満川)
- ④⑦ 農山漁村活性化プロジェクト支援交付金(第2野国)
- ⑤⑩ 村づくり交付金事業(村づくり交付金)(我部祖河)
- ⑥⑦ 海岸保全施設整備事業(久志)
- ⑦② 海岸保全施設整備事業(高潮)(屋我地)
- ⑦④ 水産物供給基盤機能保全事業(名護)
- ⑦⑤ 水産物供給基盤機能保全事業(汀間)

凡 例	
①	県営事業
②	国営事業
③	ほ場の整備
④	農地の整備
⑤	用排水施設の整備
⑥	農地の防災・保全
⑦	農地の総合整備
⑧	漁港・漁場及び水産物供給施設の整備
⑨	漁港・漁場(ハッチは県管理)
⑩	海岸保全区域(農林振興局所管)
⑪	海岸保全区域(水産庁所管)
⑫	農地
⑬	ダム
⑭	国道
⑮	主要地方道
⑯	県道
⑰	広域基幹林道

名護市ミニ情報



ふるさと百選22年度認定 名護市(崎山)



パイン園



ゴーヤパーク



わんさか大浦パーク



トロピカル王国



フルーツランド



やんばる物産センター

事業地区位置図

恩納村管内

北部管内事業位置図 S=1:75,000

恩納村ミニ情報



ふるさと百選22年度認定 恩納村(恩納)



ふれあい体験学習施設



恩納海浜公園ナビービーチ



県民の森



真栄田岬



おんなの駅



博物館



水産物供給基盤整備事業 瀬良垣漁港(H21完了)

恩納村

- 13 県営水質保全対策事業(耕土流出防止型) (恩納村第2)
- 44 農山漁村活性化プロジェクト支援交付金(仲泊)
- 58 農業集落排水事業(村づくり交付金)(山田)
- 61 農業集落排水事業(農業集落排水資源循環統合補助事業)(恩納1期)



恩納村

事業地区位置図

恩納村管内



農山漁村活性化プロジェクト支援交付金 安富祖地区(H22完了)



海岸保全区域一覧表(農水省所管)

水産庁所管 (m)			農村振興局所管(県管理) (m)		
番号	海岸名	延長	番号	海岸名	延長
恩納村管理					
△	恩納	440	△	安富祖	1,000
△	前兼久	450	△	瀬良垣	226

凡 例	
○	県営事業
□	団体営事業
○	ほ場の整備
—	農道の整備
○	用排水施設の整備
○	農地の防災・保全
○	農村の総合整備
○	漁港・漁港及び沿岸保全施設の整備
○	漁港区画(ハッチは県管理)
△	海岸保全区域(農村振興局所管)
△	海岸保全区域(水産庁所管)
△	農振地域
△	ダ
△	国
△	主要地力道
△	県
△	広域基幹林道

金武町ミニ情報



億首川マングローブ



鍾乳洞(古酒貯蔵)



観音堂



金武大川



農業集落排水事業(村づくり交付金) 屋嘉地区

瀬良垣漁港
(1)

瀬良垣ヒルチ 55.0
地域水産物供給基盤整備事業(瀬良垣) (H21年度完了) (恩納村)

恩納村役場
恩納ダム
当袋ダム
恩納岳

恩納村
金武町

金武大川

金武町

- ⑨ 県営水質保全対策事業(耕土流出防止型) (金武町第2)
- ⑩ 県営地帯総合整備事業(担い手支援型) (小浜)
- ⑪ 農山漁村活性化プロジェクト支援交付金(並里)
- ⑫ 村づくり交付金事業(村づくり交付金)(並里)
- ⑬ 農業集落排水事業(村づくり交付金)(屋嘉)
- ⑭ 農業集落排水事業(村づくり交付金)(並里・金武)
- ⑮ 農業集落排水事業(村づくり交付金)(並里・金武第2期)

宜野座村ミニ情報



農家体験



宜野座村文化センター



漢那ビーチ



未来ぎのぞ

宜野座村

漢那ダム
漢那
宜野座村役場
宜野座

漢那漁港
68 (1)

宜野座漁港
(1)

宜野座村

- ⑧ 県営水質保全対策事業(耕土流出防止型) (宜野座村第2)
- ⑨ 県営水質保全対策事業(耕土流出防止型) (宜野座村第3)
- ⑩ 県営水質保全対策事業(耕土流出防止型) (宜野座村第4)
- ⑪ 団体営農地保全整備事業(松田東)
- ⑫ 団体営農地保全整備事業(松田西1期)
- ⑬ 村づくり交付金事業(村づくり交付金)(松田)
- ⑭ 農業集落排水事業(農業集落排水資源循環総合補助事業)(惣慶)
- ⑮ 農業集落排水事業(農業集落排水資源循環総合補助事業)(宜野座)
- ⑯ 漁港地域水産物供給基盤整備事業(漢那)
- ⑰ 広域漁場整備事業(宜野座)

海岸保全区域一覧表(農水省所管)

水産庁所管 (m)			農村振興局所管(県管理) (m)		
番号	海岸名	延長	番号	海岸名	延長
1	漢那	575	1	宜野座	1,070
			2	金武	1,650

凡 例	
⑨	県営事業
⑩	団体営事業
⑪	農地の整備
⑫	農地の整備
⑬	用排水施設の整備
⑭	農地の防災・保全
⑮	農地の総合整備
⑯	漁港・漁場及び沿岸保全施設の整備
⑰	漁港・漁場(ハッチは県管理)
⑱	海岸保全区域(農林漁業関係)
⑲	海岸保全区域(水産庁所管)
⑳	農振地域
㉑	ダム
㉒	国道
㉓	主要地方道
㉔	県道
㉕	広域基幹林道

伊平屋村ミニ情報



ふるさと百選22年度認定 伊平屋村(山名)



念頃平松



クマヤ洞窟



クバ山



ヤヘー岩



ムーンライトマラソン

伊平屋村

- ④ 県営かんがい排水事業(伊平屋北部1期)
- ⑥ 県営かんがい排水事業(伊平屋北部2期)
- 25 団体営農地保全整備事業(コーチ原)
- 28 団体営農地保全整備事業(前泊)
- 31 県営ため池等整備事業(門原)
- 32 県営ため池等整備事業(イリシナ)
- 33 県営ため池等整備事業(前原)
- 34 県営ため池等整備事業(谷川)
- 38 県営経営体育成基盤整備事業(我喜屋)
- 62 農業集落排水事業(農業集落排水資源循環統合補助事業)(伊平屋)



県営経営体育成基盤整備事業(我喜屋地区)

海岸保全区域一覧表
(農水省所管)

番号	海岸名	延長
△	前泊	1,020
△	西島尻	5,700
△	島尻	960

凡	例
④	県営事業
25	団体営事業
緑	ほ場の整備
茶	農道の整備
黄	用排水施設の整備
茶	農地の防災・保全
黄	農地の総合整備
青	漁港・漁業及び沿岸保全施設の整備
△	漁港区域(ハッチは県管理)
△	海岸保全区域(農林省所管)
△	海岸保全区域(水産庁所管)
緑	農振地域
ダ	△
国	道
主	要地万道
県	道
広	域基幹林道

伊是名村ミニ情報



尚円王公園



みほそ所



マッテラの浜



銘菊家



サムレー道



グスク



伊是名ビーチ

伊是名村

- ② 県営かんがい排水事業(伊是名東部)
- 10 県営水質保全対策事業(耕土流出防止型)(伊是名第1)
- 35 県営ため池等整備事業(カビチ)
- 40 農山漁村活性化プロジェクト支援交付金(タチハ)
- 43 農山漁村活性化プロジェクト支援交付金(鳥田)
- 45 農山漁村活性化プロジェクト支援交付金(仲田)



県営かんがい排水事業 伊是名東部地区

海岸保全区域一覧表(農水省所管)

番号	海岸名	延長
△	伊是名	1,670
△	勢理客	890

番号	海岸名	延長
△	内花	7,265
△	屋下	1,245
△	勢理客	840
△	伊是名	1,204
