


市町村名		金武町						
平成30年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【公表用】								
事業番号・事業名	1-① パークゴルフ場整備事業			沖縄21世紀ビジョン基本計画該当箇所	第3章-3-(2)-工			
	担当部課名	商工観光課	事業実施(予定)年度	平成28~令和元年度	沖縄振興基本方針該当箇所	観光客の受入体制の整備		
事業内容	金武町にパークゴルフ場を整備し、観光誘客と地域住民の福祉の向上を図る。							
効果発現年度	<input type="checkbox"/> 当年度 <input checked="" type="checkbox"/> 後年度(令和2年度)							
実施方法	<input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 補助 <input type="checkbox"/> 負担 <input type="checkbox"/> その他()							
予算額・執行額 【単位:千円】 (「交付金」+「市町村負担」ベース)			H29年度	H29年度(繰越)	H30年度	H30年度(繰越)	R1年度	
	予算の状況	(a) 当初予算額	16,000			171,115		
		(b) 予算現額	98,938			105,702		
		(c) 増減額(b-a)	82,938	0		▲ 65,413	0	
		(d) 繰越額	-	98,938			66,929	
		A. 計(b+d)	98,938	98,938		105,702	66,929	
	B. 執行済額		0	96,519	44,988	57,699		
	うち交付金充当額		0	77,215	35,990	46,159		
	次年度繰越額							
	執行率(%) (B/A)		0.0%	97.6%	42.6%	86.2%		
予算の状況の説明		雨天のため、工期の延長があり、工事費に係る63,116千円を平成31年度に繰り越した。						
活動目標(指標)及び達成状況	30活動目標(指標)		達成状況					
			H29年度(繰越)	H30年度	H30年度(繰越)	R1年度		
	建築工事の実施		目標	()	()	(整備工事の実施)	()	
			実績			整備工事の完了		
達成状況説明		○平成29年度に実施設計を策定した。 ○平成30年度にパークゴルフ場の造成工事(1工区、2工区)ともに完了した。 ○平成30年度(繰越)にパークゴルフ場整備工事(土工、法面工、排水工、植栽工)が完了した。						
成果目標(指標)及び進捗状況	H29成果目標(指標)		基準値(年度)	H29年度(繰越)	H30年度(繰越)	R1年度	目標値(R2年度)	
	造成等工事の実施		目標	()	(造成工事等の実施)	()	()	()
			実績		造成工事等の完了			
	○整備工事の実施 ○建築工事の実施		目標	()	()	(整備工事の実施)	(建築工事の実施)	()
			実績			整備工事の完了	建築工事の完了	
	【R2成果目標】 観光客の年間利用者数:15,046人 町民の年間利用者数:8,102人		目標	()	()	()	()	・観光客の年間利用者数15,046人 ・町民の年間利用者数8,102人
進捗状況説明		令和元年10月に整備(土工、法面工、排水工、植栽工)が完了し、併せて令和元年6月から建築工事を実施する。						

推進上の留意点(推進上の問題、外部環境の変化)		改善余地の検証(効率の更なる向上の視点)
取組の検証	平成30年度(繰越)の事業については、令和元年度に予定している建築工事と並行して工事を実施するため、事業工程と現場の状況を把握する必要がある。	現場レベルでの事業の進捗状況を常に把握し、今後の工程が円滑に遂行できるよう努める。
	今後の取り組み方針	
事業工程に係る調整を密に行い、令和元年度に実施を予定している建築工事に支障を来さぬよう業務を遂行し、令和2年度の開業を目指し取り組んでいく。		

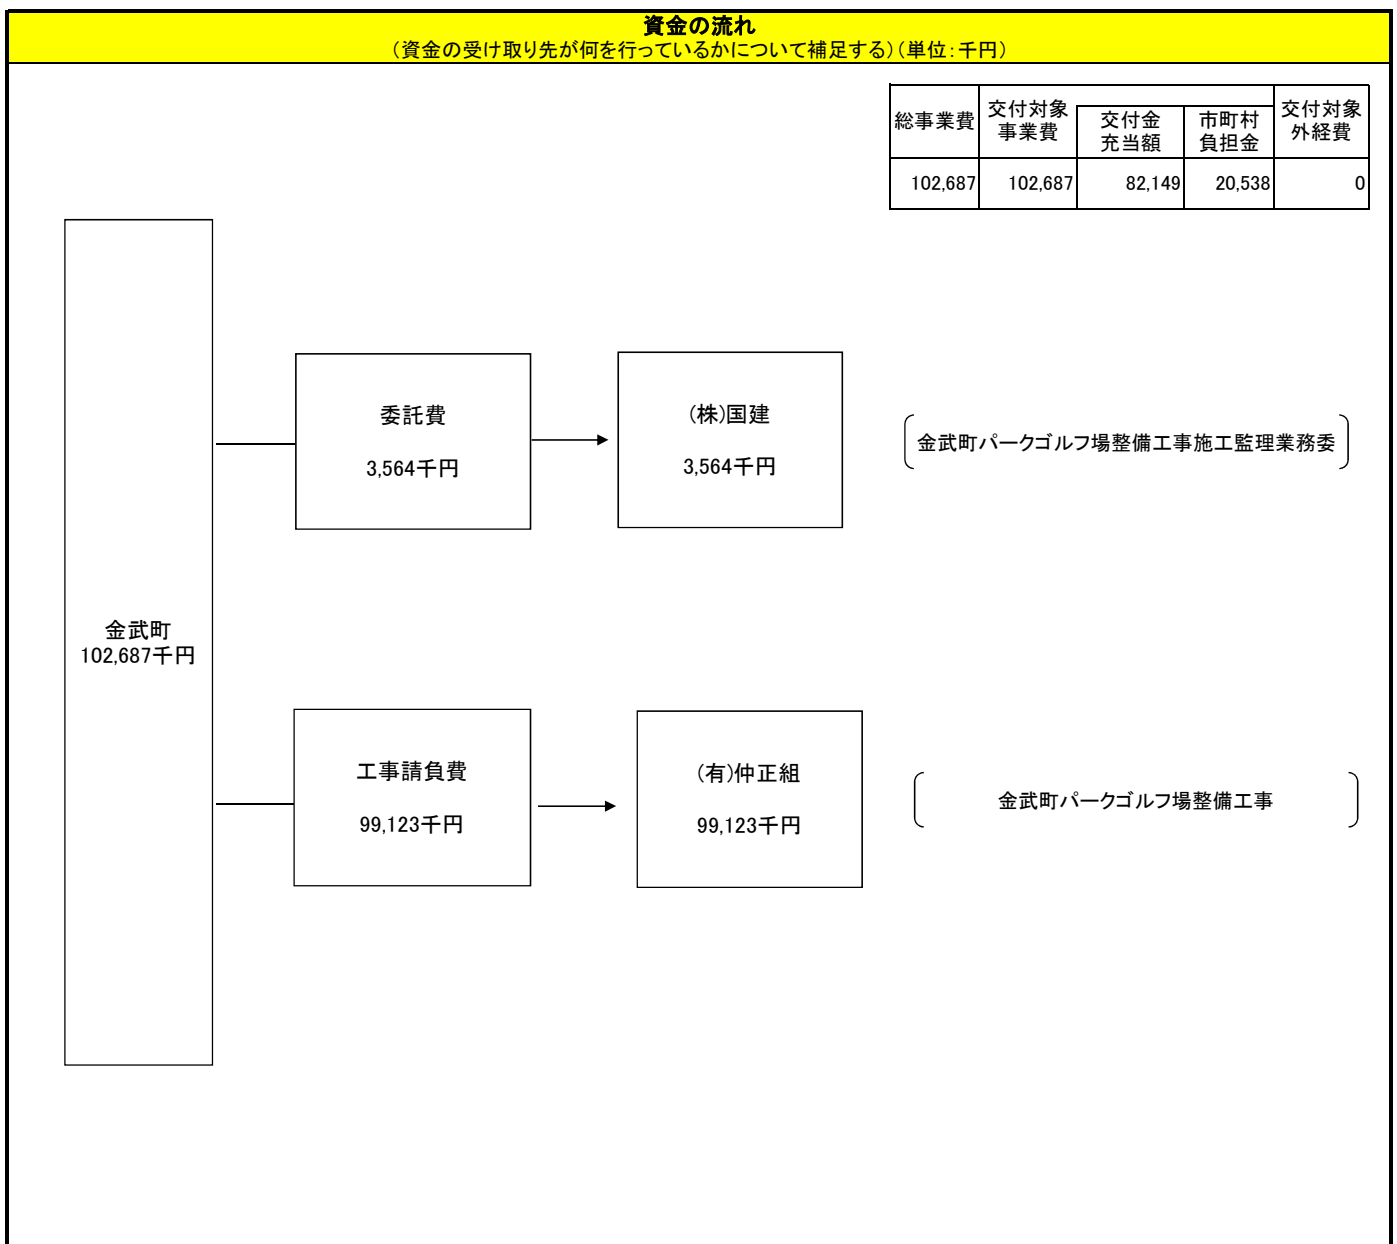

資金の流 れ、費目 ・ 評価	評価	点検項目	評価に関する説明
	○	支出先の選定方法は妥当か。	○工事の業者選定は指名競争入札により実施しており、妥当であったと考えている。
	○	予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。	○不用額については、2,412千円であり、適正な規模であったと考えている。
	—	受益者との負担関係は妥当であるか。	○費目・用途については事業目的達成の観点から必要なものなのか等については額の確定時において検査、確認しており、適正であった。
	○	費目・用途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。	

市町村名		金武町					
平成30年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【公表用】							
事業番号・事業名	1-③ 金武町フットボールセンター機能強化事業		沖縄21世紀ビジョン 基本計画該当箇所		第3章-3-(2)-エ		
担当部課名	金武町教育委員会 社会教育課		事業実施(予定)年度	平成30~令和元年度	観光客の受入体制の整備		
事業内容	金武町フットボールセンターに観覧席を設置し、施設の利便性の向上を図るとともに、大会等の受け入れにより地域の活性化を図る。						
効果発現年度	<input type="checkbox"/> 当年度 <input checked="" type="checkbox"/> 後年度(令和2年度)						
実施方法	<input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 補助 <input type="checkbox"/> 負担 <input type="checkbox"/> その他()						
予算額・執行額 【単位:千円】 (「交付金」+「市町村負担」ベース)	予算の状況	H29年度	H29年度(繰越)	H30年度	H30年度(繰越)	R1年度	
		(a) 当初予算額			92,000		
	(b) 予算現額			92,000			
	(c) 増減額(b-a)			0	0	0	
	(d) 繰越額				92,000		
	A. 計(b+d)	0	0	92,000	92,000	0	
	B. 執行済額	0	0	0	67,222	0	
	うち交付金充当額	0	0	0	53,777	0	
	次年度繰越額						
	執行率(%) (B/A)	#DIV/0!	#DIV/0!	0.0%	73.1%	#DIV/0!	
予算の状況の説明	観客席数変更に伴い設計変更が生じ、その調整に不測の日数を要し、工事費の92,000千円を令和元年度に繰越した。また、当初は観覧席を土木工事として設置予定していたが、建築工事で発注することで予算の縮小及び入札残により補助ベースでは24,778千円の執行残となったが、その残額で関連する付帯工事を町単費で実施することができた。						
活動目標(指標)及び達成状況	30活動目標(指標)		達成状況				
			H29年度(繰越)	H30年度	H30年度(繰越)	R2年度	
	観覧席の整備工事	目標	()	()	(観覧席整備工事の実施)		
	実績			観覧席整備工事の完了			
達成状況説明	平成31年度(平成30年度より繰越)に観覧席整備工事1工区、2工区ともに完了した。						
成果目標(指標)及び進捗状況	H29成果目標(指標)		基準値(年度)	H29年度	H30年度	H30年度(繰越)	目標値(R2年度)
	観覧席の整備工事	目標	()	()	()	(観覧席整備工事の実施)	()
		実績				観覧席整備工事の完了	
	【R2成果目標】 プロサッカーキャンプ受入:2チーム 大会開催:5大会	目標	()	()	()	()	・プロサッカーキャンプ受入2チーム ・大会開催5大会
		実績					
進捗状況説明	・観覧席の整備工事については、令和元年度7月末で整備が完了し、同月から供用が開始されている。令和2年度は整備した観覧席を活用し、プロサッカーキャンプ受入や大会誘致に取り組んでいく。						

	推進上の留意点（推進上の問題、外部環境の変化）	改善余地の検証（効率の更なる向上の視点）
取組の検証	・観覧席が整備されたことにより、プロサッカーチームのキャンプや大規模大会等が開催できる環境であることを大会主催者や競技団体に周知する必要がある。一般客に対しても、安全に観戦できる環境であることの周知が必要である。	・県内で開催されている大規模大会等の情報収集を行い、大会主催者に施設を活用してもらえよう周知活動を行う。プロチームに対しても、キャンプ中の練習やファンサービスに適した環境であることをアピールする。


今後の取り組み方針

- ・ホームページやSNSなどに観覧席の写真を掲載し、大会主催者や競技団体に情報発信することで、大規模大会やイベント等の開催につなげる。
- ・プロサッカーチームのキャンプについても、多くの来客者が訪れても観戦しやすい環境であることをアピールし、継続的なキャンプ受入に取り組む。

資金の流れ

（資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する）（単位：千円）

総事業費	交付対象事業費	交付金		交付対象外経費
		充当額	市町村負担金	
67,222	67,222	53,777	13,445	0

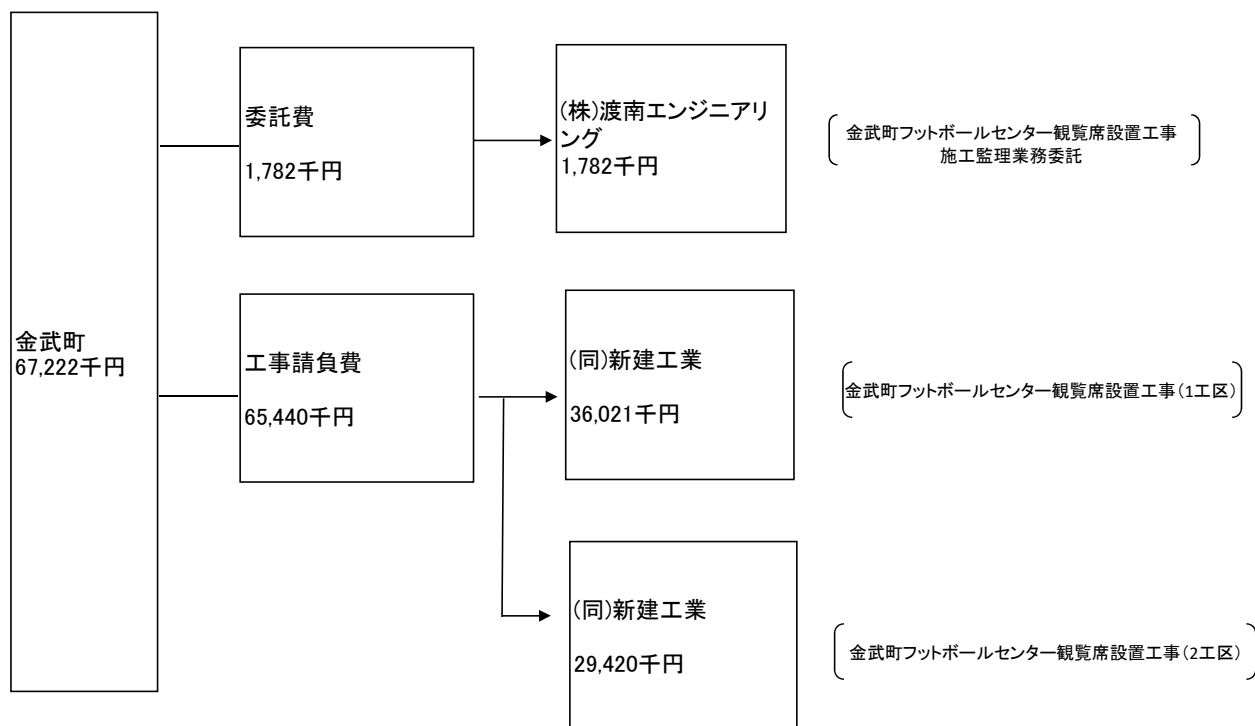

資金の用途の流れ、検・費目・評価	評価	点検項目	評価に関する説明
	○	支出先の選定方法は妥当か。	○委託及び工事の業者選定は指名競争入札により実施しており、妥当であったと考えている。
	○	予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。	○予算規模については、適正な規模であったと考えている。
	—	受益者との負担関係は妥当であるか。	○費目・使途について事業目的達成の観点から必要なものなのか等については額の確定時において検査、確認しており、適正であった。
	○	費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。	
