
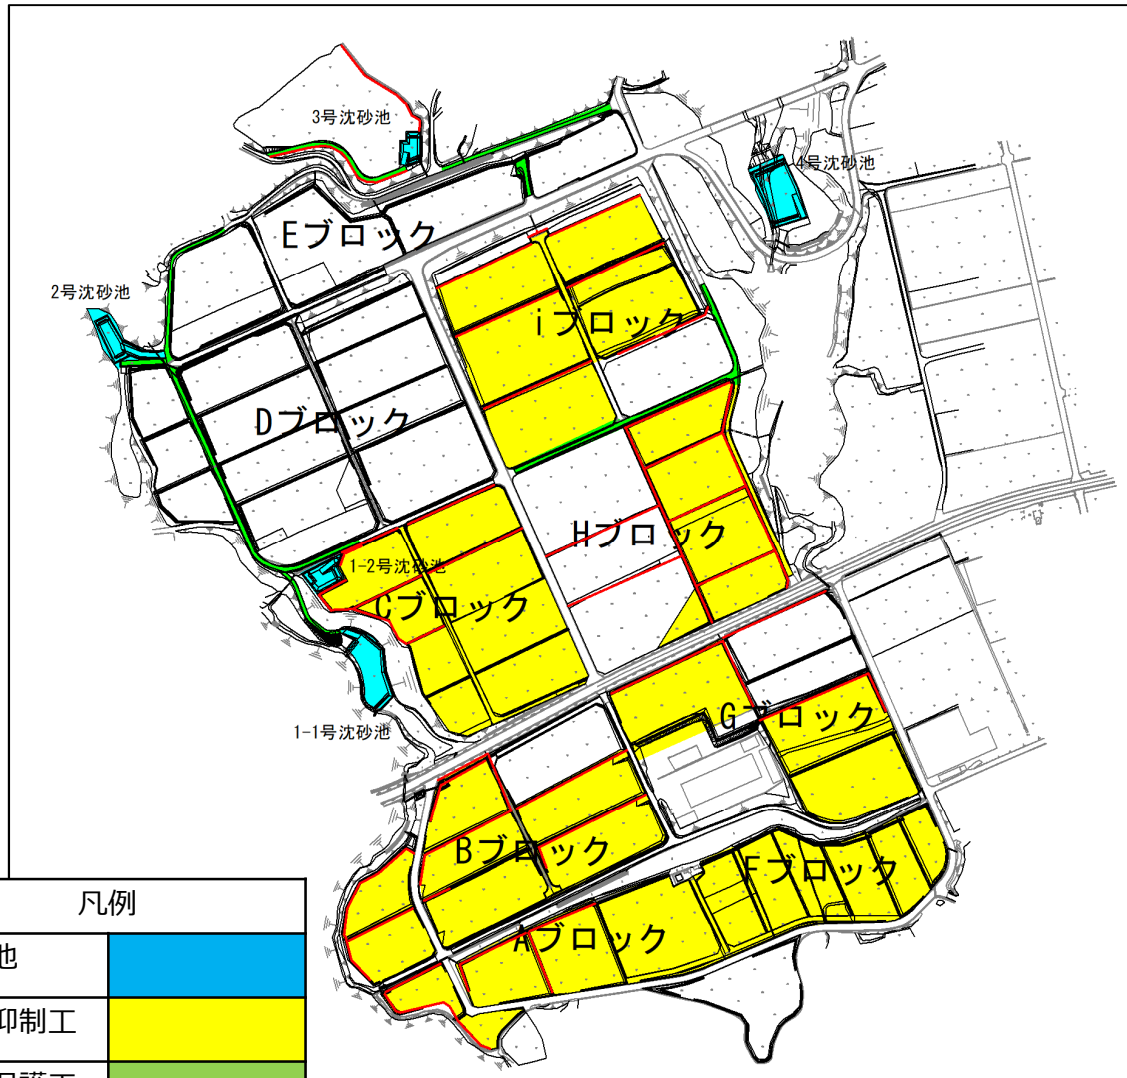


水質保全対策事業 久米島町第3地区 位置図

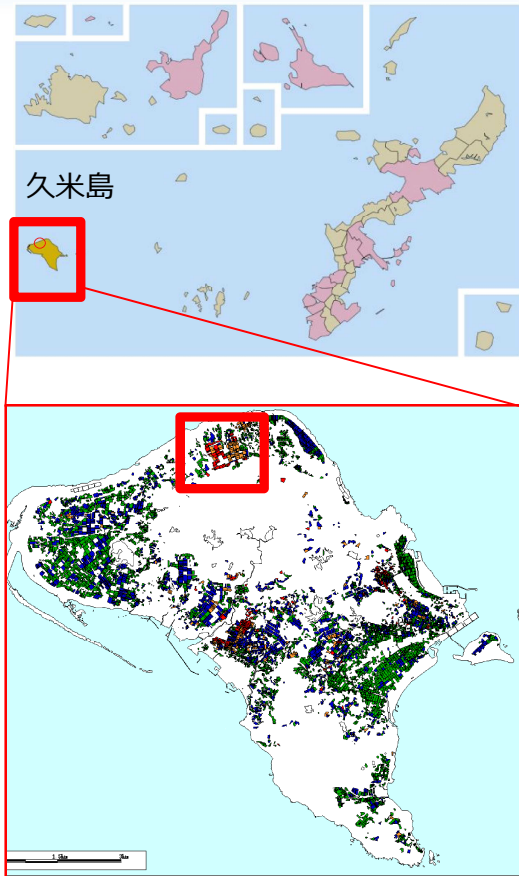

整備内容（整備実績）

沈砂池	: 5基 (4基)
勾配抑制工	: 9.8ha (9.8ha)
路面保護工	: 2,200 m (1,224m)
排水路工	: 4,487 m (4,487m)

凡例

沈砂池	
勾配抑制工	
路面保護工	
排水路工	
