


広域化・共同化計画 進捗管理表（令和6年度 沖縄県）

分類	ブロック	a.広域的な連携メニュー	b.参加市町村 団体等	c.実施主体	d.取組時期			f.取組時期に対する進捗状況 ○予定通り、△予定未達、×進捗なし	g.PPP/PFIの推進に関 わる取組に該当	h.メニューの進捗評価					i.当該年度(R6)に実施した取組	j.来年度の取組予定				
					短期（～5年以内） (R5～R9)	中期（～10年以内） (R10～R14)	長期（～30年以内） (R15～R34)			R5	R6	R7	R8	R9						
計画メニュー	南部 ブロック	汚水処理施設の統廃合	し尿処理施設及び下水処理施設の統廃合（同慶苑→糸満市終末処理場）	糸満市、南部広域行政組合		検討体制の構築、詳細効果検討	法手続き、基本設計	詳細設計、工事着手、事業開始	○			D	D			検討業務	統合に向けた調整			
		汚水処理施設の統廃合	し尿処理施設及び下水処理施設の統廃合（清澄苑→糸満市終末処理場又は西原浄化センター）	糸満市、南部広域行政組合、沖縄県		検討体制の構築、詳細効果検討	法手続き、基本設計	詳細設計、工事着手、事業開始	○			D	D			検討業務	統合に向けた調整			
		汚水処理施設の統廃合	集落排水施設の統廃合（玉城第1,2、奥武地区→玉城第4地区）	南城市	南城市		詳細設計、工事着手	事業開始		○			D	D			統廃合の検討を含めた維持管理適正化計画を策定	令和8年度新規採択に係るヒアリング実施予定		
		汚水処理施設の統廃合	集落排水施設の統廃合（目取間、湧福地区→玉城第5地区）	南城市	南城市		検討体制の構築、詳細効果検討	法手続き、基本設計	詳細設計、工事着手、事業開始		○			D			令和7年度維持管理適正化計画策定するための予算要求を実施	統廃合の検討を含めた維持管理適正化計画を策定予定		
	中部 ブロック	汚水処理施設の統廃合	下水処理施設の統廃合（筥辺浄化センター→宜野湾浄化センター）	読谷村、沖縄県		検討体制の構築、詳細効果検討	法手続き、基本設計	詳細設計、工事着手、事業開始					未着手	未着手						
		汚水処理施設の統廃合	し尿処理施設及び下水処理施設の統廃合（良尾苑、石川終末処理場、し尿受入施設→石川終末処理場又は良尾川浄化センター）	うるま市、中部衛生施設組合、沖縄県		検討体制の構築、詳細効果検討	法手続き、基本設計	詳細設計、工事着手、事業開始	○			D	D				調整会議、スケジュール検討	検討業務		
		汚水処理施設の統廃合	集落排水施設の統廃合（唐瀬武原地区→名蔵真地区）	恩納村	恩納村		事業開始			○			B	B			処理場施設造成工事	処理場施設土木工事		
	北部 ブロック	汚水処理施設の統廃合	し尿処理施設及び下水処理施設の統廃合（本部町今帰仁村清掃施設組合し尿処理施設→本部町浄化センター）	本部町、本部町今帰仁村清掃施設組合			検討体制の構築	詳細効果検討、法手続き、基本設計、詳細設計、工事着手、事業開始					未着手	未着手						
		汚水処理施設の統廃合	集落排水施設の統廃合（仲田、読見地区→内花地区）	伊是名村	伊是名村		詳細設計、工事着手	事業開始		○			C	B			新規採択に係るヒアリングを実施し、令和7年度新規採択となった	令和7年度新規として、実施設計を予定		
		汚水処理の共同化	し尿処理施設及び下水処理施設の統廃合（名護市衛生センター→名護下水処理場）	名護市、国頭村、大宜味村、東村	名護市		事業開始			○			B	B			建設工事	建設工事（完成）		
	龍 島	汚水処理施設の統廃合	集落排水施設の統廃合（高良地区→大沢地区）	石垣市	石垣市				検討体制の構築、詳細効果検討、法手続き、基本設計、詳細設計、工事着手、事業開始					未着手	未着手		未着手	事業スキームの検討		
	計画メニュー	南部 ブロック	人材育成の共同化	1.人材育成（職員研修、技術者派遣）の共同実施	糸満市、豊見城市、南城市、中城村、西原町、与那原町、南風原町、渡嘉敷村、座間味村、八重瀬町		検討体制の構築、共同研修の内容調整、共同研修の実施、技術者派遣の検討	研修内容のブラッシュアップ、技術者派遣の実施	研修内容のブラッシュアップ、技術者派遣の実施	○			D	A			共同研修（施設見学）	共同研修の内容調整		
			下水道PR・広報活動の共同化	2.広報活動（イベント開催、メディア活用）の共同実施	糸満市、豊見城市、南城市、中城村、西原町、与那原町、南風原町、渡嘉敷村、座間味村、八重瀬町		検討体制の構築、既存イベント・広報活動の情報共有、広報活動の企画	広報活動の実施	連携内容の調整、拡大					未着手	未着手					
			災害時対応の共同化	3.災害時対応の広域化	那覇市、糸満市、豊見城市、南城市、中城村、西原町、与那原町、南風原町、渡嘉敷村、座間味村、八重瀬町		検討体制の構築、現BCPの共有、策定方法の検討	BCPの検討、広域的なBCPの調整、連携方法の検討	広域的汚水処理BCPの策定、広域的な災害協定の締結、し尿・集排を含む合同訓練の実施、ツールの共同整備、民間との災害協定	○				未着手	D			検討体制の構築	連携方法の検討	
			維持管理業務の共同発注	4.維持管理（処理場・ポンプ場）の共同化	南風原町、座間味村、八重瀬町			検討体制の構築、現発注内容の共有、共同発注・共同委託の検討・実施	共同発注範囲の調整、共同委託範囲の拡大、施設台帳の共有化検討、施設台帳の共同化					未着手	未着手					
			計画・調査委託の共同発注	5.水質検査業務の共同発注	南城市、与那原町、南風原町、渡嘉敷村、座間味村、八重瀬町			検討体制の構築、現発注内容の共有、共同発注の検討・実施	共同発注範囲の調整					未着手	未着手					
維持管理業務の共同発注			6.維持管理（管路）の共同化	南城市、西原町、与那原町、南風原町、渡嘉敷村、座間味村			検討体制の構築、現発注内容の共有、共同発注の検討・実施、共同委託の検討、共同委託範囲の調整	共同発注範囲の調整、共同委託への移行検討、委託範囲の拡大検討、管路台帳の共有検討、共同委託範囲の調整、台帳システムの共同化					未着手	未着手						
その他			7.経営改善の共同実施	西原町、与那原町、座間味村、八重瀬町			検討体制の構築、現経営状況の共有、料金改定方法の検討、改訂検討の実施、実施状況の共有、共同発注の検討、実施（料金改定など）	共同検討から共同発注への移行検討、共同発注の調整・実施、システムの共同化					未着手	未着手						
その他			8.雨水対策事業の共同実施	那覇市、南風原町			検討体制の構築、浸水対策の検討、対策検討状況の共有、対策の調整、共同発注の検討・実施、雨天時浸水対策の必要性検討	対策計画の共同発注、計画の見直し、計画の調整、対策施設の整備、浸水水量調査					未着手	未着手						
中部 ブロック		人材育成の共同化	1.人材育成（職員研修、技術者派遣）の共同実施	宜野湾市、浦添市、沖縄市、うるま市、恩納村、金武町、読谷村、喜手納町、北谷町、北中城村		検討体制の構築、共同研修の内容調整、共同研修の実施、技術者派遣の検討	研修内容のブラッシュアップ、技術者派遣の実施	研修内容のブラッシュアップ、技術者派遣の実施	○				未着手	A			共同研修（BCP勉強会）	共同研修の内容調整		
		下水道PR・広報活動の共同化	2.広報活動（イベント開催、メディア活用）の共同実施	宜野湾市、浦添市、沖縄市、うるま市、恩納村、金武町、読谷村、北谷町、北中城村		検討体制の構築、既存イベント・広報活動の情報共有、広報活動の企画	広報活動の実施	連携内容の調整、拡大					未着手	未着手						
		災害時対応の共同化	3.災害時対応の広域化	宜野湾市、浦添市、沖縄市、うるま市、恩納村、宜野座村、金武町、読谷村、喜手納町、北谷町、北中城村		検討体制の構築、現BCPの共有、策定方法の検討、BCPの検討、広域的なBCPの調整、連携方法の検討	広域的汚水処理BCPの策定、広域的な災害協定の締結、し尿・集排を含む合同訓練の実施	ツールの共同整備、民間との災害協定	○			D	D			現BCPの共有	BCPの検討			
		維持管理業務の共同発注	4.維持管理（処理場・ポンプ場）の共同化	沖縄市、うるま市、読谷村、北谷町			検討体制の構築、現発注内容の共有、共同発注・共同委託の検討・実施	共同発注範囲の調整、共同委託範囲の拡大、施設台帳の共有化検討、施設台帳の共同化					未着手	未着手						
		計画・調査委託の共同発注	5.水質検査業務の共同発注	沖縄市、うるま市、読谷村、北谷町、北中城村			検討体制の構築、現発注内容の共有、共同発注の検討・実施	共同発注範囲の調整					未着手	未着手						
		維持管理業務の共同発注	6.維持管理（管路）の共同化	浦添市、沖縄市、うるま市、読谷村、北谷町、北中城村			検討体制の構築、現発注内容の共有、共同発注の検討・実施、共同委託の検討、共同委託範囲の調整	共同発注範囲の調整、共同委託への移行検討、委託範囲の拡大検討、管路台帳の共有検討、共同委託範囲の調整、台帳システムの共同化					未着手	未着手						
		市内事務の共同化	9.汚水処理事業に関する指導業務の共同化	沖縄市、金武町、読谷村、北谷町			検討体制の構築、指導状況の共有、共通基準の検討、指導業務の共同化の検討、共通指導内容の調整、実施（指導以外の業務）	共同実施内容の調整（対象事業の拡大）、共同化の必要性の検討、共同化に伴う条件の改訂、事務の共同化（指導以外の業務）					未着手	未着手						
		北部 ブロック	人材育成の共同化	1.人材育成（職員研修、技術者派遣）の共同実施	名護市、国頭村、大宜味村、東村、今帰仁村、本部町、伊江村、伊平屋村、伊是名村		検討体制の構築、共同研修の内容調整、共同研修の実施、技術者派遣の検討	研修内容のブラッシュアップ、技術者派遣の実施	研修内容のブラッシュアップ、技術者派遣の実施	○			D	A			共同研修（施設見学）	共同研修（汚水処理事業全般の基礎的な知識の習得を目標）		
下水道PR・広報活動の共同化	2.広報活動（イベント開催、メディア活用）の共同実施		名護市、国頭村、大宜味村、東村、今帰仁村、伊江村、伊是名村		検討体制の構築、既存イベント・広報活動の情報共有、広報活動の企画	広報活動の実施	連携内容の調整、拡大					未着手	未着手							
災害時対応の共同化	3.災害時対応の広域化		名護市、国頭村、大宜味村、東村、今帰仁村、本部町、伊江村、伊平屋村、伊是名村		検討体制の構築、現BCPの共有、策定方法の検討	BCPの検討、広域的なBCPの調整、連携方法の検討	広域的汚水処理BCPの策定、広域的な災害協定の締結、し尿・集排を含む合同訓練の実施、ツールの共同整備、民間との災害協定					未着手	未着手			検討体制の構築（目標）				
維持管理業務の共同発注	4.維持管理（処理場・ポンプ場）の共同化		名護市、大宜味村、伊江村、伊是名村			検討体制の構築、現発注内容の共有、共同発注・共同委託の検討・実施	共同発注範囲の調整、共同委託範囲の拡大、施設台帳の共有化検討、施設台帳の共同化					未着手	未着手							
計画・調査委託の共同発注	5.水質検査業務の共同発注		名護市、大宜味村、伊江村、伊是名村			検討体制の構築、現発注内容の共有、共同発注の検討・実施	共同発注範囲の調整					未着手	未着手							
維持管理業務の共同発注	6.維持管理（管路）の共同化		名護市、大宜味村、伊江村、伊是名村			検討体制の構築、現発注内容の共有、共同発注の検討・実施、共同委託の検討、共同委託範囲の調整	共同発注範囲の調整、共同委託への移行検討、委託範囲の拡大検討、管路台帳の共有検討、共同委託範囲の調整、台帳システムの共同化					未着手	未着手							
市内事務の共同化	9.汚水処理事業に関する指導業務の共同化		名護市、国頭村、大宜味村、今帰仁村、今帰仁村、伊江村、伊是名村			検討体制の構築、指導状況の共有、共通基準の検討、指導業務の共同化の検討、共通指導内容の調整、実施（指導以外の業務）	共同実施内容の調整（対象事業の拡大）、共同化の必要性の検討、共同化に伴う条件の改訂、事務の共同化（指導以外の業務）					未着手	未着手							
龍 島 ブロック	人材育成の共同化		1.人材育成（職員研修、技術者派遣）の共同実施	石垣市、宮古島市、東国村、読名喜村、南大東村、北大東村、久米島町、多良間町、竹富町、与那国町		検討体制の構築、共同研修の内容調整、共同研修の実施、技術者派遣の検討	研修内容のブラッシュアップ、技術者派遣の実施	研修内容のブラッシュアップ、技術者派遣の実施	○			D	A			共同研修（施設見学）	共同研修の内容調整			
	下水道PR・広報活動の共同化	2.広報活動（イベント開催、メディア活用）の共同実施	石垣市、宮古島市、北大東村、久米島町、多良間町、竹富町、与那国町		検討体制の構築、既存イベント・広報活動の情報共有、広報活動の企画	広報活動の実施	連携内容の調整、拡大					未着手	未着手							
	災害時対応の共同化	3.災害時対応の広域化	石垣市、宮古島市、東国村、読名喜村、久米島町、与那国町		検討体制の構築、現BCPの共有、策定方法の検討	BCPの検討、広域的なBCPの調整、連携方法の検討	広域的汚水処理BCPの策定、広域的な災害協定の締結、し尿・集排を含む合同訓練の実施、ツールの共同整備、民間との災害協定					未着手	未着手							
	その他	7.経営改善の共同実施	石垣市、宮古島市、東国村、読名喜村、南大東村、久米島町、与那国町			検討体制の構築、現経営状況の共有、料金改定方法の検討、改訂検討の実施、実施状況の共有、共同発注の検討、実施（料金改定など）	共同検討から共同発注への移行検討、共同発注の調整・実施、システムの共同化					未着手	未着手							
(1)	検討開始率（メニューの進捗評価のうちD以上のもの/取組中止を除いたメニュー数）																			
	合意形成率（メニューの進捗評価のうちC以上のもの/取組中止を除いたメニュー数）																			
	事業着手率（メニューの進捗評価のうちB以上のもの/取組中止を除いたメニュー数）																			
	事業開始率（メニューの進捗評価のうちA以上のもの/取組中止を除いたメニュー数）																			
	(5)	汚水処理施設の統廃合完了地区数（過年度合計）																		
		汚水処理施設の統廃合計画地区数																		
		汚水処理施設の統廃合進捗																		
		デジタル化の推進に関わる取組メニュー数（過年度実績）															0%	0%	0%	0%
	(7)	PPP/PFIの推進に関わる取組数（過年度実績）																		
(8)	事業化中止数（過年度実績）															0	0	0	0	0
(9)	メニュー数（過年度実績）															37	37	0	0	0

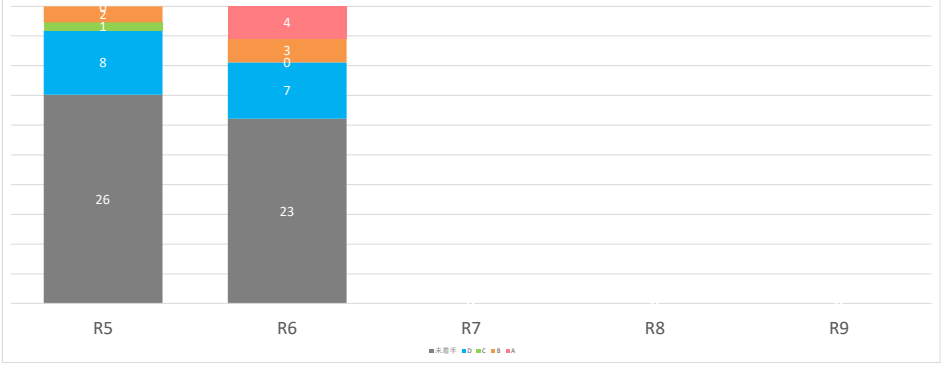

未着手	26	23	0	0	0
D	8	7	0	0	0
C	1	0	0	0	0
B	2	3	0	0	0
A	0	4	0	0	0
取組中止数	0	0	0	0	0
進捗メニュー数	37	37	0	0	0
