

令和3年度 第1回 首里城復旧・復興推進本部会議

書面審議（令和3年6月7日～9日）

1 報告事項 :

- (1) 首里城復興基本計画策定の経緯について
- (2) 首里城復旧・復興ワーキンググループ設置要綱の改正について
- (3) 首里城復興の進捗状況等について

2 議事事項 :

首里城復興基本計画推進事業について

【報告事項】

- (1) 首里城復興基本計画策定の経緯について
- (2) 首里城復旧・復興ワーキンググループ設置要綱の
改正について
- (3) 首里城復興の進捗状況等について

復興基本計画策定に係る主な経緯

開催時期	会議等	内容
令和2年 6月15日	第1回 首里城復旧・復興推進本部 会議	<ul style="list-style-type: none"> 首里城復旧・復興に係る新たな体制の見直し 首里城復旧・復興への取組等に関する情報共有
8月27日	第2回 首里城復旧・復興推進本部 会議	<ul style="list-style-type: none"> 首里城復興基本計画に関する有識者懇談会 首里城復興基金活用の主な事業及び検定の時期等
9月14日	第1回 有識者懇談会 第1回 琉球文化継承・振興検討部会 第1回 新・首里杜構想検討部会 合同会議	<ul style="list-style-type: none"> 首里城復興基本方針に基づく今年度の沖縄県の取組状況 施策の現状と課題の整理 有識者懇談会の進め方
10月23日	第2回 琉球文化継承・振興検討部会	<ul style="list-style-type: none"> 琉球文化のルネサンスの捉え方について 首里城復興基本計画（たたき台）について
10月28日	第2回 新・首里杜構想検討部会	<ul style="list-style-type: none"> 新・首里杜構想の策定について
11月27日	第2回 有識者懇談会	<ul style="list-style-type: none"> 各部会の内容を踏まえた首里城復興基本計画（たたき台）に関する総合的な議論
12月9日	第1回 Zoom座談会	<ul style="list-style-type: none"> 首里城復興の意義について
12月15日	第3回 首里城復旧・復興推進本部 会議	<ul style="list-style-type: none"> 首里城復興基本計画の策定状況について 首里城復興に関する取組状況について 企業版ふるさと納税への対応について 首里城復興基金を活用した事業について (木材の樹種変更、赤瓦の調達) 中城御殿の整備について (城郭内文化財展示収蔵機能の附加)

復興基本計画策定に係る主な経緯

開催時期	会議等	内容
12月18日	第2回 Zoom座談会	<ul style="list-style-type: none"> 首里城を中心とする歴史・文化の再認識と復興とは？
12月21日	第3回 琉球文化継承・振興検討部会	<ul style="list-style-type: none"> 首里城復興基本計画（たたき台）に関する議論
12月23日	第3回 新・首里杜構想検討部会	<ul style="list-style-type: none"> 首里城復興基本計画（たたき台）に関する議論
令和3年 2月8日	第3回 有識者懇談会	<ul style="list-style-type: none"> 首里城復興基本計画（素案）に関する議論
2月9日 ～22日	首里城復興基本計画（素案）に対する 意見募集	<ul style="list-style-type: none"> 県ホームページ等により素案への意見を募集
2月22日	第3回 Zoom座談会	<ul style="list-style-type: none"> 首里城復興基本計画について
3月9日	有識者懇談会からの結果報告	<ul style="list-style-type: none"> 首里城復興基本計画（案）に対する意見
3月16日	第4回 首里城復旧・復興推進本部会議	<ul style="list-style-type: none"> 首里城復興基本計画（案）の決定 首里城復興基金の活用（扁額）について
3月29日	首里城復興基本計画の策定・公表	<ul style="list-style-type: none"> 知事決裁後、県HPにて公表

復旧・復興ワーキンググループ設置要綱の改正

復興基本計画は幅広い部局にまたがることから、復旧・復興ワーキンググループの主担当を特命推進課に変更し、総括的な立場から着実な推進を図っていく。

首里城復旧・復興推進本部 (R2年度)

組織: 知事、副知事、政策調整監、関係部局長

- ・復興基本計画等の策定に関する事
- ・施策の方針決定・情報共有に関する事
- ・その他対策を実施するため必要な事項に関する事

(庶務: 特命推進課(主)、都市公園課(副))

首里城復旧・復興ワーキンググループ

体制: (主) 土建部参事、(副) 特命推進課長
関係課長(10課体制)
役割: 復旧・復興の諸課題の分析及び検討
関係課で検討Gを設置、課題を検討
庶務: 都市公園課(主)、特命推進課(副)

検討グループ(課題ごとに設置)

- ① 防災対策検討グループ
- ② 文化財等検討グループ
- ③ 歴史まちづくり検討グループ
- ④ 琉球文化継承・振興検討グループ
- ⑤ 復旧推進検討グループ
- ⑥ 復興財源検討グループ
- ⑦ 誘客対策検討グループ

首里城復旧・復興推進本部 (R3年度～)

組織: 知事、副知事、政策調整監、関係部局長

- ・復興基本計画等の策定に関する事
- ・施策の方針決定・情報共有に関する事
- ・その他対策を実施するため必要な事項に関する事

(庶務: 特命推進課(主)、都市公園課(副))

首里城復旧・復興ワーキンググループ

体制: (主) 特命推進課長、(副) 都市公園課長
関係課長(10課体制)
役割: 復旧・復興の諸課題の分析及び検討
関係課で検討Gを設置、課題を検討
庶務: 特命推進課

検討グループ(課題ごとに設置)

- ① 防災対策検討グループ
- ② 文化財等検討グループ
- ③ 歴史まちづくり検討グループ
- ④ 琉球文化継承・振興検討グループ
- ⑤ 復旧推進検討グループ
- ⑥ 復興財源検討グループ
- ⑦ 誘客対策検討グループ

首里城復旧・復興ワーキンググループ設置要綱（抜粋） ※赤字下線部が改正箇所

（目的）

第1条 首里城の復旧・復興に向けた諸課題及び対応を検討するため、首里城復旧・復興推進本部（以下「推進本部」という。）設置要綱第6条に基づき、「首里城復旧・復興ワーキンググループ（以下「復旧・復興WG」という。）」を設置する。

（事務）

第2条 復旧・復興WGは、次の各号に掲げる事務を所掌する。

- (1) 首里城復旧・復興に向けた諸課題の分析及び検討に関する事。
- (2) 首里城復興基本計画等の策定及び実施に関する事。
- (3) 推進本部への報告に関する事。
- (4) その他首里城復旧・復興に向けて必要な事項に関する事。

（リーダー及びサブリーダー）

第3条 復旧・復興WGに、リーダー及びサブリーダーを置き、それぞれ (現:土木建築部参事及び特命推進課長) ⇒ (改正:特命推進課長及び都市公園課長) をもってあてる。

（組織）

第4条 復旧・復興WGに、別表左欄に掲げる検討グループを置く。なお、業務の必要性に応じ、検討グループを追加できるものとする。

- 2 各検討グループは別表中央欄に掲げる課で構成し、分掌事務は別表右欄のとおりとする。
- 3 各検討グループのリーダーは、必要に応じて、他課又は関係機関に応援を要請することができる。

（復旧・復興WG会議）

第5条 復旧・復興WGは、情報共有、対策方針の検討を行うため、復旧・復興WG会議（以下「WG会議」という。）を開催することができる。

- 2 WG会議は、リーダーが招集する。
- 3 WG会議は、リーダーが主宰し、その都度必要と認められたメンバーで開催することができる。
- 4 リーダーは、メンバーのほか、必要があると認める者の出席を求めることができる。

（庶務）

第6条 WG会議の庶務は、(現:都市公園課(主)及び特命推進課(副)) ⇒ (改正:特命推進課) において処理する。（中略）

首里城正殿等の復元に向けたスケジュールについて（国）



〔 2 0 2 0 年 3 月 2 7 日 〕
首里城復元のための関係閣僚会議

（年度）

		R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9 以降
正殿	材料調査 (大径材)		市場調査							
	設計		基本設計	実施設計						
	材料調達 (大径材)			調達 乾燥						
	工事	仮設道路 がれき撤去		木材倉庫	発注手続(WTO)		本体工事			
北殿、南殿等			撤去 正殿復元の施工ヤードとして使用							
			検討						工事	


首里城正殿等の復元に向けた令和2年度の取組み（国）

●正殿遺構 仮設覆屋の設置 令和2年6月12日より公開

出典：首里城復元に向けた技術検討委員会資料




●大龍柱の仮設補修作業場の設置 令和2年11月より公開

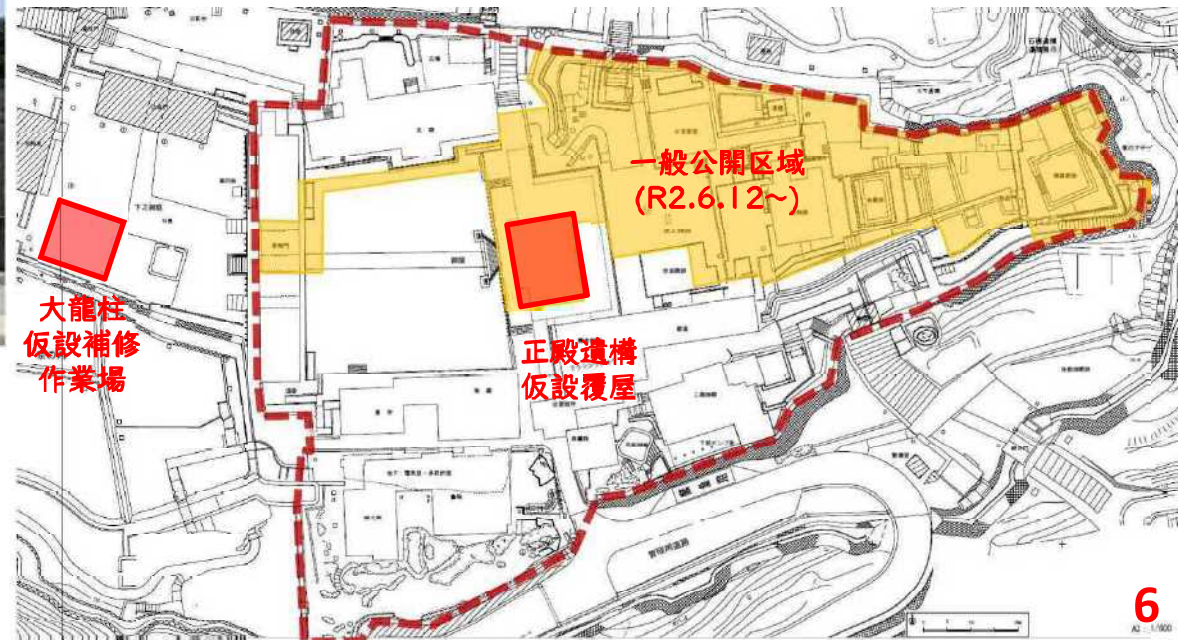

首里城正殿等の復元に向けた令和3年度の取組み予定（国）

●木材倉庫・加工場、原寸場、北殿北側見学通路の設置

出典：首里城復元に向けた技術検討委員会資料

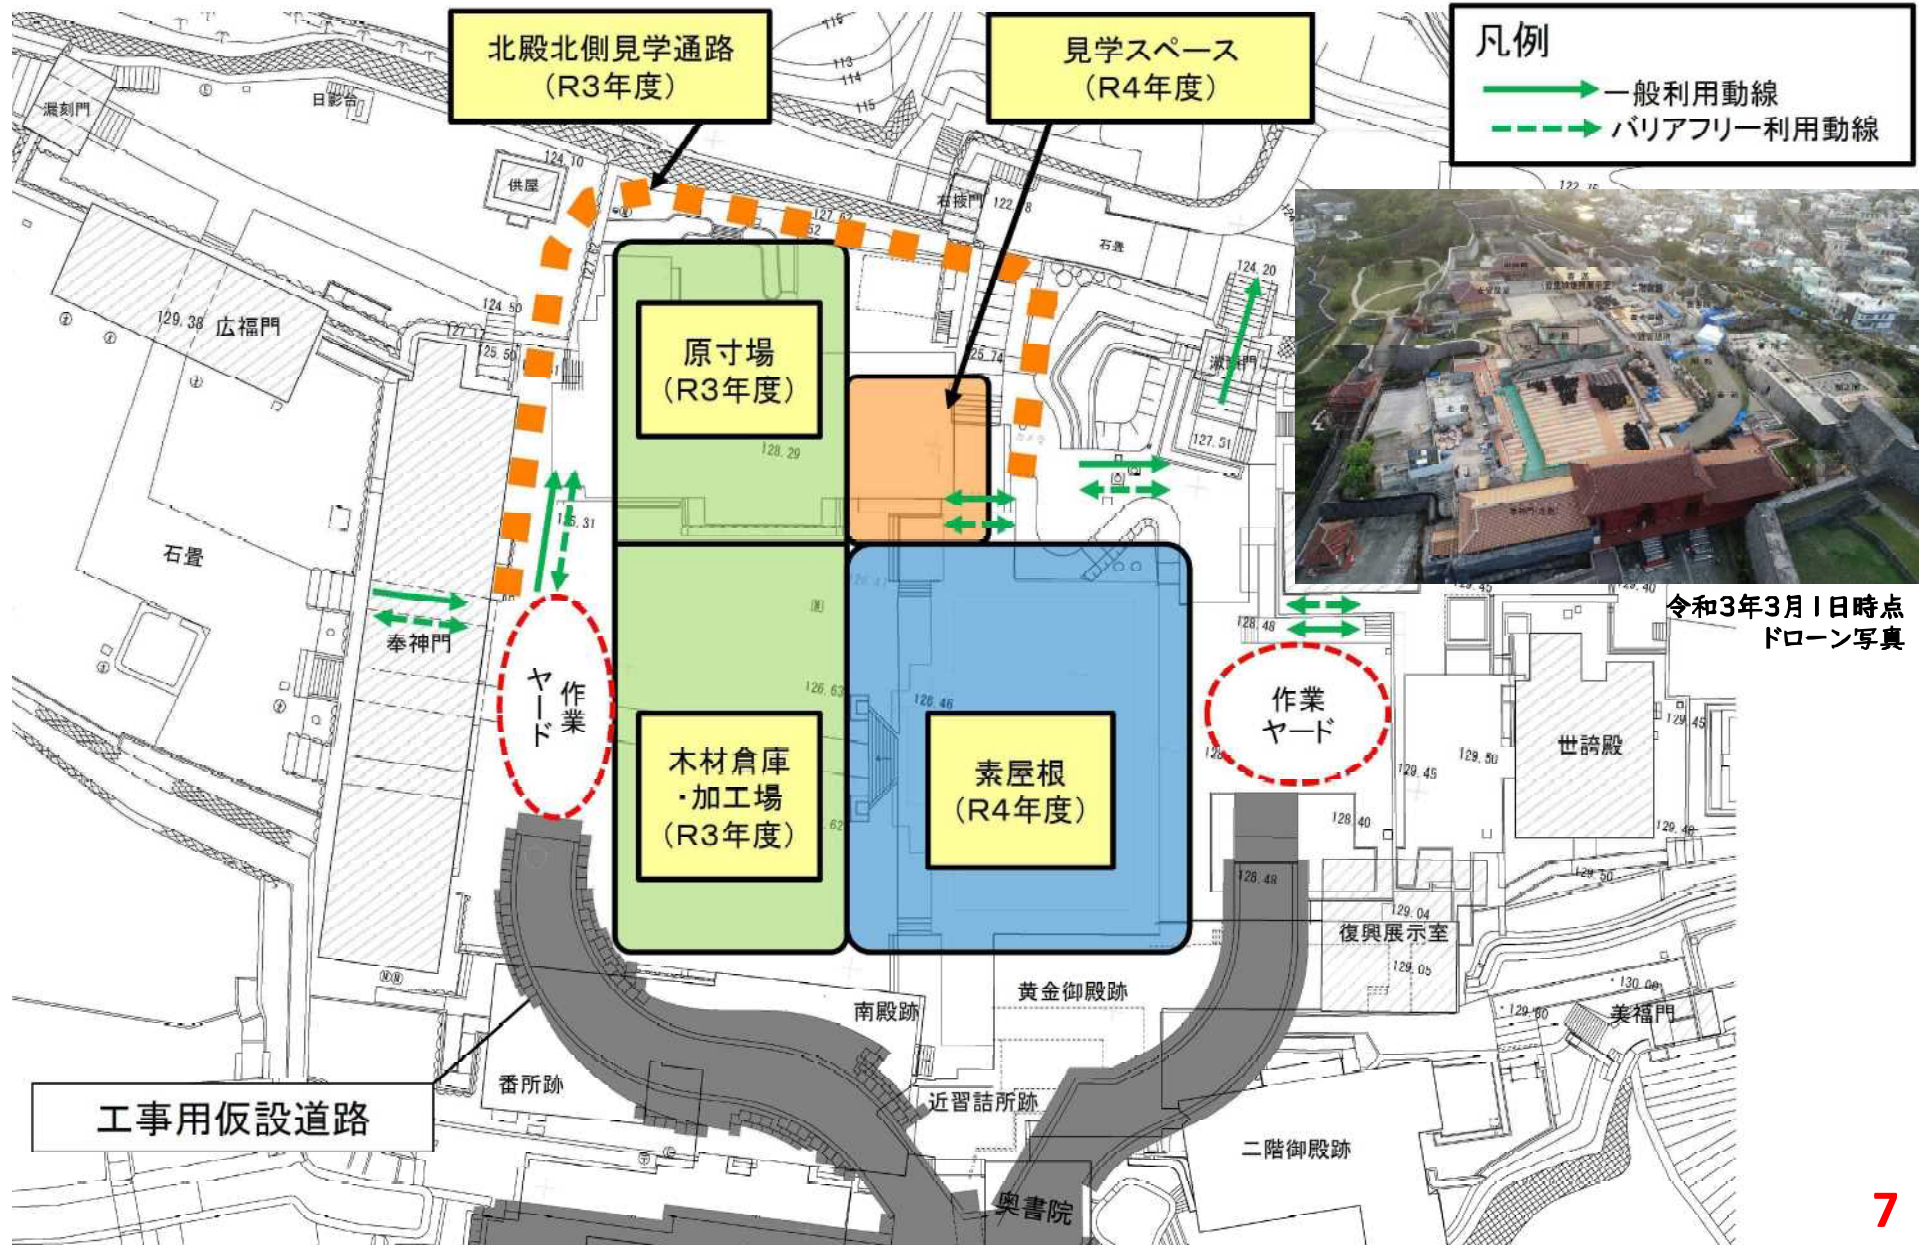

首里城公園内における段階的公開



●首里城復興展示室の設置 令和2年11月より公開



●世誇殿の大型映像設備の設置 令和2年12月より公開



●漆喰はがしボランティア(焼損を免れた瓦の再利用のため)



【実施状況】

	参加人数	作業枚数
一次：3～4月(11日)	931名	6,843枚
二次：10～12月(59日)	2,093名	11,887枚
三次：3～4月(30日)	798名	4,318枚
合計：100日	3,822名	23,048枚

瓦の残数：約2,000枚

歓会門



【事前申込者数】

10/30(金) 3,203名
10/31(土) 6,406名
11/ 1(日) 4,402名

合計 14,011名

※申込枠 : 8,550名

【当日来場者数】

10/30(金) 1,929名
10/31(土) 2,606名
11/ 1(日) 2,571名

合計 7,106名

広福門



北城郭



首里城復興イベント（ものづくり×地域連携）について



●破損瓦を活用した漆喰シーサーづくり体験



指導者：沖縄県琉球赤瓦漆喰施工共同組合



指導者：ぎやらりーゆしびん

【会場入場者数】

10/31(土)	591名
11/ 1(日)	618名
11/ 3(火)	877名
11/ 7(土)	452名
11/ 8(日)	401名
合計	2,939名

●地域と連携した伝統芸能などの実施



エイサー演舞
(首里地区児童)



古典芸能(県立芸大生)

1/30(土)	256名
1/31(日)	190名
2/ 6(土)	255名
2/ 7(日)	257名
合計	958名



まちまーい(那覇市観光協会)



地域紹介パネル
(地域・財団・埋蔵文化財センター等)



旗頭演舞(地域青年会)

方針 第1より

基金は、一日も早い首里城火災からの復興を願う国内外を含めた県内外からの寄附金によって積み立てられていることから、県民はもとより県内外の人びとの想いを尊重し、焼失した首里城の城郭内の施設等の復元に活用する。

方針 第2より

首里城正殿の復元まで (第1フェーズ)

※現在の寄附金
約52億円
(R3.4月末)

1. 正殿の木材調達に関する事業

(1) 大径材

・令和2年9月決定(12月変更) 令和3年4月事業開始

(2) 大径材を除く造作材のうち県産材等

・令和3年7月決定予定 正殿復元工事着工時(令和4年)に事業開始予定

2. 正殿の赤瓦調達に関する事業

・令和2年12月決定 令和3年4月事業開始

3. 大龍柱等の石彫刻、唐破風妻飾等の木彫刻及び龍頭棟飾等の焼物など、屋外彫刻の復元に関する事業

・令和3年7月決定予定 正殿復元工事着工時(令和4年)に事業開始予定

4. 扁額などの室内装飾の復元に関する事業

・扁額：令和3年3月決定 令和3年4月事業開始

・扁額以外：令和3年7月決定予定 正殿復元工事着工時(令和4年)に事業開始予定

5. 第1号から第4号のほか、首里城正殿、北殿及び南殿等の復元に関する事業

正殿復元後 (第2フェーズ)

5. (中略) 北殿及び南殿等の復元に関する事業
