

令和 4 年度首里城扁額製作検討委員会

第 2 回 検討委員会資料


3 月 2 日（木） 14:00 - 16:30

【資料 1】 今年度・今後のスケジュールについて

1-1.令和 4 年度のスケジュール

1-2.扁額製作工程表

1-1. 令和4年度のスケジュール (令和5年2月時点)

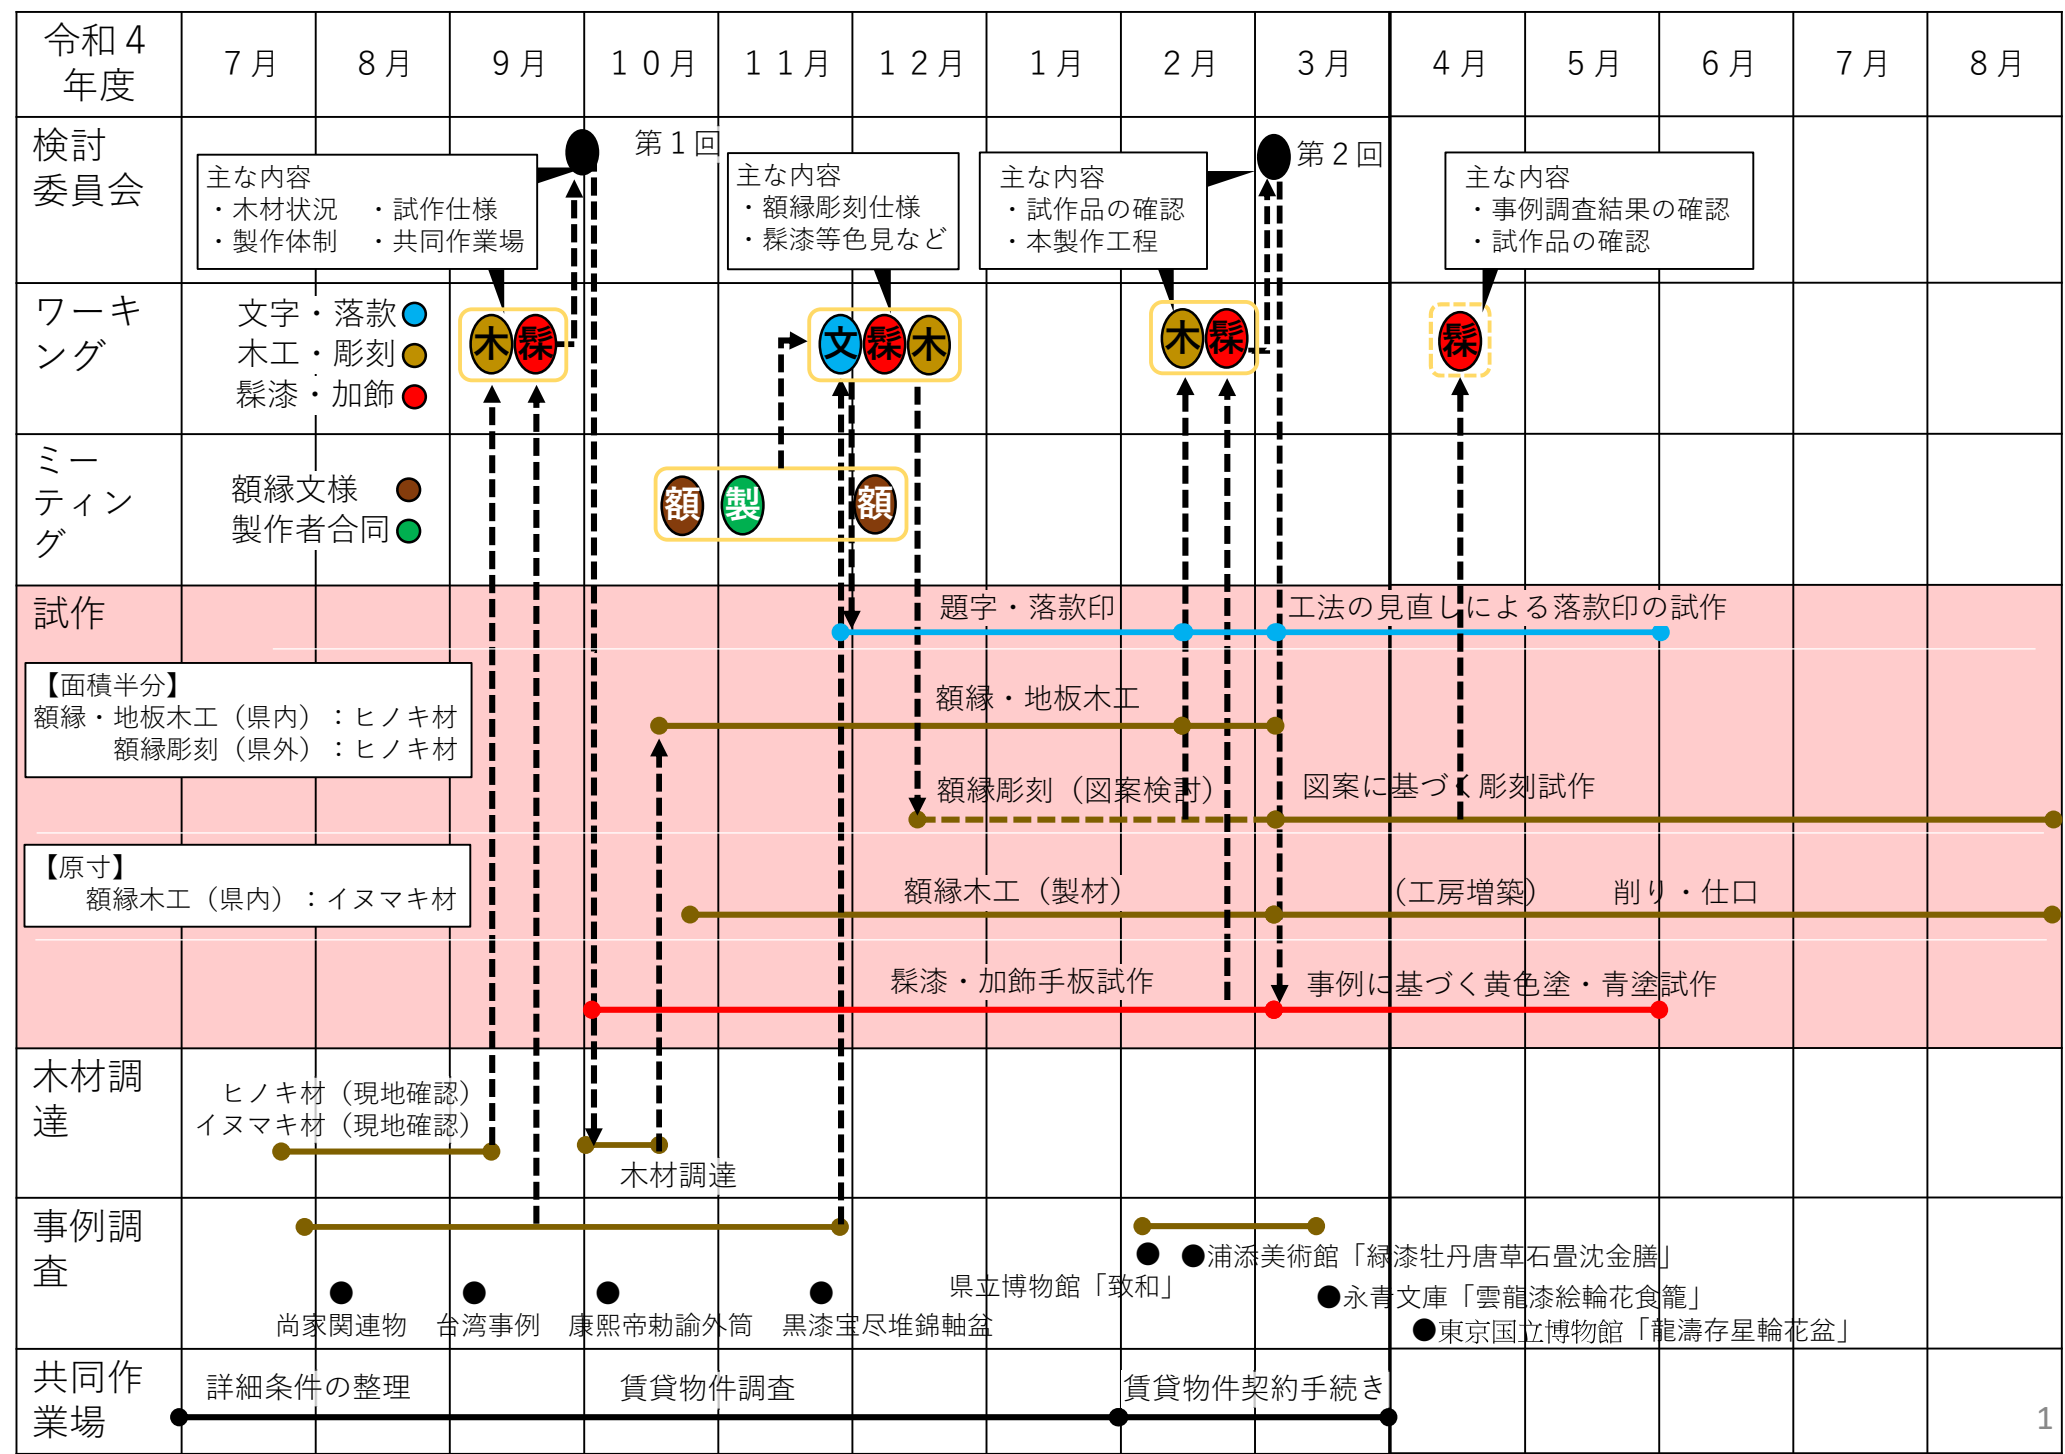

1-2. 扁額製作工程表 (令和5年2月時点)

	作業場所 (候補)	令和4年度 (1年目)	令和5年度 (2年目)	令和6年度 (3年目)	R7年度 (4年目)	R8年度 (5年目)
落款	各技術者の 工房		題字・印写し 1日、3名	題字・印立合 1日、3名		
木工・彫刻	木工業者等	イヌマキ材選定調査 (沖縄) 粗木取 (沖縄)2日 乾燥 (沖縄)4カ月 製材 (沖縄)1カ月 削・仕口 (沖縄)1カ月	額縁彫刻木工 (沖縄)4カ月、2名 運搬 5日	額縁木彫本作 (東藝)10カ月内外、2名+若手 運搬 5日		
	各技術者の 工房	ヒノキ材選定調査 (県外) 事例調査 (沖縄・台湾) 額縁彫刻事例調査・ 図案作成 (東藝)5カ月、4名 額縁彫刻 (東藝)5カ月、2名+若手 題字・印彫刻 (沖縄)5カ月、1名+若手 額縁・地板等木工 (沖縄)2カ月、2名	額縁彫刻 (東藝)5カ月、2名+若手 題字・印木彫本作 (沖縄)4カ月、1名+若手 地板木工本作 (沖縄)4カ月、2名			
髹漆・加飾	共同作業場	手板試作 「黄色塗、青塗、朱塗、墨ふり帰し塗」 8カ月、2名+若手4名	額縁彫刻蒔地 金薄磨 木固め 2名+若手4名 1カ月 額縁彫刻 金薄磨 木固め 2名+若手4名 1カ月 題字・印蒔地 金薄磨 木固め 2名+若手4名 1カ月 額縁・地板下地 額縁・地板 木固め 2名+若手4名 3カ月 額縁・地板髹漆 木固め 2名+若手4名 3カ月	額縁彫刻蒔地 金薄磨 木固め 2名+若手4名 1カ月 額縁彫刻 金薄磨 木固め 2名+若手4名 1カ月 題字・印蒔地 金薄磨 木固め 2名+若手4名 1カ月 額縁・地板下地 額縁・地板 木固め 2名+若手4名 3カ月 額縁・地板髹漆 木固め 2名+若手4名 3カ月	額縁彫刻蒔地 金薄磨 木固め 2名+若手4名 1カ月 額縁彫刻 金薄磨 木固め 2名+若手4名 1カ月 題字・印蒔地 金薄磨 木固め 2名+若手4名 1カ月 額縁・地板下地 額縁・地板 木固め 2名+若手4名 3カ月 額縁・地板髹漆 木固め 2名+若手4名 3カ月	額縁彫刻蒔地 金薄磨 木固め 2名+若手4名 1カ月 額縁彫刻 金薄磨 木固め 2名+若手4名 1カ月 題字・印蒔地 金薄磨 木固め 2名+若手4名 1カ月 額縁・地板下地 額縁・地板 木固め 2名+若手4名 3カ月 額縁・地板髹漆 木固め 2名+若手4名 3カ月
	共同作業場	試作作業	試作作業	試作作業	試作作業	試作作業
備考		共同作業場の確保	共同作業場の運営			
他扁額				「輯瑞球陽」「永祚瀛壖」の製作		

扁額の展示活用

取付

※各工程における工期・作業人数は、状況に応じて変更する場合があります。
